

第 5 次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

ページ	部門	事 務 事 業 名	担当課名 ※（ ）内は群馬支所担当課
1	教育・文化	北谷遺跡保存整備事業	文化財保護課
2	都市・建設	群馬中央第二土地区画整理事業	区画整理課
3	都市・建設	菅谷高畑土地区画整理事業	区画整理課
4	都市・建設	上水道管網整備事業（石綿セメント管の布設替）	水道局工務課 （群馬上下水道事務所）
5	都市・建設	汚水管渠整備事業	下水道局整備課 （群馬上下水道事務所）

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	北谷遺跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (群馬支所地域振興課)
実施期間	平成12年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	北谷遺跡		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡北谷遺跡(平成17年7月14日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史的遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である北谷遺跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	全体面積 4.2ha 平成12年度～15年度 範囲確認発掘調査 平成16年度 調査報告書刊行 平成18年度 説明板設置	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
・史跡保存管理計画の策定準備	・史跡保存管理計画策定 ・保存管理計画策定委員会	・史跡境界杭の設置 ・用地買収準備(国と協議)

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	2,566	2,548	<ul style="list-style-type: none"> ■保存管理計画策定着手 ■保存管理計画策定委員会を設置 ■保存管理計画書の発行 ■説明板設置場所の管理(除草管理)
国	1,000	1,000	
県	300	300	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	1,266	1,248	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	402	—	<ul style="list-style-type: none"> ■用地買収準備 ■説明板設置場所の管理(除草管理)
国		—	
県		—	
地方債		—	
その他		—	
一般	402	—	

北谷遺跡平面図

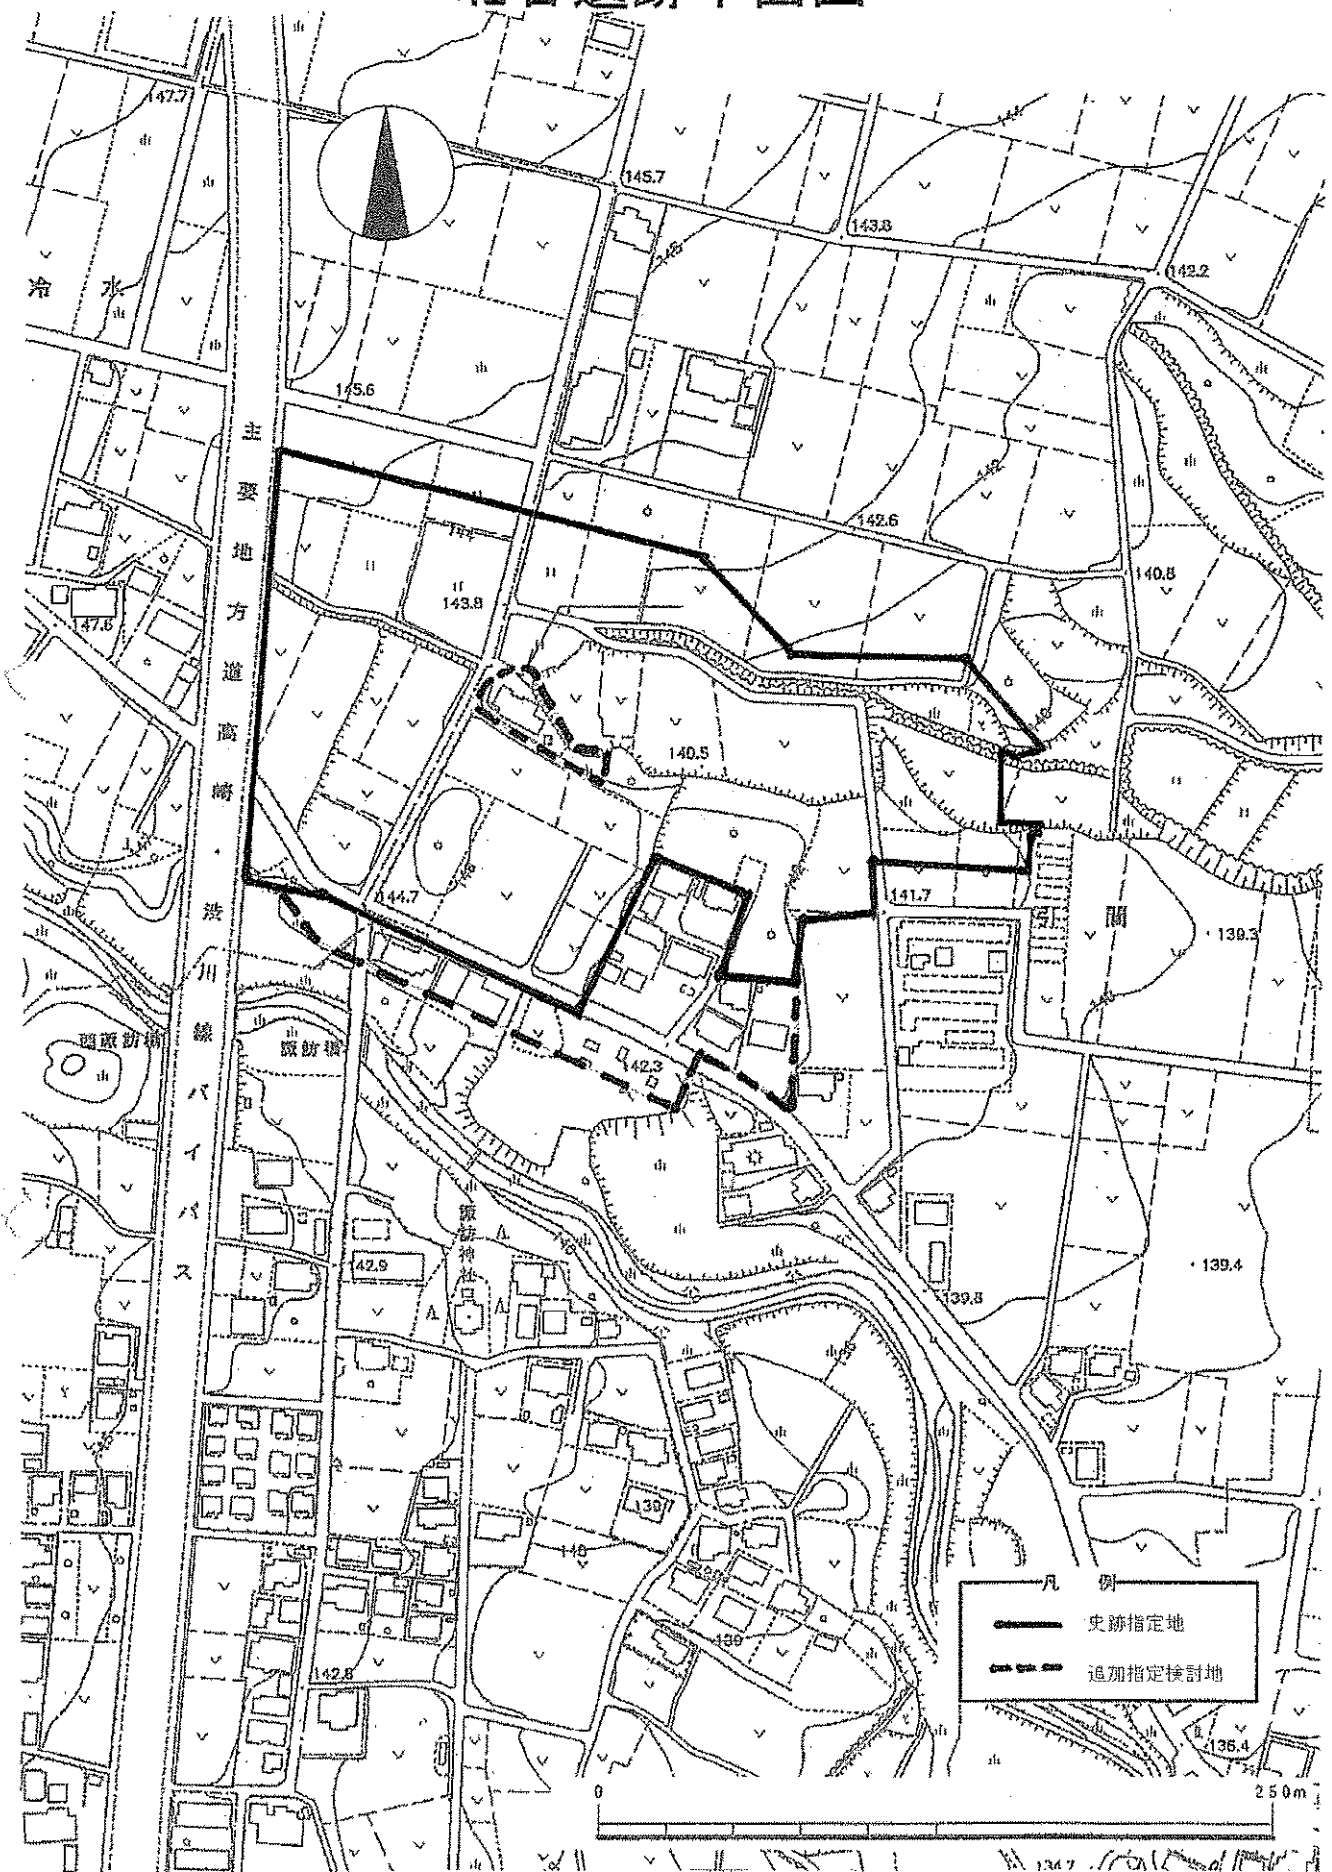

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	群馬中央第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理課
実施期間	平成9年度～平成35年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	群馬中央第二土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】 72.02ha 【総事業費】 13,300百万円 【事業概要】 都市計画道路4,993m、区画道路13,098m、特殊道路1,557m、水路271m、公園21,700㎡、上水道15,890m、調整池1箇所、物件移転606戸 H23末進捗率 21.5%	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績			
合計	529,179	385,253	■道路築造工事外 6件 ■建物調査委託外 8件 ■建物移転補償物件外 9件			
国	200,400	103,264				
県	—	—				
地方債	79,200	79,200				
その他	—	—				
一般	249,579	202,789				
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容			
合計	586,189	—	《9月26日現在》 ■道路築造工事外 4件施工中 2件予定 ■建物調査委託外 7件業務中 1件予定 ■建物移転補償物件外 6件完成 7件施工中 3件予定			
国	275,000	—				
県	—	—				
地方債	27,000	—				
その他	—	—				
一般	284,189	—				

中央第二土地区画整理事業 位置図

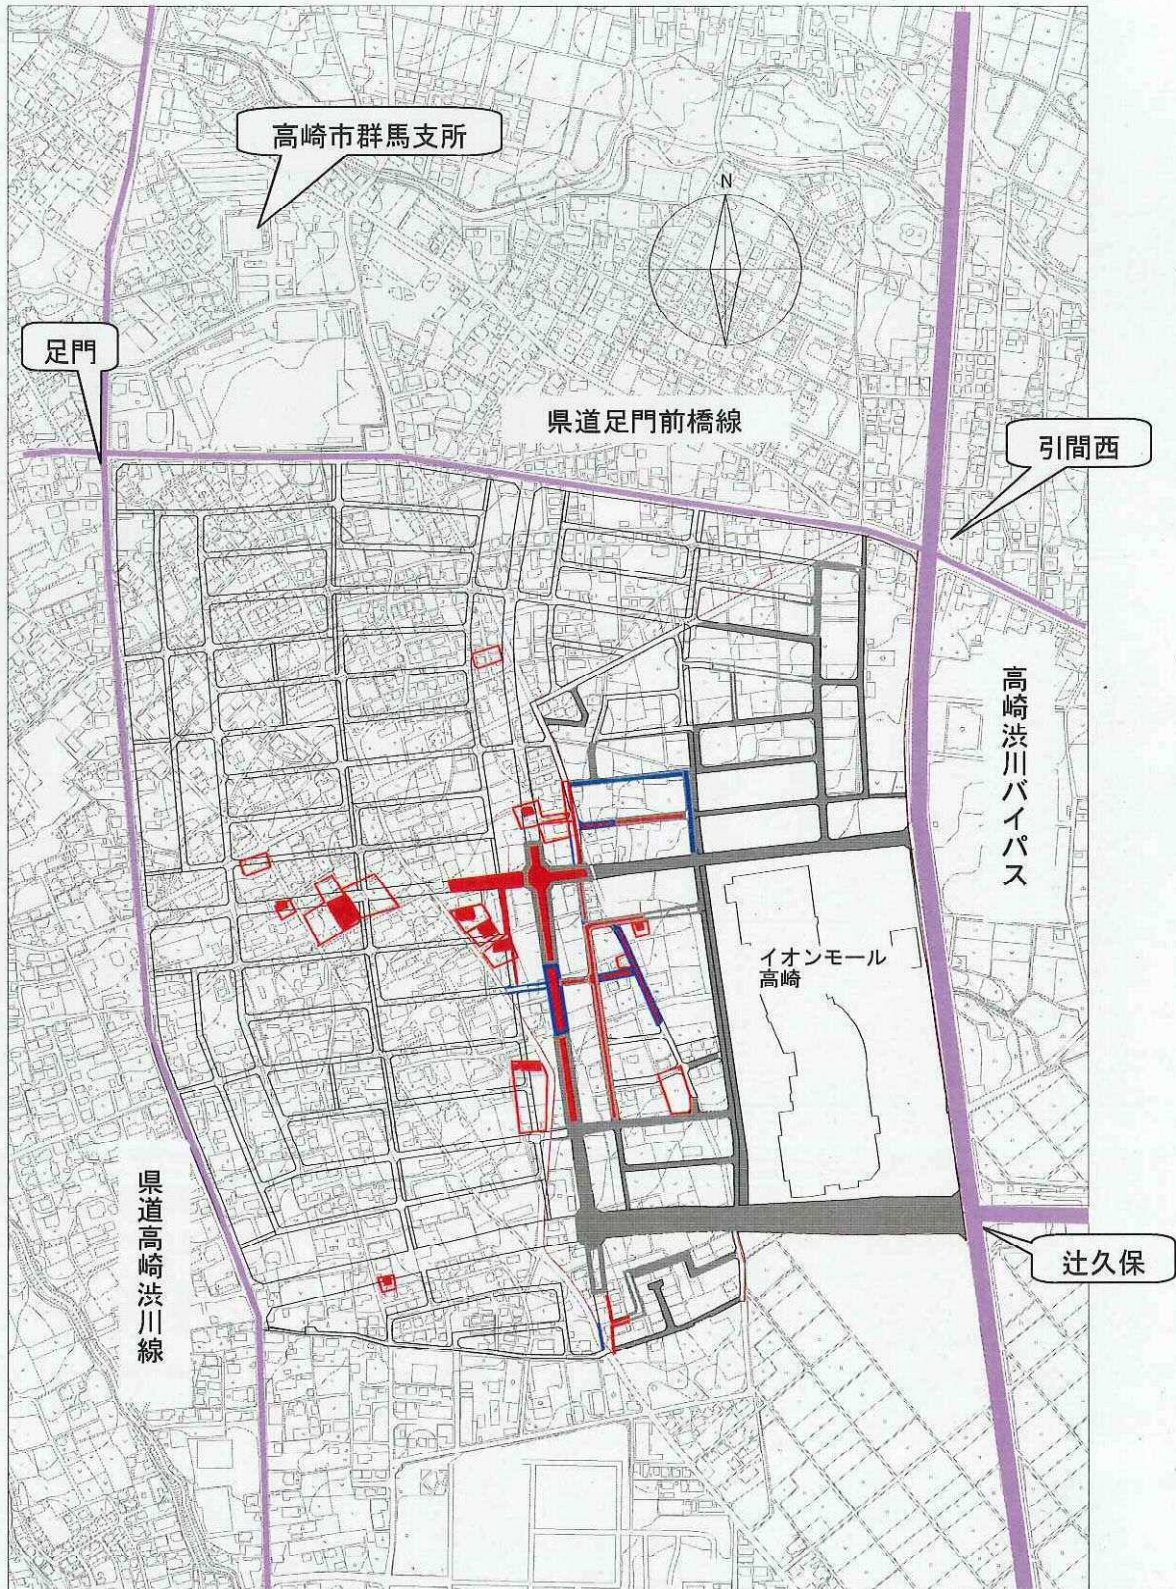

凡 例	
	・・・ 過年度施工済箇所
	・・・ 平成23年度施工箇所
	・・・ 平成24年度施工予定箇所

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	菅谷高畑土地区画整理事業	所属(支所)	都市整備部区画整理課
実施期間	平成9年度～平成30年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	菅谷高畑土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】 21.89ha 【総事業費】 4,027百万円 【事業概要】 都市計画道路1,486m、区画道路4,845m、特殊道路161m、水路79m、公園6,825㎡、上水道7,827m、物件移転118戸 H23末進捗率 66.80%	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他

【年度別推進状況】

区分(千円)	当初予算額	決算額	23年度事業実績		
合計	162,393	140,558	■道路築造工事外	5件	
国	—	—	■建物調査委託外	4件	
県	—	—	■建物移転補償物件	9件	
地方債	36,000	36,000			
その他	—	—			
一般	126,393	104,558			
区分(千円)	当初予算額	決算見込額	24年度事業内容		
合計	140,900	—	《9月26日現在》		
国	—	—	■道路築造工事外	2件施工中	2件予定
県	—	—	■建物調査委託外	4件業務中	1件予定
地方債	36,000	—	■建物移転補償物件	1件施工中	7件予定
その他	—	—			
一般	104,900	—			

菅谷高畑土地区画整理事業 位置図

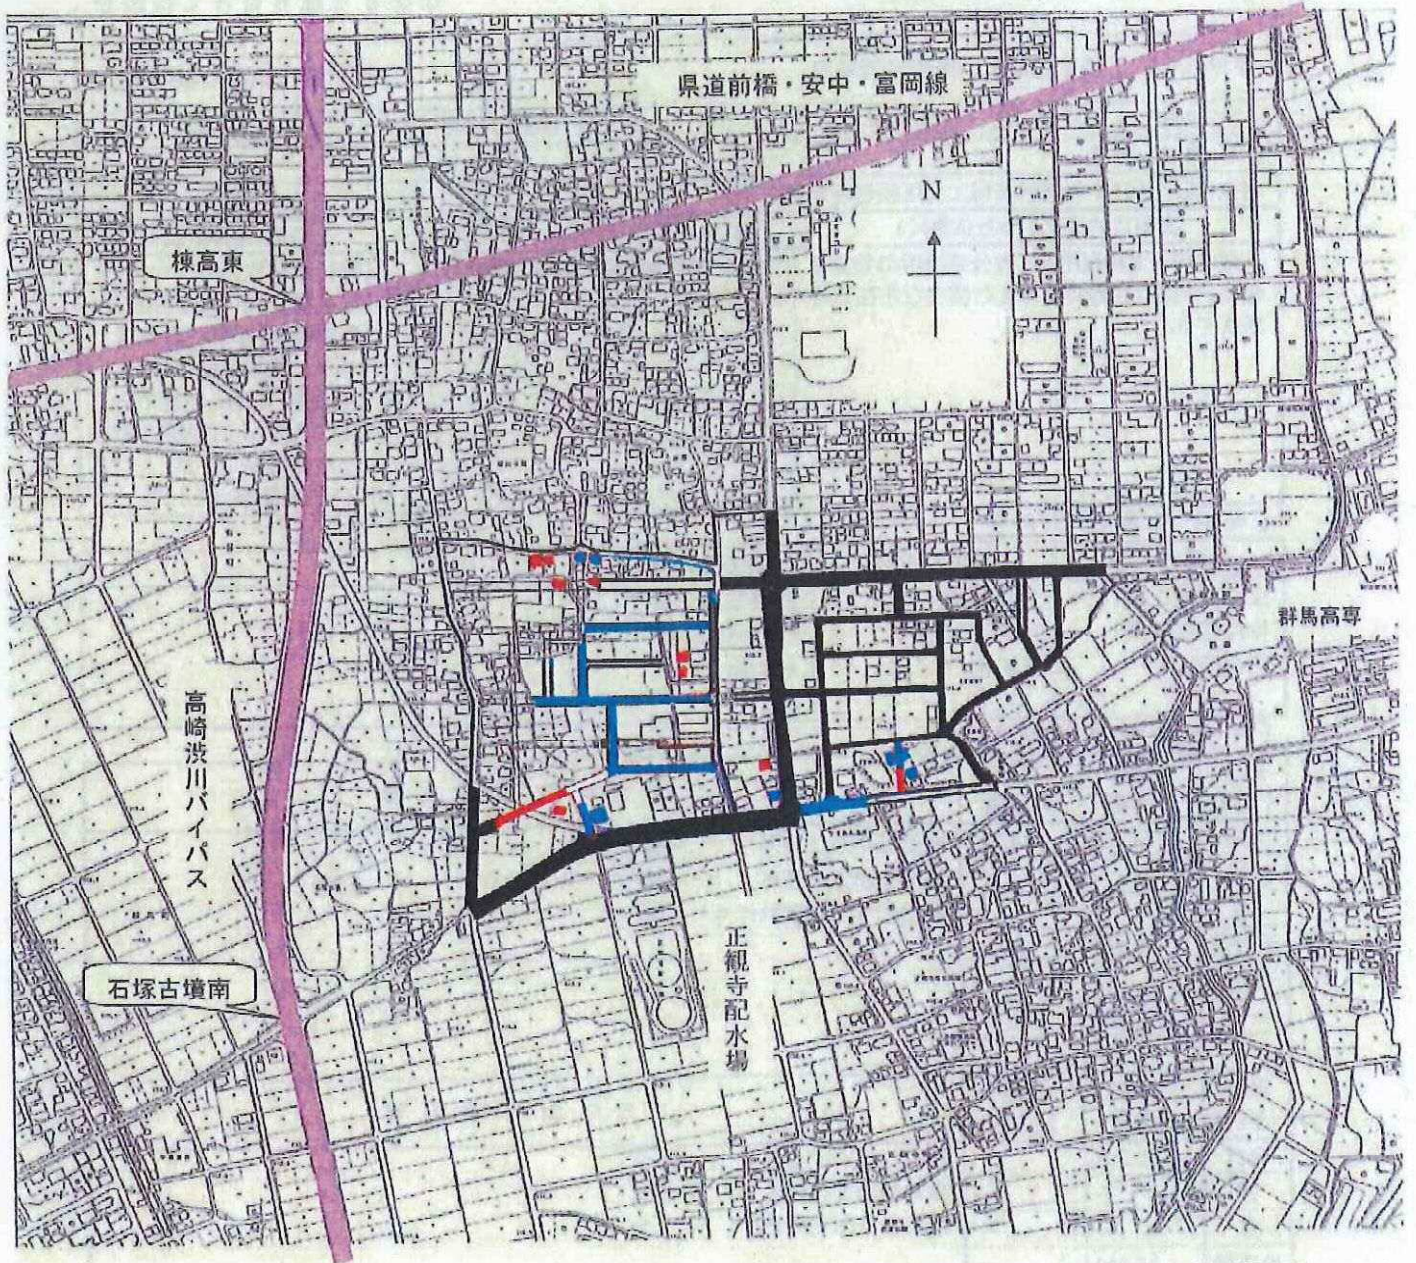

凡 例	
■ . . .	過年度施工済箇所
■ . . .	平成23年度施工箇所
■ . . .	平成24年度施工予定箇所

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	群馬地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	群馬地域の石綿セメント管残存延長 (平成23年度末 58,961.90m)	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の布設替 3,100m	石綿セメント管等の布設替 2,800m	石綿セメント管等の布設替 2,500m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	145,500	150,291	管網整備事業
国	7,000	6,720	・舗装復旧工事 A = 811.7㎡
県	—	—	・配水管布設工事 L = 214.6m
地方債	47,100	58,178	・配水管布設替工事 L = 2,951.2m
その他	—	—	・配水管切廻し工事 L = 56.1m
一般	91,400	85,393	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	117,849	—	管網整備事業
国	—	—	・舗装復旧工事 A = 720.0㎡
県	—	—	・配水管布設工事 L = 170.0m
地方債	51,100	—	・配水管布設替工事 L = 2,190.0m
その他	—	—	(9月末現在 当初予算額ベース進捗率 57%) 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
一般	66,749	—	

平成24年度 配水管布設替事業・整備実績 (平成24年09月26日現在)

水道局工務課

平成24年9月26日現在における進捗率は、当初予算額ベースで57パーセントとなっております。事業内容につきましては石綿セメント管の布設替えが5箇所、箇所別の内訳は塚田町が1箇所、足門町が1箇所、金古町が1箇所、稲荷台町が2箇所となっております。管路延長にいたしましては、1,100.2メートル。口径別内訳は75ミリが468.7メートル、100ミリが631.5メートルとなっております。舗装復旧工事につきましては、3箇所にて1,603.1平方メートルとなっております。

NO	工区名	施工場所	工事概要			備考			
			管種	口径	布設延長 (m)		工期		
1	配水管布設替工事 (第43工区)	塚田町	DIP	75	336	4	契約日の翌日～H24.09.28	施工中	塚田公会堂・北
2	配水管布設替工事 (第07工区)	足門町	DIP	75	105	9	契約日の翌日～H24.07.31	完成	SEIYU足門店・北西
3	配水管布設替工事 (第14工区)	金古町	DIP	100	260	9	H24.05 ~ H24.10.12	施工中	太鼓橋・東
4	配水管布設替工事 (第58工区)	稲荷台町	DIP	100	249	4	契約日の翌日～H24.11.09	施工中	群馬病院・北
			DIP	75	11	1			
5	配水管布設替工事 (第64工区)	稲荷台町	DIP	100	121	2	契約日の翌日～H24.10.26	施工中	群馬病院・北
			DIP	75	15	3			
	計		-	-	1,100	2	-	-	施工中: 994.3m、完成: 105.9m

町別工区数及び布設延長

工区	金古町	足門町	塚田町	稲荷台町	計	備考
工区数	1	1	1	2	5	
布設延長 (m)	2609	1059	3364	3970	1,1002	

管種別・口径別布設延長

管種	口径 (mm)		計		備考
	75	100	150	200	
DIP	468.7	631.5	0	0	1,100.2
P.P	0	0	0	0	0
口径別計	468.7 (42.6%)	631.5 (57.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1,100.2

平成 24 年度 配水管布設替工事 施工箇所位置図

(工務課施行分)

NO. 3

配水管布設替工事 (第 14 工区)

金古町 L=260.9M

NO. 2

配水管布設替工事 (第 7 工区)

足門町 L=105.9M

NO. 1

配水管布設替工事 (第 43 工区)

塚田町 L=336.4M

NO. 5

配水管布設替工事 (第 64 工区)

稻荷台町 L=136.5M

NO. 4

配水管布設替工事 (第 58 工区)

稻荷台町 L=260.5M

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成23年度末 整備面積 288.88ha 整備延長 75.17km	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	206,316	118,749	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 群馬地域 1545.80m 棟高町 1236.10m 菅谷町 309.70m
国	57,462	36,698	
県	—	980	
地方債	72,400	43,000	
その他	27,000	24,345	
一般	49,454	13,726	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	168,184	—	《9月26日現在》 下水道築造工事発注済 群馬地域 管渠布設 L=981.4m 舗装復旧 A=0m ² (当初予算額ベース進捗率34%) 引き続き、污水管渠整備事業を実施します。
国	62,784	—	
県	890	—	
地方債	72,400	—	
その他	25,200	—	
一般	6,910	—	

平成24年度 污水管渠整備事業 施工箇所位置図

(整備課施行分)

NO. 1

幹線下水道築造工事(流開第2Ⅰ区)

棟高町 L=467.5M

NO. 2

枝線下水道築造工事(流開第20Ⅰ区)

棟高町 L=255.4M

NO. 3

枝線下水道築造工事(流開第21Ⅰ区)

菅谷町 L=258.5M
