

第5次総合計画前期実施計画に係る平成24年度の推進状況について

第5次総合計画前期実施計画事業（新町地域）一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)
1～7	自校方式給食拡充事業	教育部 教育総務課 (新町地域振興課)
9	体育館建設事業	教育部 スポーツ課 (新町地域振興課)
11	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)
13～14	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
15～16	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
17	新町支所建替事業	総務部 地域行政課 (新町地域振興課)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育委員会事務局 教育部教育総務課
実施期間	平成23年・24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	給食室・給食センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から自校方式制度を取り入れていく。 また、自校方式への移行に伴い、老朽化した給食センターについて施設を廃止する。	各校に給食室を新設する。また、不要となった給食センターについては、随時解体工事を実施する。		


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
	基本設計 実施設計 測量 地質調査	新設 ・新町中学校 ・新町第二小学校

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	30,200	20,848	・新町中学校 基本設計・実施設計委託 7,560,000円 測量委託 3,202,500円 地質調査委託 1,123,500円 ・新町第二小学校 基本設計・実施設計委託 4,725,000円 測量委託 3,097,500円 地質調査委託 1,139,250円
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	30,200	20,848	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	456,795	—	・新町中学校給食室建設費 253,900千円 建設等工事 247,750千円 初度調弁費 6,150千円 ・新町第二小学校建設経費 202,895千円 建設等工事 197,135千円 初度調弁費 5,760千円
国	17,832	—	
県	—	—	
地方債	363,700	—	
その他	—	—	
一般	75,263	—	

新町中学校給食室(増築部分)配置図

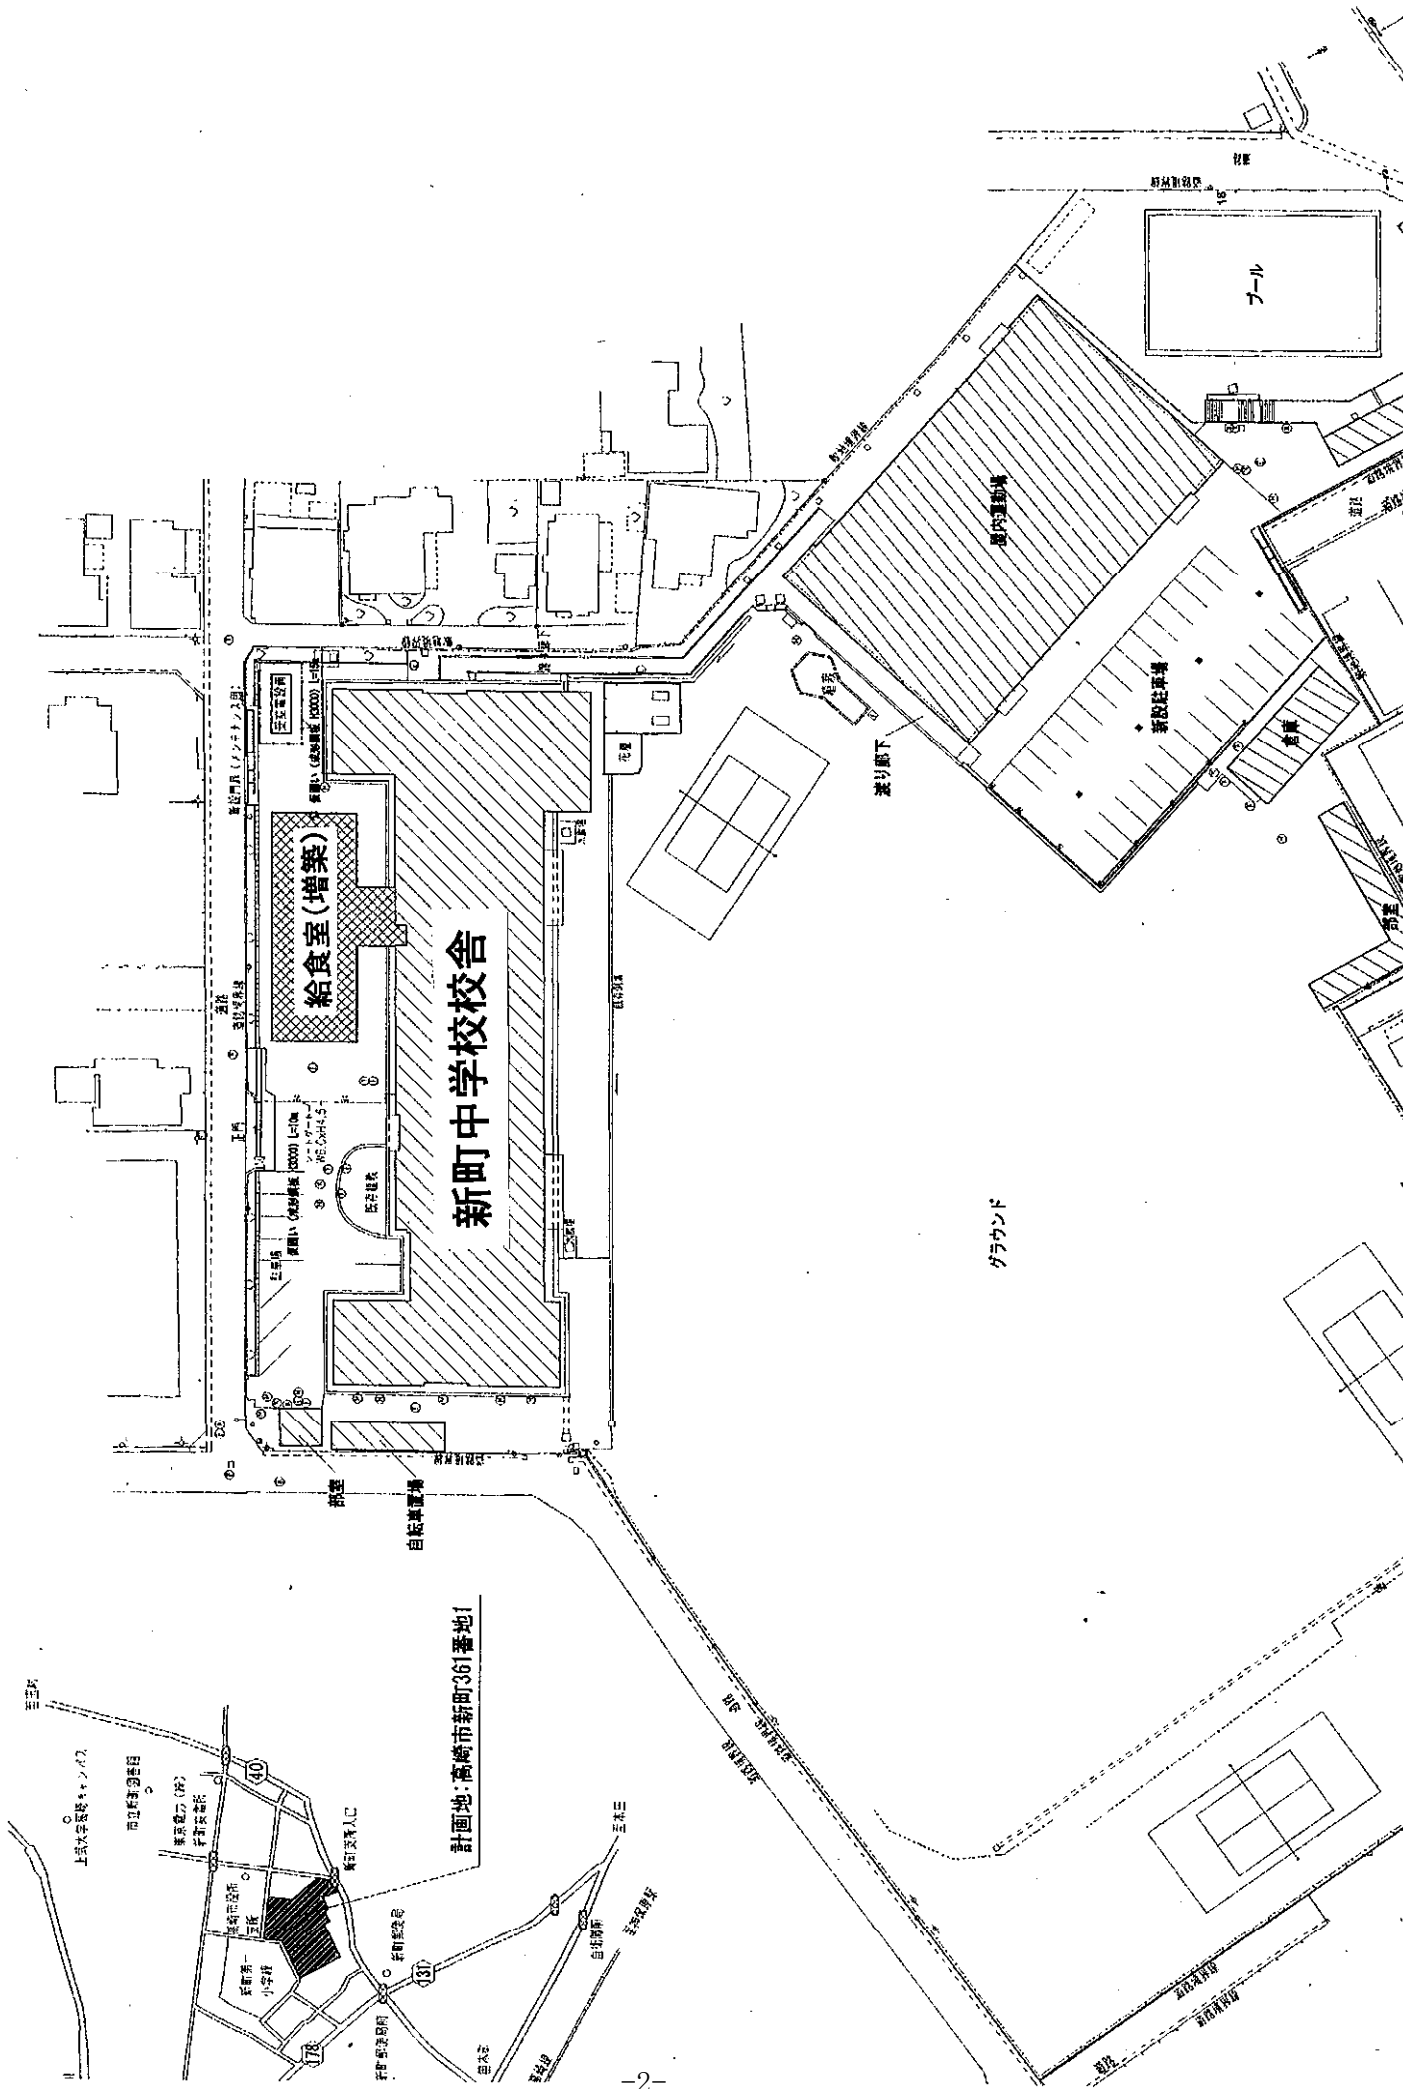

高崎市立新町中学校給食室建設スケジュール（案）

平成22年12月15日

	22年度												23年度												24年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
設計委託																																				
その他委託																																				
給食室建設																																				
特別教室改修工事																																				
附帯工事																																				

注1：スケジュールは全体の流れを示した概要であり、詳細については変更される場合があります。



新町中学校給食室施工表示



本体工事の状況




新設された技術科室



新設された職員駐車場


新町第二小学校給食室(増築部分)配置図

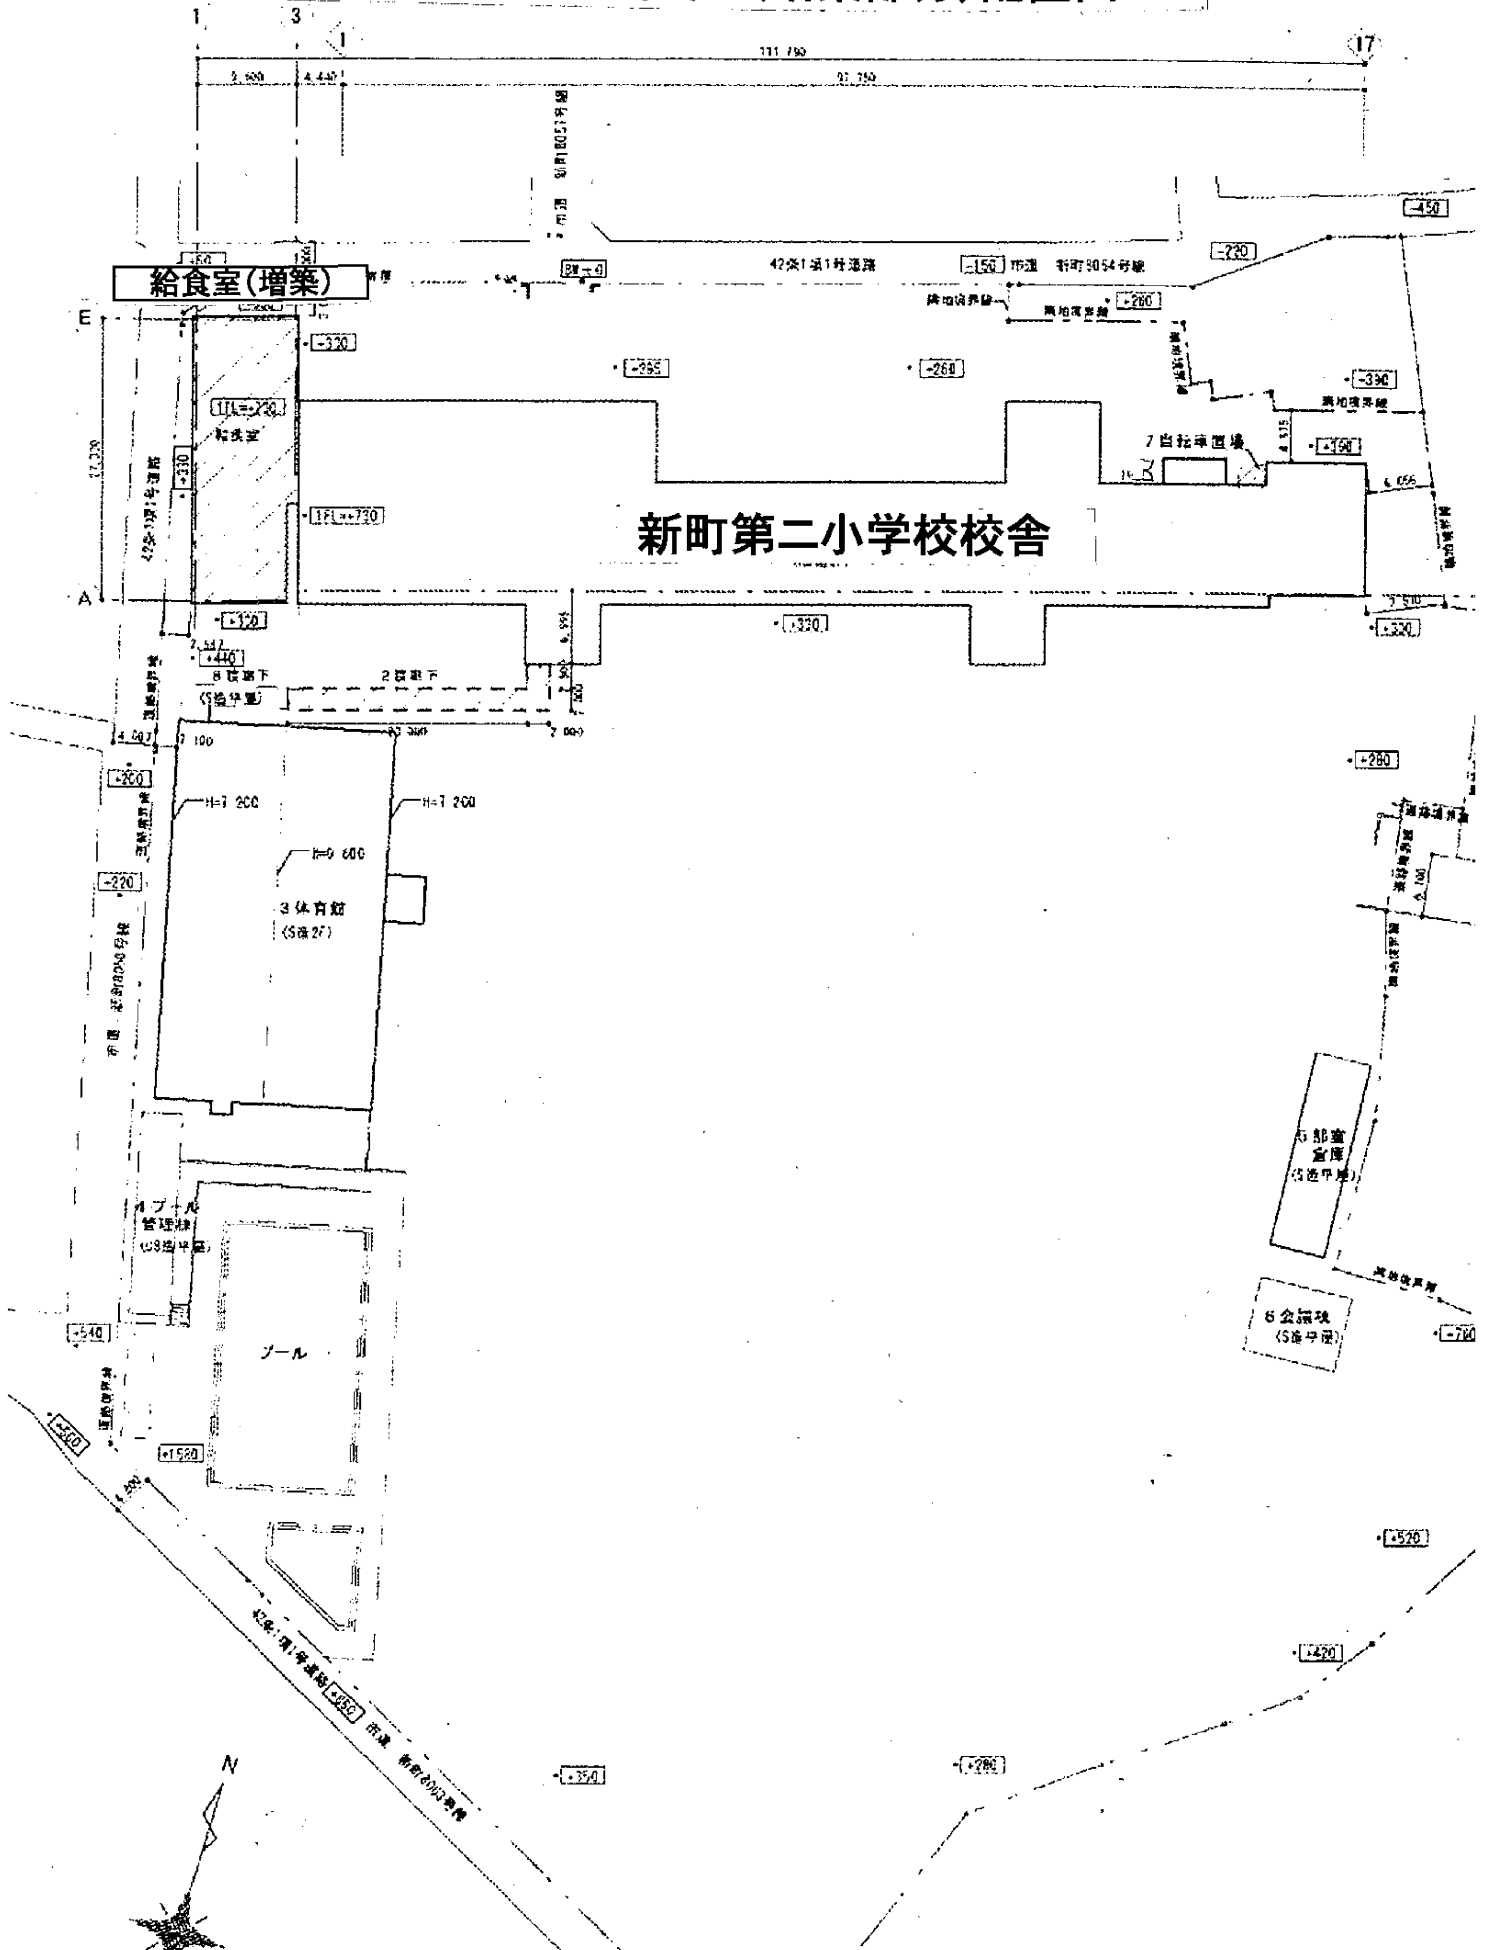

高崎市立新町第二小学校給食室建設等スケジュール（案）

平成23年5月17日現在

	平成23年度												平成24年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
給食室設計				基本設計						実施設計																
その他業務				校地測量業務																						
				地質調査																						
給食室建設工事															配管切廻工事			給食室建設工事								
付帯工事															(準備工事)								外構工事			
														(駐車場整備工事)												
学校給食	給食センターからの配送																									
人員配置等																							栄養士・給食技士配置			
																							物品購入			

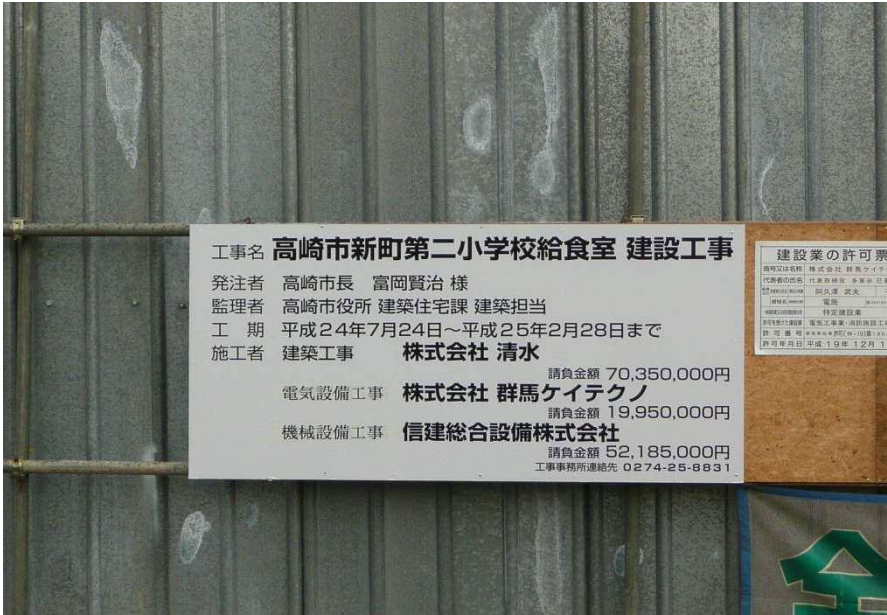

新町第二小学校給食室施工表示



本体工事の状況①



本体工事の状況②



体育館への渡り廊下新設

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	体育館建設事業	所属 (支所)	教育委員会事務局教育部 スポーツ課
実施期間	平成24年度～	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
体育施設の充実を図るため、老朽化している中央体育館及び新町住民体育館の建替建設を行う。	市内の施設配置を考慮した建設候補地の選定を行い、市民の利用促進が図れる体育館建設を目指す。		

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和61年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町駅前第二土地区画整理事業地内		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	・施行面積:13.69ha ・総事業費:4,564,000千円 ・H23年度末進捗率: 84.7%	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	91,554	43,030	・建物工作物等移転補償(3件完了) 建物 2件 ・ 工作物等 1件 ・区画街路第12-3号線外1道路築造工事(一部完成) ・区画整理審議会委員選挙人名簿作成業務(完了)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	91,554	43,040	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	49,672	—	・建物等移転交渉を継続的に実施 建物1件が完了 ・区画街路第3号線道路築造工事(一部予定) 側溝等 11m ・区画整理審議会委員選挙の実施 平成24年5月31日決定
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	49,672	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	新町地域の石綿セメント管残存延長 (平成21年度末 517m)	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の布設替 100m	石綿セメント管等の布設替 100m	石綿セメント管等の布設替 100m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	20,500	25,011	管網整備事業 ・配水管布設替工事 L= 472.4m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	5,400	16,199	
その他	—	—	
一般	15,100	8,812	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	22,266	—	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A=1,050.0㎡ ・配水管布設工事 L= 218.8m ・配水管布設替工事 L= 68.6m ・舗装復旧工事 A= 353.7㎡ (9月末現在 当初予算額ベース進捗率 40%) 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	6,000	—	
その他	—	—	
一般	16,266	—	

平成24年度上水道管網整備事業

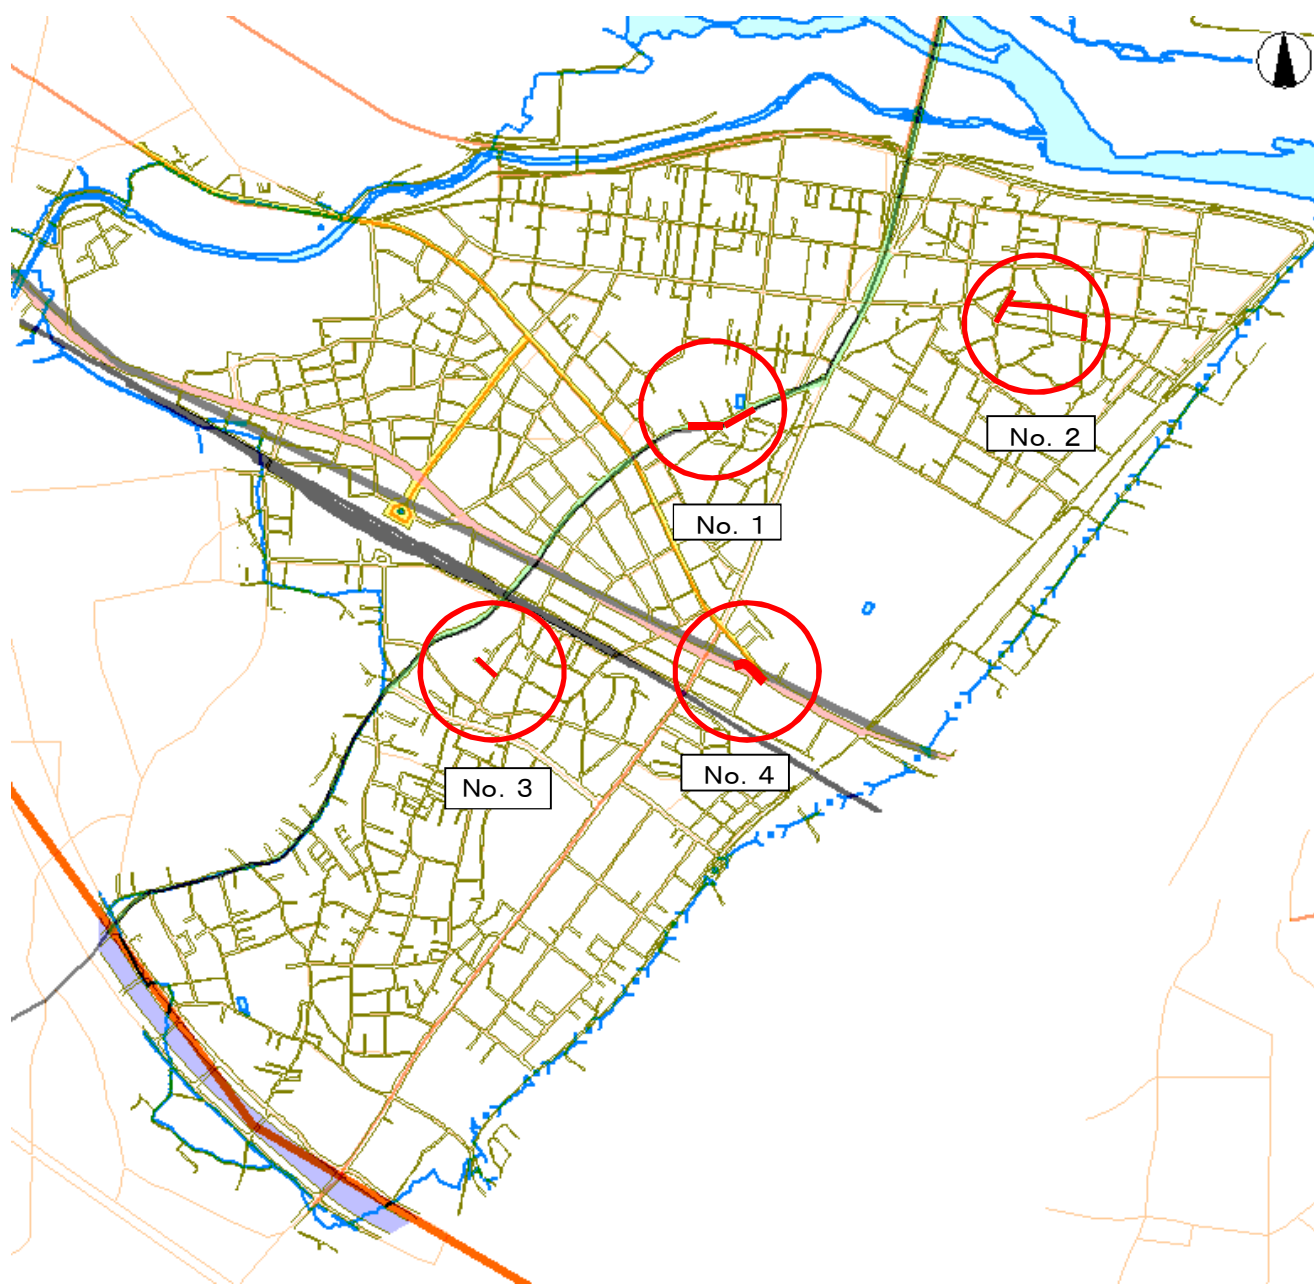

No.	位置	口径等	延長等
1	藤岡・大胡線	舗装	1,050m ²
2	字下河原地内	φ100	218.8m
3	第二保育園東	φ75	68.6m
4	国道17号歩道他	舗装	353.7m ²

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市内における浸水被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成23年度末 整備延長 4.81km	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績		
合計	36,035	29,202	工事名・委託名	発注月	状況
国	7,500	12,537	・神流川雨水1-2号幹線築造工事(第1工区) (□1200mm×1000mm L=106.2m)	H23.10	H24.3 完成
県	—	—			
地方債	15,500	4,300	・新町中排水区基本設計業務委託 (基本設計雨水 A=54ha)	H23.12	H24.3 完成
その他	—	—			
一般	13,035	12,365			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容		
合計	46,408	—	《9月30日現在》		
国	7,500	—	・神流川雨水1-2号幹線築造工事 L=84.7m	発注月	H24.9
県	—	—			
地方債	17,500	—			
その他	—	—			
一般	21,408	—			

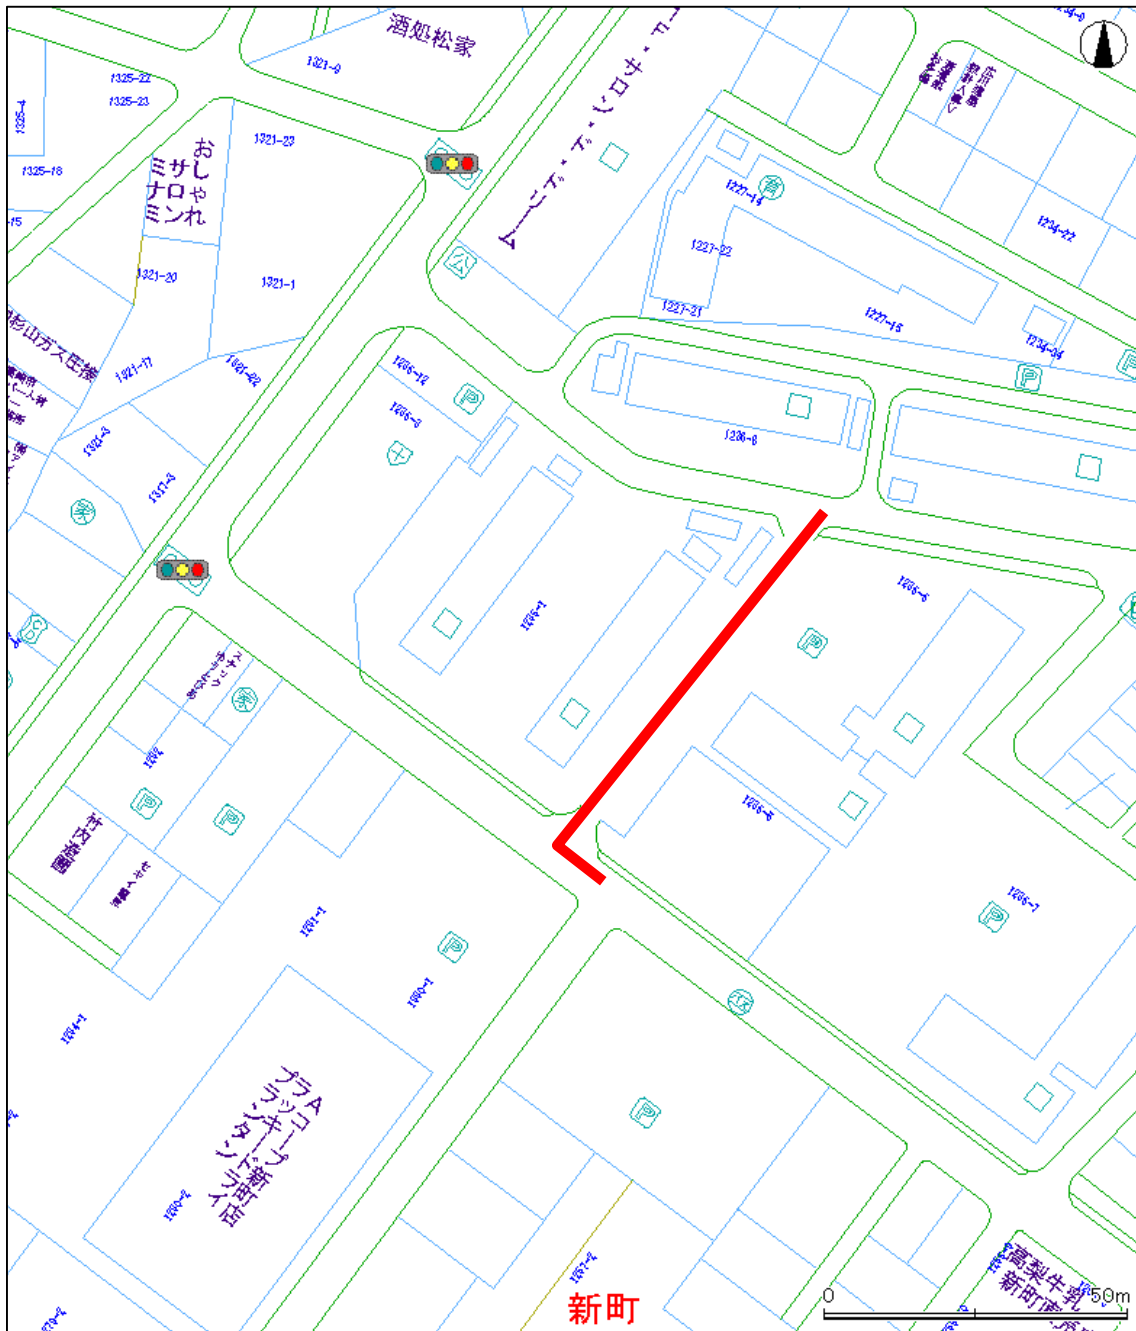

新町南排水区雨水幹線築造工事

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年9月26日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	総務部地域行政課 (新町支所地域振興課)
実施期間	平成24年度～	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
支所庁舎の耐震診断結果による補強の必要性和老朽化による諸機能の低下に伴い、安全で利便性の高い新庁舎を建設する。	用地の有効活用を図りながら、現在の支所の敷地内に新築する。		

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計			<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地(借地を含む)の整理事業) ・複合化施設の検討
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
