第5次総合計画前期実施計画に係る平成22年度の推進状況について

第5次総合計画前期実施計画事業(新町地域)一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)	
1 ~ 2	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)	
3 ~ 4	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)	
5 ~ 6	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)	
7	交通バリアフリー基本構想推進事業	都市整備部 都市計画課	
9 ~ 1 0	新町支所建替事業	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年9月30日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和 61 年度~平成 22 年度	事業の種類	ハード事業


【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町駅前第二土地区	画整理事業地内	
実施目的(ど	ういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
	公共公益施設の整備を を備えた健全な市街地	土地区画整理事業により整備する。	・施行面積 : 13.69ha ・総事業費 : 4,544,000千円 ・H20年度末進捗率 : 79.2%

【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
·建物等移転補償 ·道路築造工事 ·仮換地変更、建物 調査委託等	·建物等移転補償 ·道路築造工事 ·仮換地変更、建物調査 委託等	·建物等移転補償 ·道路築造工事 ·仮換地変更、建物 調査委託等	·清算金徴収、交付 (事業完了後事務)	·清算金徴収、交付 (事業完了後事務)

	之 別 雅 進	P	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	98,236	66,260	・区画街路第3号線道路築造工事 (宝勝寺東門〜銀座通り)
玉	_	_	幅員6.0m ・ 延長50.0m (平成22年1月完成)
県	_	-	
地方債	-	-	・区画街路第3号線道路築造工事に伴う上下水道、ガス工事(10月完成)
その他	_	-	・建物工作物等移転補償 (宝勝寺周辺を中心に4件実施済)
一般	98,236	66,260	・ 建物工作物等移転補頂 (玉勝寺向辺を中心に4件美旭街)
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	89,859	_	・区画街路第3号線道路築造工事 (銀座通り: サトウカバン店周辺)
国	_	_	幅員 6.0m ・ 延長110.0m (予定)
県	_	_	
地方債	_	_	・公園整備工事(群銀南側) 面積 : 536.8㎡ (10月上旬~11月30日)
その他	_	-	・建物等移転交渉を継続的に実施 (建物1棟取り壊し済 ・ 3 件交渉中)
一般	89,859	-	・建物寺移転父砂を極続的に美旭(建物1棟取り壊し街 ・ 3 件父砂中)
			・事業計画変更(期間延長)の申請 (平成23年2月予定)
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	_	-	・建物等移転交渉を継続的に実施
国			
県	_	-	
地方債	_		
その他	_		
一般	_	_	
	_	-	

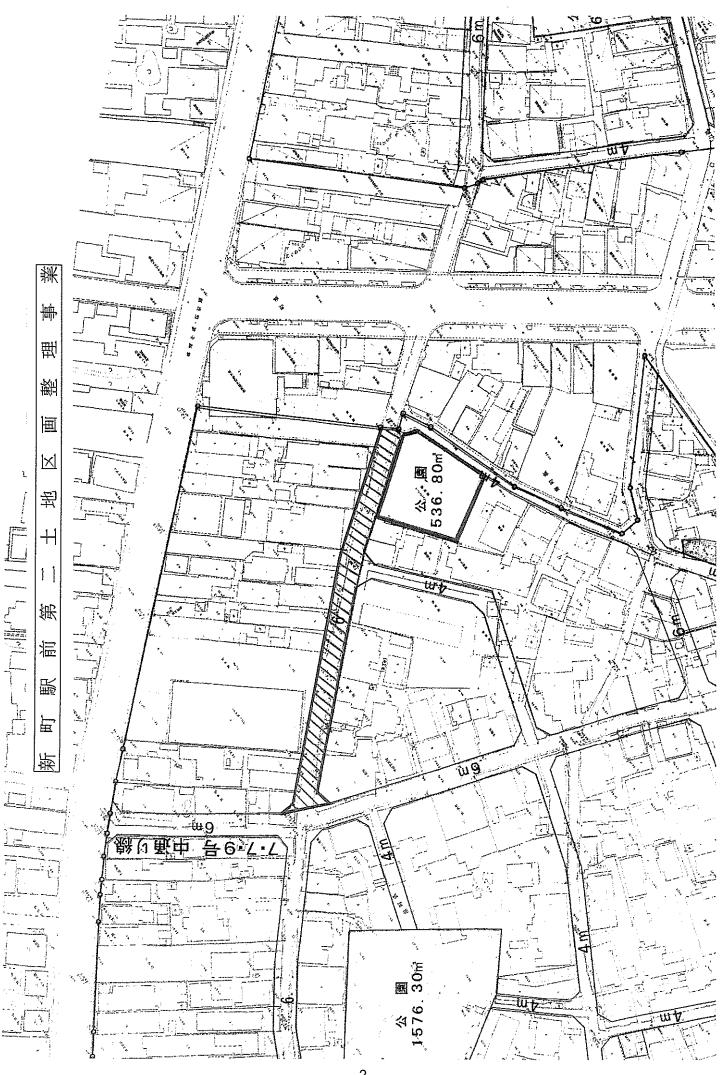

改訂版・第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を) 配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	新町地域の 石綿セメント管残存延長 (平成 21 年度末 517m)

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
石綿セメント管等の 布設替	石綿セメント管等の 布設替	石綿セメント管等の 布設替	
	和政省 100m	和政省 100m	

<u> </u>	、 加 推 進	p		
区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績	
合計	16,719	36,782	管網整備事業	
国		_	・舗装復旧工事 A = 8 5 . 3 m ²	
県			・配水管布設工事 L = 301.6m	
地方債	9,200	15,200	・配水管布設替工事 L = 217.3m	
その他	_	_		
一般	7,519	21,582		
区分	当初	決算	22年度事業内容	
(千円)	予算額	見込額	224及事未约4	
合計	21,941	_	<執行実績>	
玉		_	管網整備事業	
県	_		・配水管布設工事 L = 514.7m	
地方債	5,200	_	(当初予算額ベース進捗率 105%)	
その他		_	引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。	
一般	16,741	_		
区分	当初予	決算額	2 3 年 度 事 業 計 画	
(千円)	算額(案)	見込額		
合計			引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。	
国	_			
県	_			
地方債	_			
その他	_			
一般	_	_		

平成22年度上下水道管網整備事業

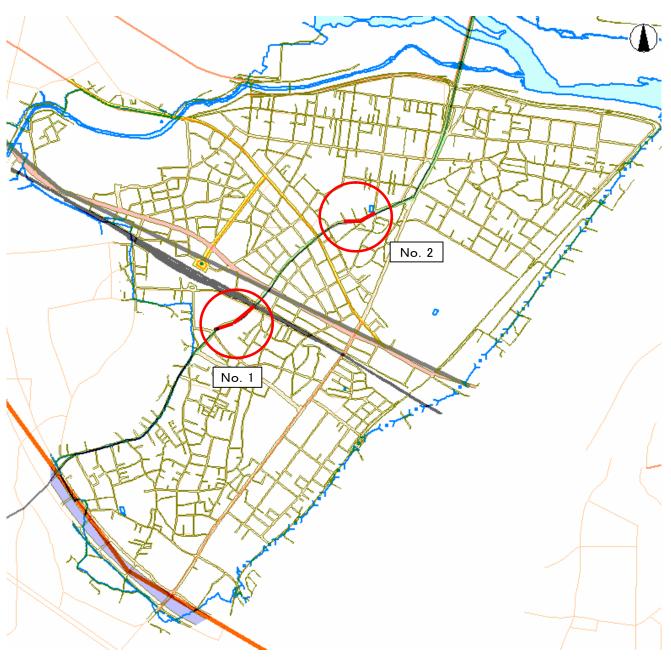

No.	位 置	口径等	延長等
1	藤岡・大胡線	φ100	285.2m
2	藤岡・大胡線	φ150	229.5m
	計	514.7m	

第 5 次総合計画·前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年9月30日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対	象(誰を、何 を)	雨水管渠		
	実施目的((どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
市内	別における浸水	被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成21年度末 整備延長 4. 71km

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	

<u> </u>	. 加 推 進	D	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	19,300	5,261	工事名·委託名
玉	4,700	2,630	•新町南排水区地質調査業務委託 H21.10 H22.2 完成
県	_	_	
地方債	13,600	2,367	
その他	_	_	
一般	1,000	264	
区分	当初	決算	2 2 年 度 事 業 内 容
(千円)	予算額	見込額	224及事未內谷
合計	30,250	_	≪9月30日現在≫
玉	6,400	_	工事名·委託名
県	_		•新町南排水区地詳細設計業務委託 H22.4 H22.9 完成
地方債	7,000	_	(詳細設計(雨水) L=800m)
その他	_	_	
一般	16,850	_	
区分	当初予	決算額	2 3 年 度 事 業 計 画
(千円)	算額(案)	見込額	
合計	_	_	工事名・委託名 発注月
玉	_	_	·新町南排水区雨水幹線築造工事 第3四半期
県	_		
地方債	_		
その他	_	_	
一般	_	_	

平成22年度新町南排水区詳細設計業務箇所

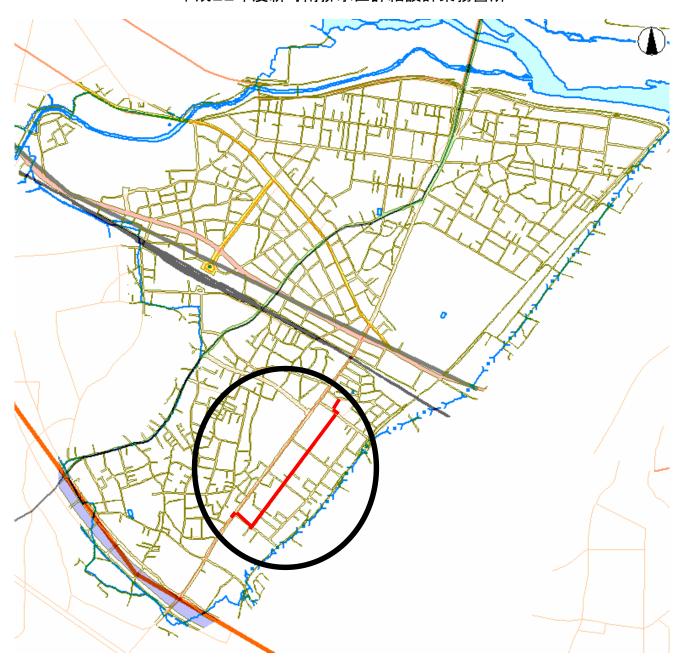

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年9月30日現在

事務事業名	交通バリアフリー基本構想推進事業	所属 (支所)	都市整備部都市計画課
実施期間	全期	事業の種類	ソフト事業

【事業概要】

対象(誰を、何を) 市内の駅周辺		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
多くの人が交流する鉄道駅周辺のバ	高崎市交通バリアフリー基本構想(高崎	
リアフリー化を推進して、誰もが安全で	駅周辺地区)に係る推進組織において、	
快適な社会生活を営むことができるまち	同構想の着実な推進を図る。	
の実現を目指す。	乗降客の多い新町駅と井野駅周辺の	
	バリアフリー基本構想の策定について	
	検討を行なう。	

【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
〇高崎駅周辺基本 構想推進事業 ·道路特定事業 〇新町駅周辺基本 構想策定事業	〇高崎駅周辺基本構 想推進事業 ·道路特定事業 〇新町駅周辺基本構 想策定事業	〇高崎駅周辺基本 構想推進事業 ・道路特定事業 〇新町駅周辺基本 構想策定事業	〇高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 〇新町駅周辺基本構想推進事業 〇井野駅周辺基本構	〇高崎駅周辺基本 構想推進事業 ・道路特定事業 〇新町駅周辺基本 構想推進事業 〇井野駅周辺基本
			想策定事業	構想策定事業

	加 雅 進	D(7)0 A	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	3,000	3,990	バリアフリー推進会議の開催
国	_	_	新町駅周辺基本構想策定に関する調査検討
県	_	_	新町地域バリアフリーワークショップ
地方債	_	_	新町駅周辺バリアフリー基本構想策定協議会
その他	_	_	
一般	3,000	3,990	
	_	_	
区分	当初	決算	2 2 年 度 事 業 内 容
(千円)	予算額	見込額	2 2 并 及 争 未 內 谷
合計	4,000	_	実施すべき特定事業の管理者協議等
国	-	_	新町駅周辺バリアフリー基本構想策定協議会
県	_	_	パブリックコメント
地方債	_	_	高崎市バリアフリー基本構想(新町駅周辺地区)策定
その他	_	_	
一般	4,000	_	
	_	_	
区分	当初予	決算額	2 3 年 度 事 業 計 画
(千円)	算額	見込額	20千及节末前画
合計	_	_	バリアフリー推進会議の開催
国	_	_	道路特定事業計画等の作成
県	_	_	
地方債	_	_	
その他	_	_	
一般	_	_	
	_	_	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年9月30日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成24年度~平成27年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を) 新町支所庁舎		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
支所庁舎の耐震診断結果による補強の必	用地の有効利用を図りながら、現在の支所	
要性と老朽化による諸機能の低下に伴い、	の敷地内に新築する。	
安全で利便性の高い新庁舎を建設する。		

【年度別事業計画】

平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
			基本計画の作成
			基本設計
	平成 21 年度	平成 21 年度 平成 22 年度	平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

1 12	、 加 雅 连 ′	D	
区分	当初	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
(千円)	予算額		
合計	_	_	・公共用地(借地を含む)の整理検討
玉	-	_	・複合化施設の検討
県	_	_	
地方債	_	_	
その他	_	-	
一般	-	_	
	-	_	
区分	当初	決算	0.0 左 座 車 巻 巾 宓
(千円)	予算額	見込額	22年度事業内容
合計	_	_	・公共用地(借地を含む)の整理検討
国	_	_	・複合化施設の検討
県	_	-	
地方債	_	_	
その他	_	_	
一般	_		
	-	-	
区分	当初	決算	
(千円)	予算額	見込額	23年度事業計画
合計	_	_	・公共用地(借地を含む)の整理検討
国	-		・複合化施設の検討
県	-	_	
地方債	-	_	
その他	=		
一般	-		
	-		

支所庁舎等配置図

 	公用車等駐車場	 - -	
	3035 957.00 m ²		

