

第 5 次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

= 目 次 =

1 . 耐震補強事業	1 ページ
2 . 学校体育施設整備事業	2 ページ
3 . 倉渕統合校整備事業	3 ページ
4 . 橋りょう再整備事業 (烏川橋架替工事)	4 ページ
・ 烏川橋架替工事 概要図	5 ページ
5 . 簡易水道整備事業 (倉渕支所管内)	6 ページ
・ 中部簡易水道 配水管布設替工事位置図	7 ページ
・ 三ノ倉簡易水道 送水管布設工事位置図	7 ページ
・ 相満簡易水道 配水管布設替工事位置図	8 ページ
・ 相満簡易水道 水源地改修工事位置図	8 ページ
6 . 小栗の里整備事業	9 ページ

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	耐震補強事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (倉渚支所地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
児童・生徒が学校生活を送るために安全・安心な環境を実現することを目的とする。 学校施設は地震等の災害時に避難場所となることから耐震性の確保は重要であり、耐震性の低い施設の計画的な改善を図る。	新耐震設計基準で施工された施設以外について耐震診断を実施する。診断の結果「補強必要」と判定された施設について耐震補強設計、耐震補強工事を実施する。	市立学校(小・中・養護学校、高校、幼稚園)の耐震化率 21年3月31日:56.8% 22年3月31日:60.0%	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	487,113	396,898	・耐震診断(9校17棟) 北部小2棟、大類小1棟、中居小2棟、乗附小3棟、六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、 長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ・耐震補強設計(8校16棟) 西部小1棟、倉賀野小2棟、倉渚中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、 大類中5棟、倉賀野中2棟 ・耐震補強工事(7校14棟) 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、北部小1棟、第一中3棟、 箕輪小1棟(21・22年度工事)、車郷小1棟(21・22年度工事)
国	140,158	167,161	
県	—	—	
地方債	207,500	119,900	
その他	—	—	
一般	139,455	109,837	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	584,144	—	・耐震診断(13校園28棟) 金古南小1棟、宮沢小3棟、片岡小3棟、佐野小3棟、中居小2棟、南八幡小2棟、 北部小1棟、新高尾小2棟、南小2棟、長野郷中5棟、倉賀野中2棟、片岡中1棟、 かぶら幼稚園1棟 ・耐震補強設計(6校11棟) 六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、中居小2棟、長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ・耐震補強工事(9校16棟) 西部小1棟、倉渚中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中5棟、 倉賀野中2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟
国	167,309	—	
県	—	—	
地方債	278,600	—	
その他	—	—	
一般	138,235	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	・耐震診断 ・耐震補強設計 耐震診断の結果、補強必要と判定された棟について耐震補強設計を実施する。 ・耐震補強工事 耐震補強設計を実施した棟について補強工事を実施する。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (倉渚支所地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共に健全でゆとりのある学校生活を送るために、安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。 学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保が重要になる。	老朽化した屋内運動場(屋体)及びプールの改築を行う。 また、プールの無い学校にプールの新築を行う。	老朽化・耐震性を考慮し、改築等を行う。	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
・中居小学校 プール改築	・倉渚統合小学校 プール改築 ・中川小学校 プール改築	・プール改築	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	350,429	341,378	<ul style="list-style-type: none"> ・倉渚中学校屋内運動場改築 屋内運動場・武道場建設工事(20年度から継続) 既存屋内運動場解体工事、外構工事、部室建設工事等 ・倉渚中学校プール新築 ステンレス製25mプール建設工事、更衣室等附属屋建設工事等 ・倉渚地域以外 新町第一小学校・箕郷中学校屋内運動場改築、新町第一小学校プール改築、 箕郷中学校プール新築、養護学校プール改築
国	53,638	104,975	
県	—	—	
地方債	263,500	208,900	
その他	—	—	
一般	33,291	27,503	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	10,727	—	<ul style="list-style-type: none"> ・中居小学校プール改築(プール使用終了後着工～年度内完成予定) 21年度繰越事業:地域活性化・きめ細かな臨時交付金を利用 繰越予算額 125,774 千円 ・倉渚統合小学校プール設計(年度内設計終了予定) ・中川小学校プール設計(年度内設計終了予定)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	10,727	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	倉渚統合校整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (倉渚支所地域振興課)
実施期間	平成21年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設(倉渚統合小学校、現倉渚中央小学校)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
学校統合を機に、より一層の教育環境の充実を図るために、校舎を増築することにより既存校舎にはない機能を追加する。	校舎増築にあたっては、既存校舎にはない多目的教室を中心に施設整備を進める。	22年度に施設整備工事を実施し、23年度に統合校を開校する。	

【年度別事業計画】

平成22年度				
校舎増築工事				

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	7,296	8,316	・校舎増築設計 増築校舎の概要 構造・規模:鉄骨造2階建、床面積約500㎡ 主な所要室:多目的教室、コンピュータ教室、教育相談室、地域支援センター室 ・学校敷地測量 ・建設予定地の地質調査
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	7,296	8,316	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	170,499	—	・統合校整備事業 校務員宿舎等解体工事(4月中、終了) 既存校舎排水管等切廻し及び合併浄化槽設置工事(6月頃～夏休み中、終了) 校舎増築工事(9月頃～年度内) ・関連事業 埋蔵文化財発掘調査(4月頃～6月頃、終了) 既存校舎耐震補強・屋上防水工事(7月頃～11月頃)
国	31,900	—	
県	—	—	
地方債	114,100	—	
その他	—	—	
一般	24,499	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	橋りょう再整備事業	所属 (支所)	建設部土木課 (建設課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	昭和55年以前に架設された橋りょう		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
昭和55年以前の橋りょうについては明確な耐震基準が適用されておらず、阪神大震災ではこれらの橋梁が重大な被害を受けている。新潟中越地震では、耐震補強された橋梁については甚大な被害が報告されておらず、橋梁の耐震補強の重要性が示された。橋りょうの再整備を行い、大規模地震等の災害に強いまちを構築する。	現行の耐震基準に適合するように既存橋梁の耐震補強を図るとともに、老朽化した橋梁の更新を行う。	架設年次が昭和55年で橋長 15m以上の橋りょう数 227 橋	


【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
烏川橋架替工事	烏川橋架替工事 豊岡陸橋詳細設計	烏川橋架替工事 豊岡陸橋耐震補強工事 浜尻陸橋補修工事	

【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	10,700	8,705	烏川橋 河川占用等許可申請 用地取得及び物件補償等
国	—	5,000	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	10,700	3,705	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	27,360	—	烏川橋 地元説明会 仮設道路工事(右岸) 仮橋工事(右岸橋台・橋脚)
国	11,000	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	16,360	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	烏川橋 仮橋架設(左岸橋台、上部工)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

計画概要図

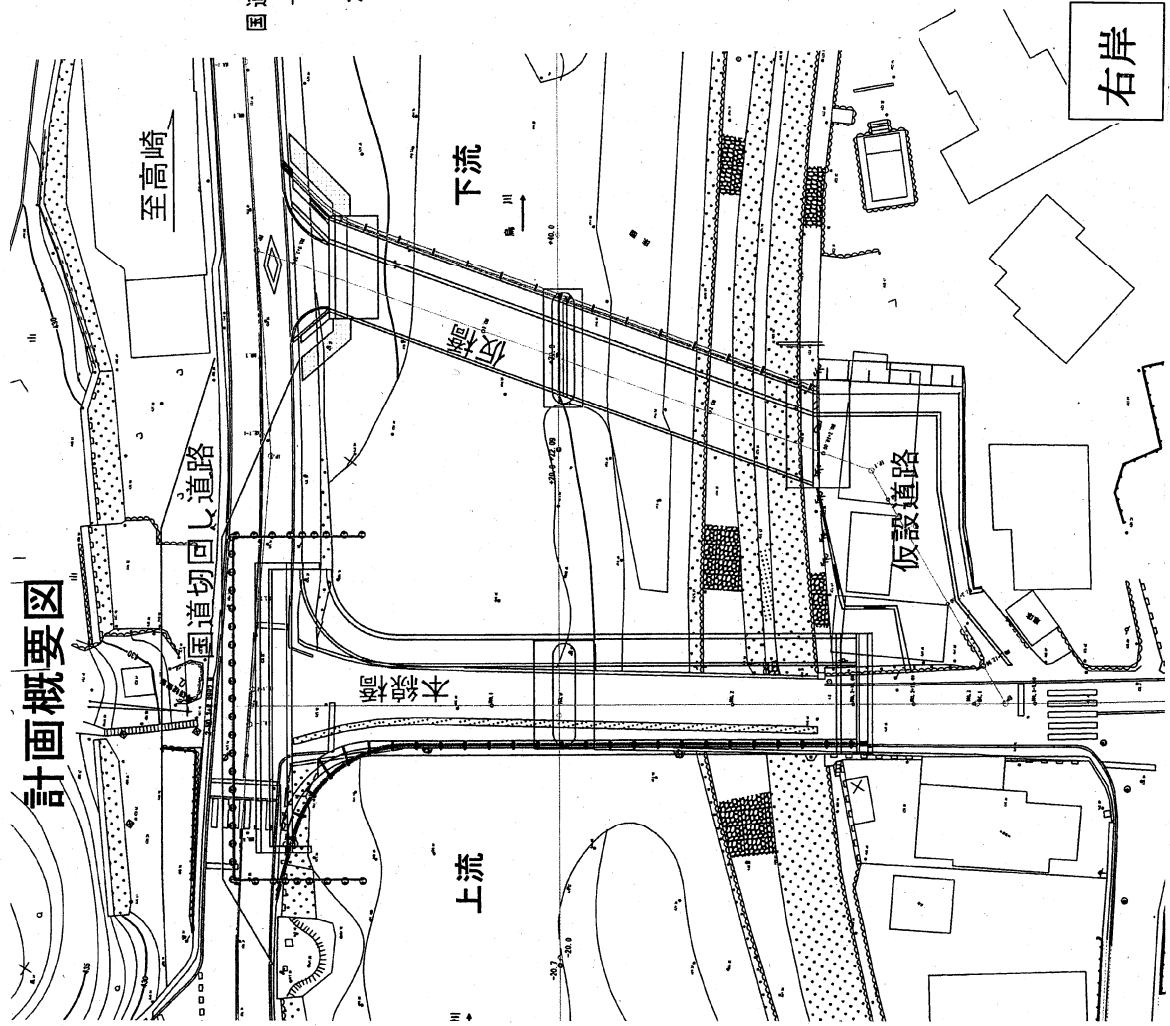


仮橋概要図

側面図

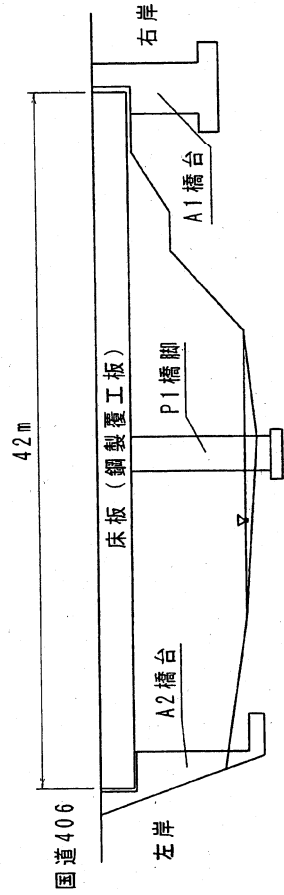

上部工標準断面図

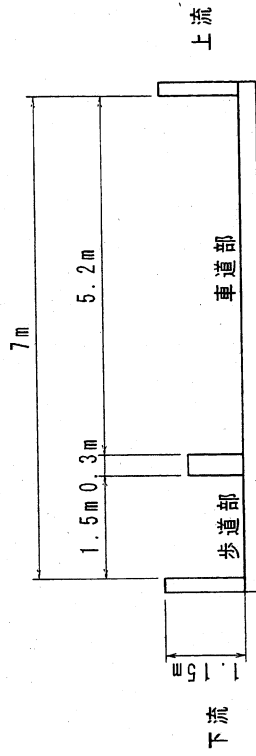

工事概要	仮設道路	補強盛土工一式
	仮橋	A1橋台工
		P1橋脚工
工期	自	平成22年10月中旬(予定)
	至	平成23年3月中旬(予定)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局経営企画課 (建設課)
実施期間	平成18年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	簡易水道		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
簡易水道の安定供給を図る。	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	【簡易水道事業等】 倉渚支所管内8事業、箕郷支所管内2事業、榛名支所管内8事業	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	施設の整備、維持管理	

【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	169,557	169,471	■施設整備6施設、維持管理・水質検査18施設 施設整備 中部簡易水道 配水管布設替工事(L=878m) 三ノ倉簡易水道 第3配水池設備工事(滅菌機・残塩計) 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事(L=1,397m) 維持管理・水質検査 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	5,125	5,125	
地方債	—	—	
その他	95,132	108,940	
一般	69,300	55,406	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	138,643	—	■施設整備6施設、維持管理18施設 施設整備 中部簡易水道 配水管布設替工事(L=732m) 三ノ倉簡易水道 送水管布設替工事(L=290m) 相満簡易水道 配水管布設替(L=732m)・水源改修工事(集水弁等) 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	82,682	—	
一般	55,961	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	■施設整備6施設、維持管理・水質検査18施設 施設整備 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事 維持管理 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

事業名	中部簡易水道 配水管布設替工事	場所	水押地内
-----	-----------------	----	------

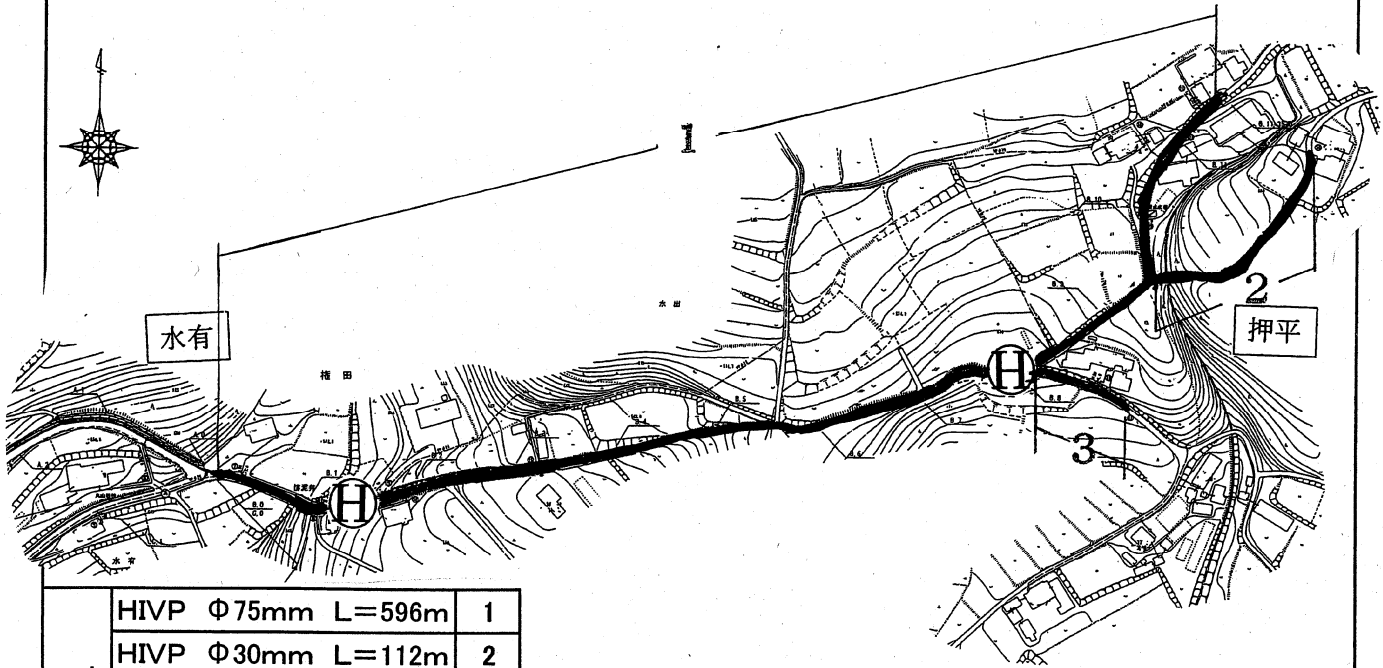


工事概要	HIVP Φ 75mm L=596m	1
	HIVP Φ 30mm L=112m	2
	HIVP Φ 25mm L=24m	3
	消火栓(新設) 2基	Ⓜ
給水管切替 11力所		
工期	自	平成22年8月28日
	至	平成22年11月30日

事業名	三ノ倉簡易水道 送水管布設工事	場所	細入地内
-----	-----------------	----	------

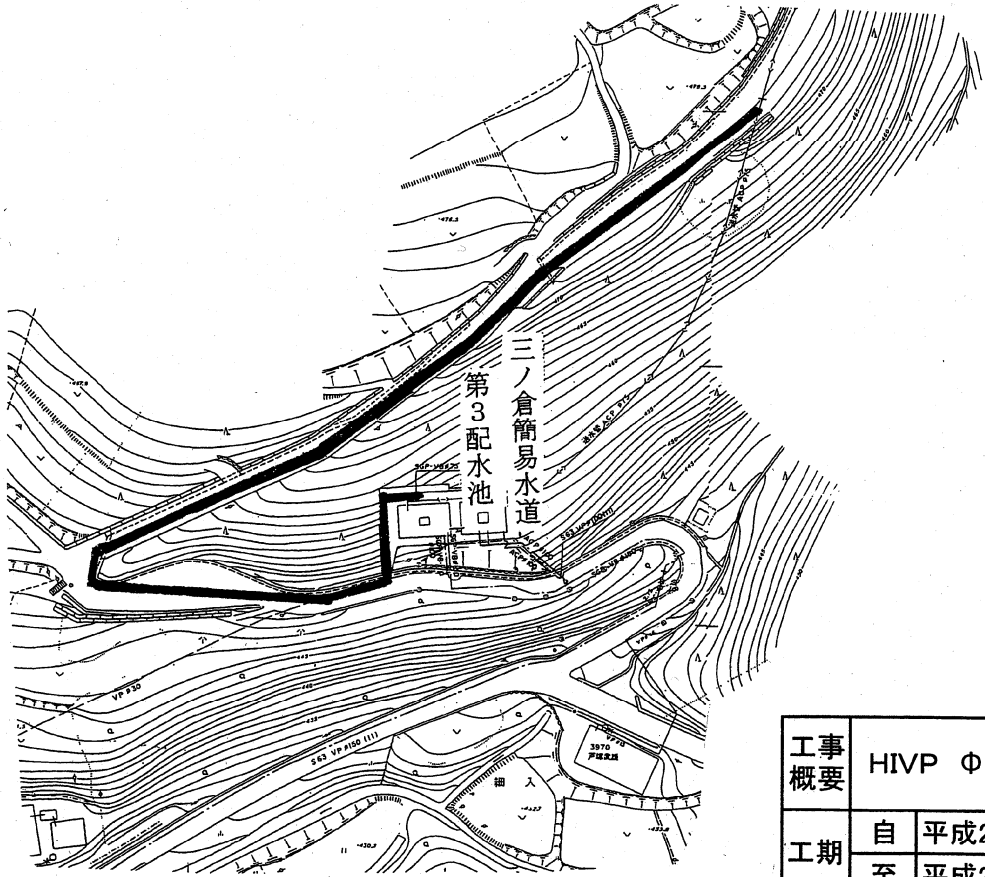

工事概要	HIVP Φ 75mm L=290m	
工期	自	平成22年8月31日
	至	平成22年11月15日

事業名	相満簡易水道 配水管布設替工事	場所	相満・東吾妻町大久保の一部
-----	-----------------	----	---------------

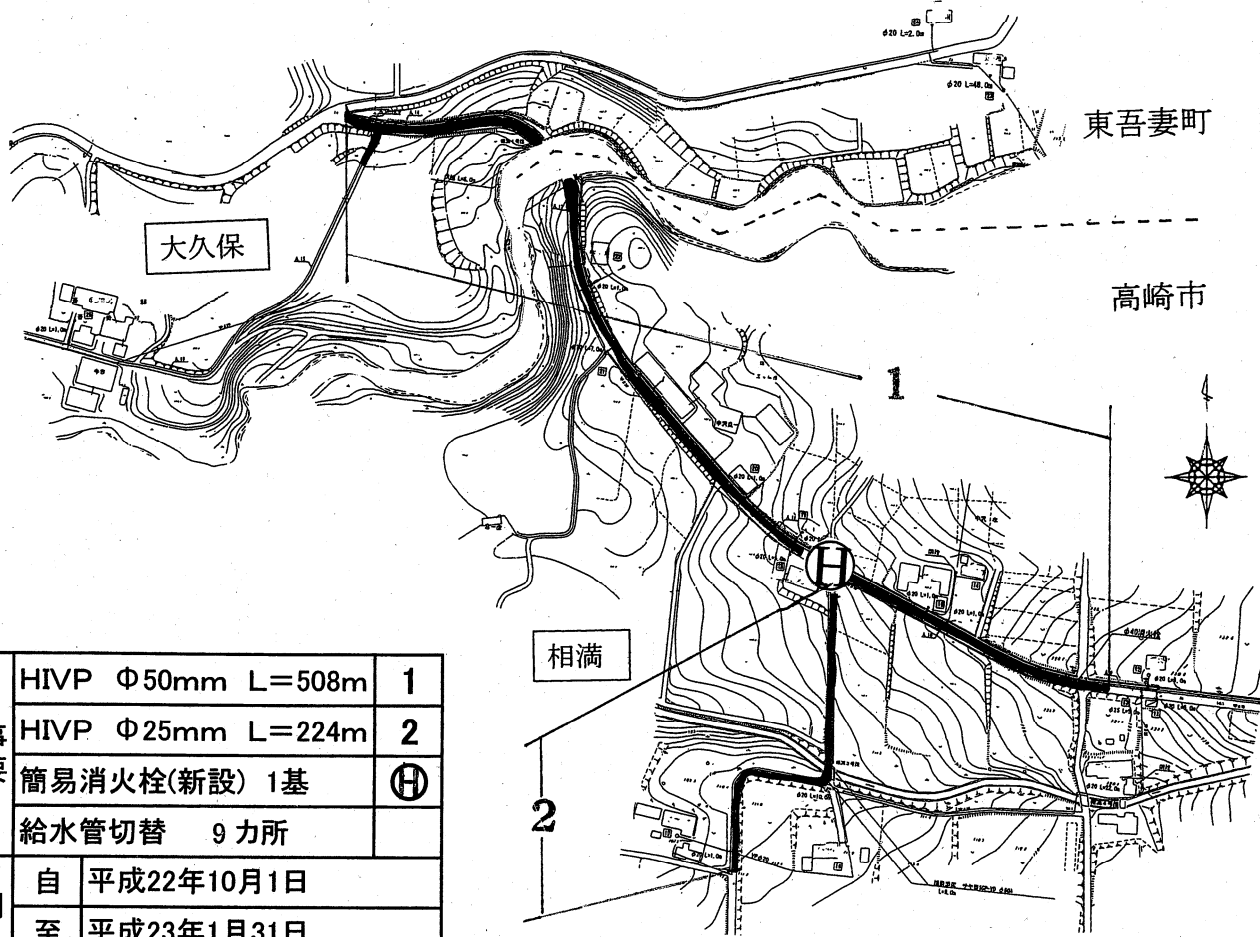

工事概要	HIVP Φ50mm L=508m	1
	HIVP Φ25mm L=224m	2
	簡易消火栓(新設) 1基	Ⓜ
	給水管切替 9力所	
工期	自 平成22年10月1日	
	至 平成23年1月31日	

事業名	相満簡易水道水源地改修工事	場所	三ツ塚原地内
-----	---------------	----	--------



工事概要	HIVP Φ75mm L=10m
	施設 1ヶ所
	外壁 23.4㎡
工期	自 平成22年10月1日
	至 平成23年1月14日

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	小栗の里整備事業	所属 (支所)	地域振興部地域づくり推進課 (倉渚支所地域振興課)
実施期間	平成18年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域の活性化を図るため、市民や観光客が、憩い楽しめる倉渚地域の情報発信基地の要素をもった拠点施設を整備する。	倉渚地域の自然や観光、小栗上野介の歴史遺産などを活用した施設整備を行なう。	19年度に基本構想策定、20年度に基本計画策定、21年度基本計画詳細検討、22年度に基本設計、運営計画、23年度に実施設計、24年度に施設整備。 平成18年度からの全体事業費 956,881千円、平成21年度までの進捗率1%	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
基本設計 地質調査 運営計画 建設懇話会運営	実施設計 建設懇話会運営	施設整備 建設懇話会運営	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	5,608	5,458	<ul style="list-style-type: none"> ■高崎市小栗の里整備事業「道の駅」事例調査業務委託 契約金額 472,500円 委託期間 平成21年7月6日～8月24日 ■高崎市小栗の里整備事業「道の駅」基本方針提案業務委託 契約金額 493,500円 委託期間 平成21年7月10日～8月24日 ■高崎市小栗の里整備基本計画詳細検討業務委託 契約金額 3,900,000円 委託期間 平成21年11月5日～3月1日 委託内容 倉渚支所周辺施設のコンバージョン基本計画、施設の管理運営方法等 ■推進体制の整備 小栗の里整備事業庁内推進連絡会議 3回 (8月26日・11月25日・3月24日) 高崎市小栗の里物販ワーキンググループ会議(10団体) 2回 (11月20日・2月17日) 個別ヒアリング(5日間・17団体・延べ39名) (11月26日～12月5日) 小栗の里拠点施設建設懇話会 4回 (12月9日・2月1日・2月22日・3月24日)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	5,608	5,458	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	15,931	—	<ul style="list-style-type: none"> ■小栗の里拠点施設建設基本設計業務委託 契約金額 4,305,000円 委託期間 平成22年9月16日～平成23年3月11日 ■倉渚支所改修基本設計業務委託 契約金額 5,197,500円 委託期間 平成22年9月25日～平成23年3月11日 ■高崎市小栗の里拠点施設運営計画等策定業務委託 契約金額 3,999,450円 委託期間 平成22年9月1日～平成23年3月25日 ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営 ■地質調査
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	15,931	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ■拠点施設の実施設計 ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
