

第5次総合計画前期実施計画事業推進状況

= 目 次 =

1 . 耐震補強事業	1 ページ
2 . 学校体育施設整備事業（倉渕中屋体改築・倉渕中プール新設）……	2 ページ
3 . 橋りょう再整備事業（烏川橋架替工事）……………	5 ページ
4 . 倉渕地域ふるさと住宅等整備事業	7 ページ
5 . 簡易水道整備事業（倉渕支所管内8事業）……………	9 ページ
6 . 小栗の里整備事業	12 ページ

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月29日現在

事務事業名	耐震補強事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (倉淵教育課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共にゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持することを目的とする。学校施設は災害時に避難場所となることから、耐震性の確保は非常に重要であり、耐震性の低い施設の計画的な改修を図る。	新耐震設計基準施行以前の建物について、耐震診断を実施する。診断の結果「補強必要」と判定された建物については、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する。	平成21年4月1日時点 昭和56年以前259棟 改善済(補強等)79棟 補強等予定180棟	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
耐震診断	耐震診断	耐震診断	耐震診断	耐震診断
耐震補強設計	耐震補強設計	耐震補強設計	耐震補強設計	耐震補強設計
耐震補強工事	耐震補強工事	耐震補強工事	耐震補強工事	耐震補強工事

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	339,649	218,020	■耐震診断 7校16棟 西部小1棟、倉賀野小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中8棟、倉賀野中1棟 ■耐震補強設計 6校13棟 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟、第一中3棟 ■耐震補強工事 6校13棟 京ヶ島小1棟、片岡小3棟、北小1棟、東部小5棟、六郷小2棟、新町第二小1棟
国	158,137	93,889	
県	-	-	
地方債	134,200	77,200	
その他	-	-	
一般	47,312	46,931	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	487,113	-	■耐震診断 9校17棟 北部小2棟、大類小1棟、中居小2棟、乗附小3棟、六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ■耐震補強設計 8校15棟 西部小1棟、倉賀野小2棟、倉淵中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中5棟、倉賀野中1棟 ■耐震補強工事 7校14棟 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟、北部小1棟、第一中3棟
国	140,158	-	
県	-	-	
地方債	207,500	-	
その他	-	-	
一般	139,455	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	-	-	■耐震診断 ■耐震補強設計 前年度の診断の結果、補強必要と判定された棟について補強設計を実施 ■耐震補強工事 前年度に耐震補強設計を行った棟について補強工事を実施
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月29日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (倉渚教育課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身共に健全でゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保は非常に重要である。	老朽化した屋内運動場及びプールの改築を行う。また、プールの新築も行う。	【屋内運動場】平成20～21年度 箕郷中・倉渚中・新町第一小改築 【プール】平成21年度 新町第一小改築、 箕郷・倉渚中新築	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
新町第一小屋体改築 箕郷中屋体改築 倉渚中屋体改築	新町第一小屋体改築 箕郷中・倉渚中屋体改築 新町第一小プール改築 箕郷・倉渚中プール新築 養護学校プール改築		プール改築	プール改築

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	423,939	167,328	■倉渚中学校屋内運動場建設事業 用地測量、改築工事に着手 ・改築屋内運動場 構造規模:鉄骨造平家建て、延床面積1,475㎡(武道場422㎡を含む) 契約額 :399,420,000円(平成20年9月30日～平成21年7月10日) ■倉渚中学校プール建設事業 ・プール設計 契約額:1,890,000円(平成20年7月15日～平成20年12月26日)
国	79,323	46,985	
県	-	-	
地方債	301,700	103,700	
その他	-	-	
一般	42,916	16,643	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	350,429	-	■倉渚中学校屋内運動場建設事業 屋内運動場・武道場建設工事、外構工事、既存屋内運動場解体工事等 ■倉渚中学校プール建設事業 構造規模:ステンレス製、25mプール・水面積235㎡ 契約額 :83,422,500円(平成21年9月19日～平成22年3月18日)
国	53,638	-	
県	-	-	
地方債	263,500	-	
その他	-	-	
一般	33,291	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

倉淵中学校屋内運動場建設事業

正面(南側)



正面(北側)



側面(北側)



裏面(南側)



体育館(アリーナ)



武道館



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月29日現在

事務事業名	橋りょう再整備事業	所属 (支所)	建設部土木課 (建設課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	昭和55年以前に架設された橋りょう		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
昭和55年以前の橋りょうについては明確な耐震基準が適用されておらず、阪神大震災ではこれらの橋梁が重大な被害を受けている。新潟中越地震では、耐震補強された橋梁については甚大な被害が報告されておらず、橋梁の耐震補強の重要性が示された。橋りょうの再整備を行い、大規模地震等の災害に強いまちを構築する。	現行の耐震基準に適合するように既存橋梁の耐震補強を図るとともに、老朽化した橋梁の更新を行う。	架設年次が昭和55年以前で橋長15m以上の橋りょう数 227橋	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
烏川橋詳細設計	烏川橋架替工事 豊岡陸橋詳細設計 浜尻陸橋補修工事	烏川橋架替工事 豊岡陸橋耐震補強工事	烏川橋架替工事 豊岡陸橋耐震補強工事 浜尻陸橋補修工事	烏川橋架替工事 豊岡陸橋耐震補強工事 浜尻陸橋補修工事

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	30,000	22,355	烏川橋 測量設計(詳細)業務委託 地元説明会 河川占用手続き等関係部署の協議
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	30,000	22,355	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	10,700	—	烏川橋 河川占用等許可申請 用地取得及び物件補償等 地元説明会
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	10,700	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	烏川橋 仮設道路設置(右岸) 仮設橋台・橋脚設置
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

計画概要図

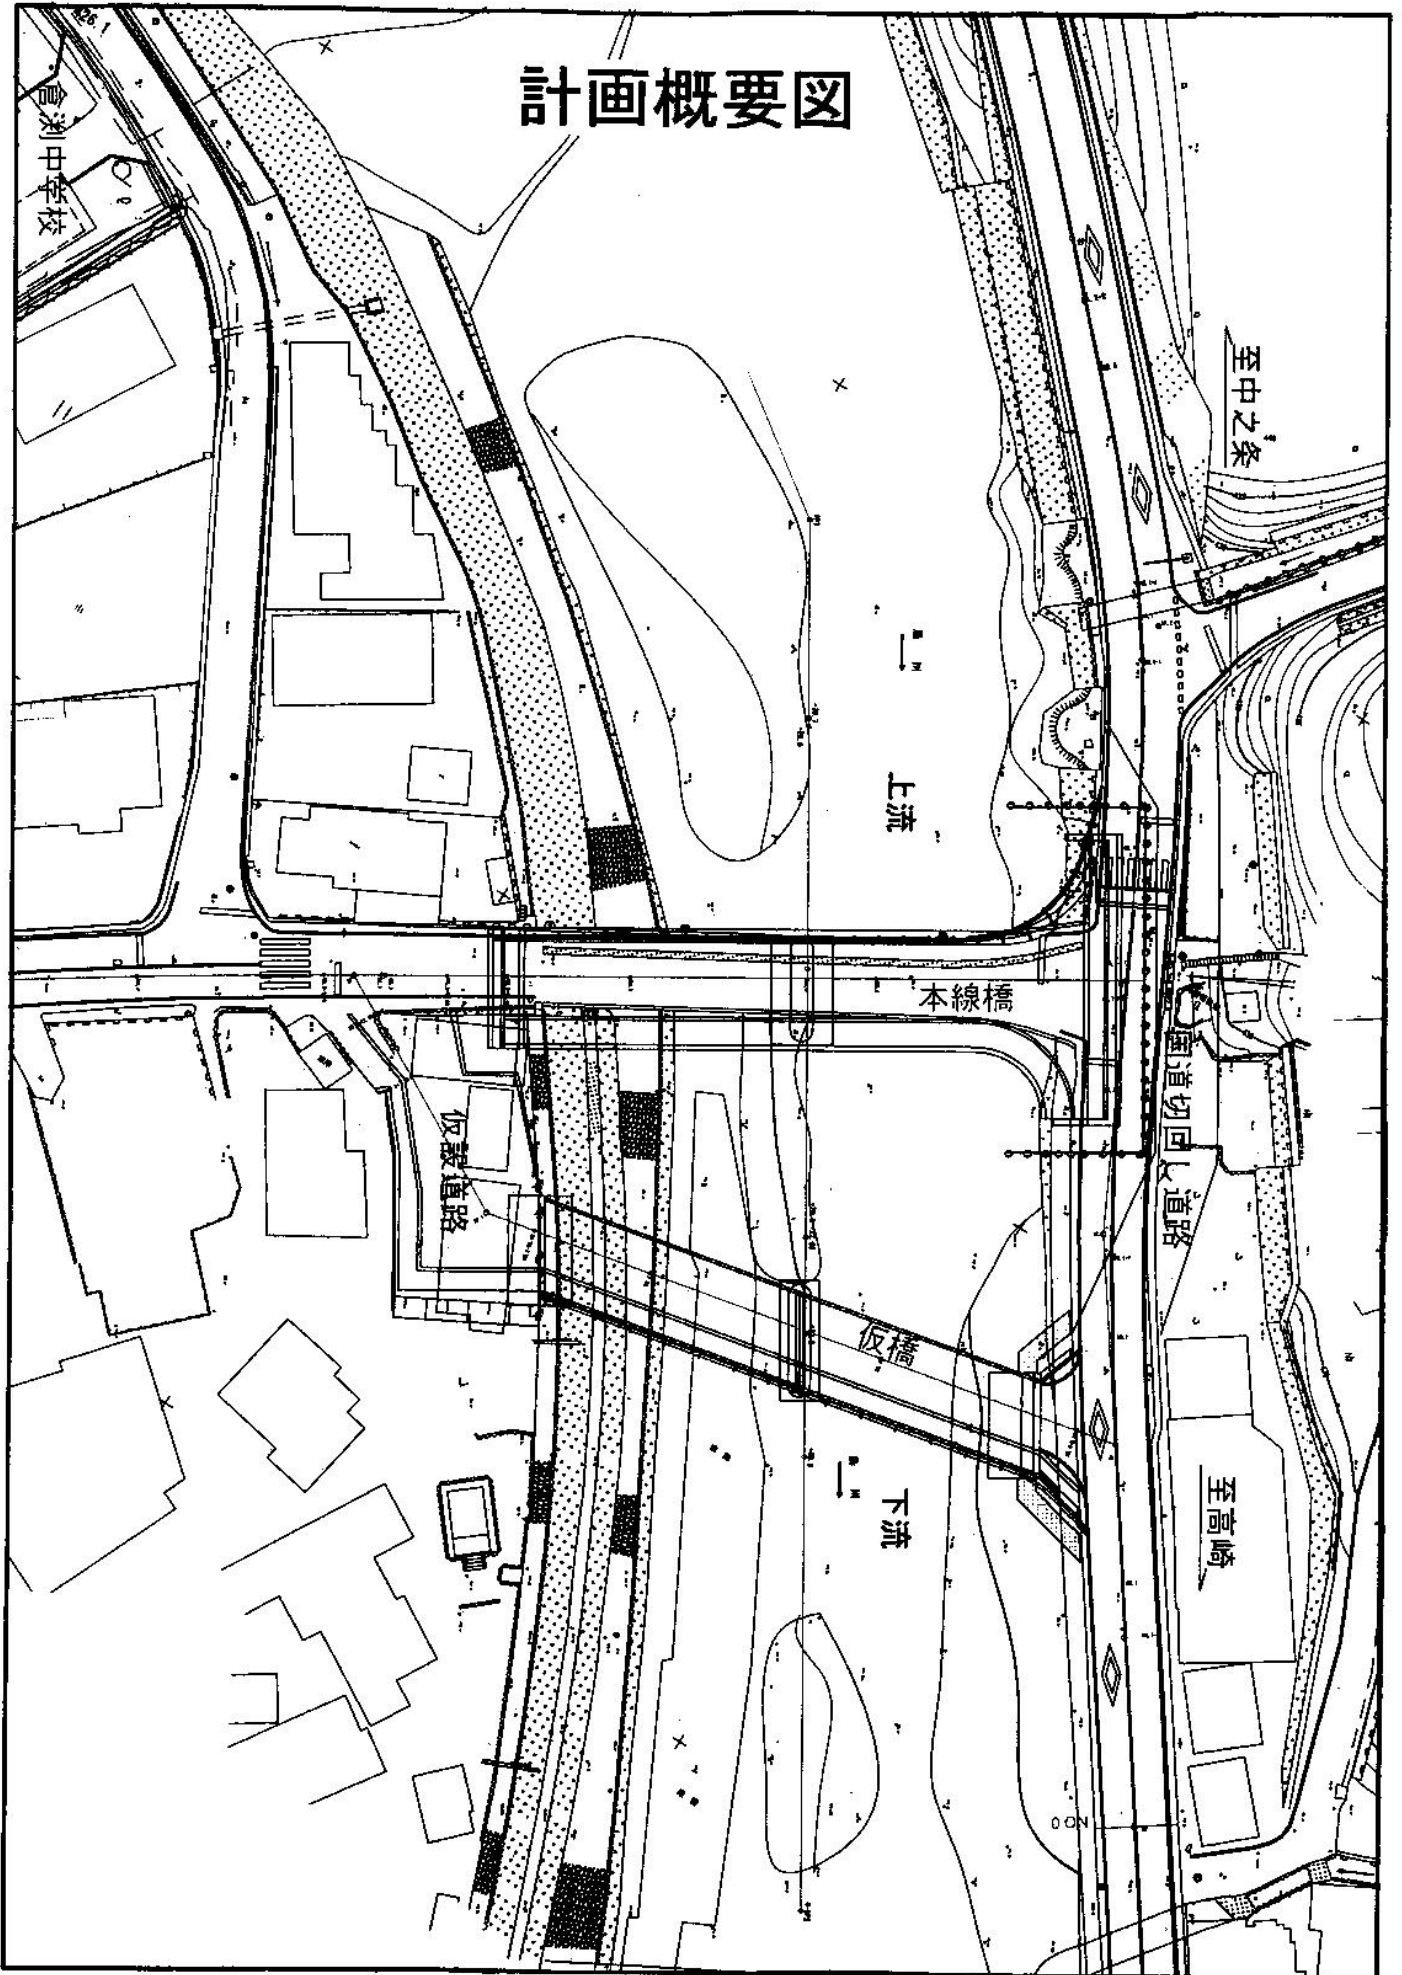

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月29日現在

事務事業名	倉渚地域ふるさと住宅等整備事業	所属 (支所)	建設部建築住宅課 (建設課)
実施期間	平成20年度～平成21年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	倉渚地域ふるさと住宅		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
倉渚地域における子育て世代などの定住促進を図るため、地域の実情や入居希望者のニーズにあった住宅の整備を行い、安全で快適な住宅環境づくりを推進する。	戸建型住宅の建設とこれに伴う道路を整備する。	平成20年度 用地取得・設計・積算・戸建住宅木造6棟6戸 平成21年度 戸建住宅木造6棟6戸	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
用地取得 8,773 m ² 設計積算 造成工事 戸建型住宅建設6戸 (過疎債)	設計積算 戸建型住宅建設6戸 (過疎債)			


【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	190,530	183,609	用地取得 8,773 m ² 住宅設計積算 造成工事 4,980 m ² (道路 777 m ² 住宅 12区画等 4,203 m ²) 戸建型住宅建設6戸(木造平屋建 79.5 m ² /戸)
国	—	5,749	
県	—	—	
地方債	122,200	111,700	
その他	—	—	
一般	68,330	66,160	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	109,771	—	戸建型住宅建設6戸(木造平屋建 79.5 m ² /戸) 外構工事(フェンス設置・敷砂利等)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	81,800	—	
その他	—	—	
一般	27,971	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

上原ふるさと住宅

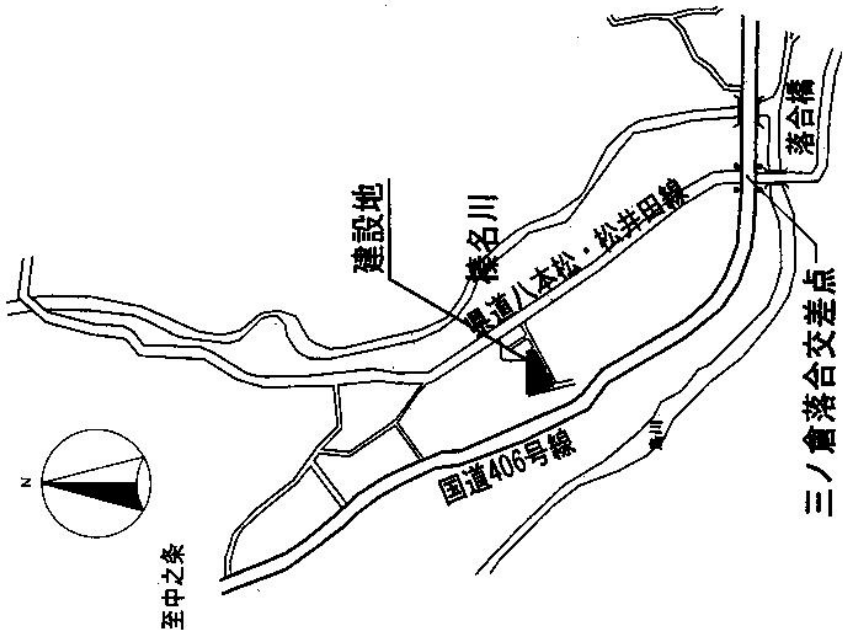

案内図

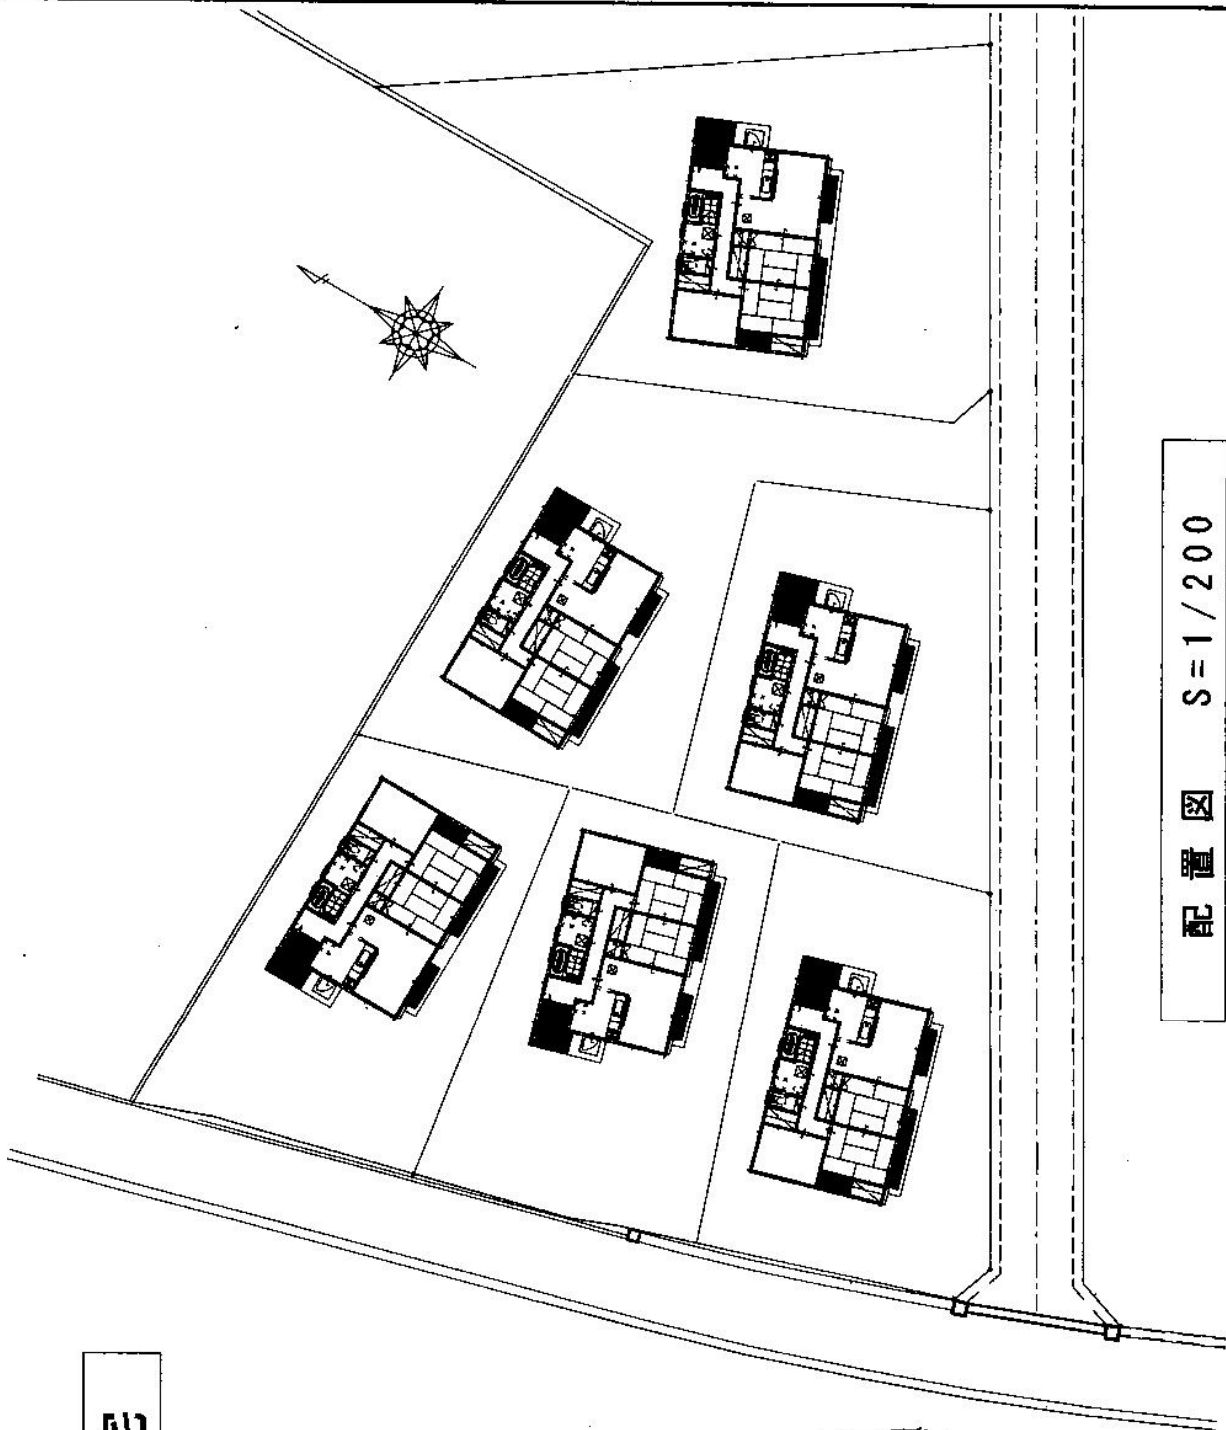

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 1 年 9 月 2 9 日現在

事務事業名	簡易水道整備事業	所属 (支所)	水道局経営企画課 (建設課)
実施期間	平成 18 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	簡易水道		
実施目的(どういった状態に)	簡易水道施設の整備及び維持管理を行う。	その他(全体計画等)	
簡易水道の安定供給を図る。		【簡易水道事業等】 倉渚支所管内8事業、箕郷支所管内3事業、榛名支所管内8事業	


【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査	施設の整備、維持管理、水質検査

【年度別推進状況】


区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20 年度 事業実績
合計	161,908	150,425	■施設整備7施設、維持管理・水質検査19施設 施設整備 中部簡易水道 相間増圧ポンプ場受水槽更新工事(1基) 三ノ倉簡易水道 配水管布設工事(L=250m) 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事(L=1,010m) 川浦小水道 配管図作成・配水流量計設置(φ50mm) 維持管理・水質検査 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	95,784	86,815	
一般	66,124	63,610	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21 年度 事業内容
合計	169,557	—	■施設整備6施設、維持管理・水質検査18施設 施設整備 中部簡易水道 配水管布設替工事((L=883m) 三ノ倉簡易水道 第3配水池設備工事(滅菌機・残塩計・水位計) 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事(L=1,435m) 維持管理・水質検査 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	5,125	—	
地方債	—	—	
その他	95,132	—	
一般	69,300	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22 年度 事業計画
合計	—	—	■施設整備、維持管理・水質検査18施設 施設整備 中部簡易水道 配水管布設替工事 三ノ倉簡易水道 配水管布設替工事 相満簡易水道 導水管・配水管布設替工事 維持管理・水質検査 簡易水道(中部・三ノ倉・川浦・相満) 小水道(川浦・西ヶ渚・小倉・水沼)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

案内図 平成21年度 中部簡易水道 配水管布設工事 (簡水第4工区) 高崎市倉渕町権田地内 縮尺 FREE

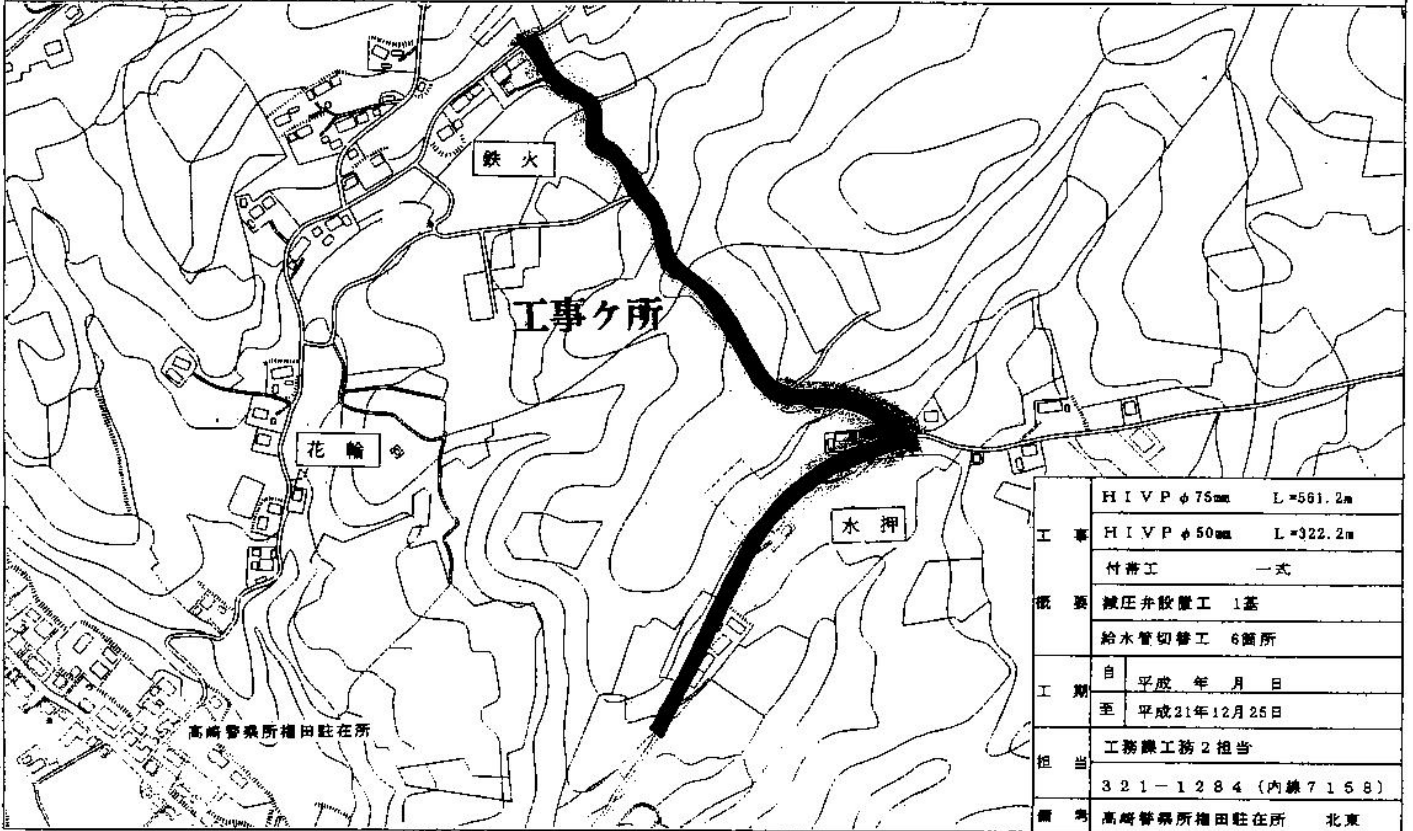


工事	H I V P φ75mm L=561.2m
	H I V P φ50mm L=322.2m
概要	付帯工 一式
	減圧弁設置工 1基
工期	給水管切替工 6箇所
	自 平成 年 月 日
担当	至 平成21年12月25日
	工務課工務2担当
備考	321-1284 (内線7158)
	高崎警察所権田駐在所 北東

三ノ倉簡易水道第3配水池設備工事 (簡水第1工区) 高崎市 倉渕町三ノ倉 地内 縮尺

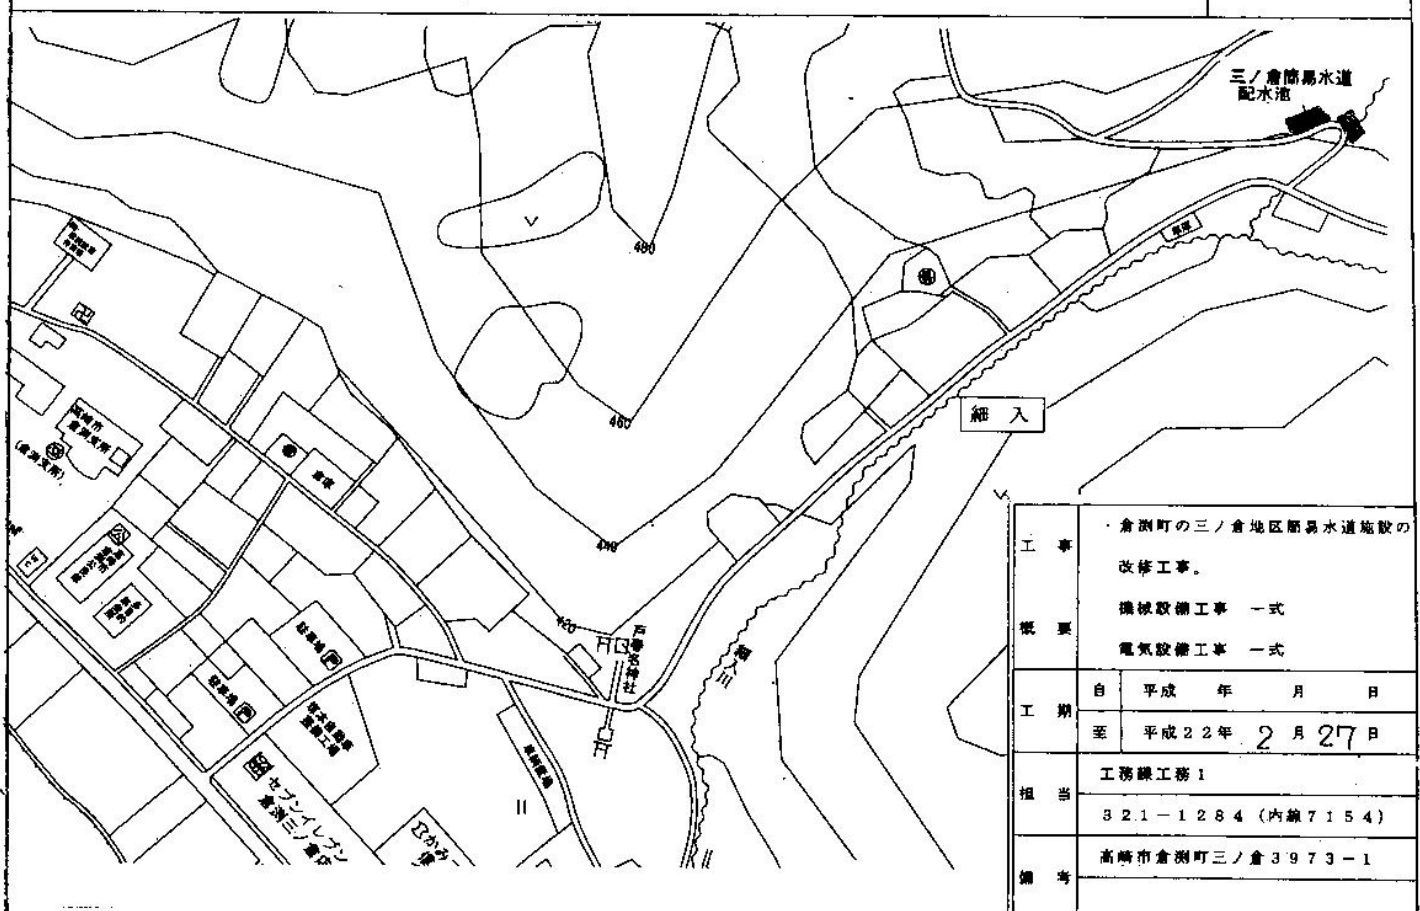


工事	倉渕町の三ノ倉地区簡易水道施設の改修工事。
	機械設備工事 一式
概要	電気設備工事 一式
	自 平成 年 月 日
工期	至 平成22年 2月27日
	工務課工務1
担当	321-1284 (内線7154)
	高崎市倉渕町三ノ倉3973-1
備考	

案内図 平成21年度 相満簡易水道 導水管布設替工事 (簡水第2工区) 高崎市 倉渕町権田 地内

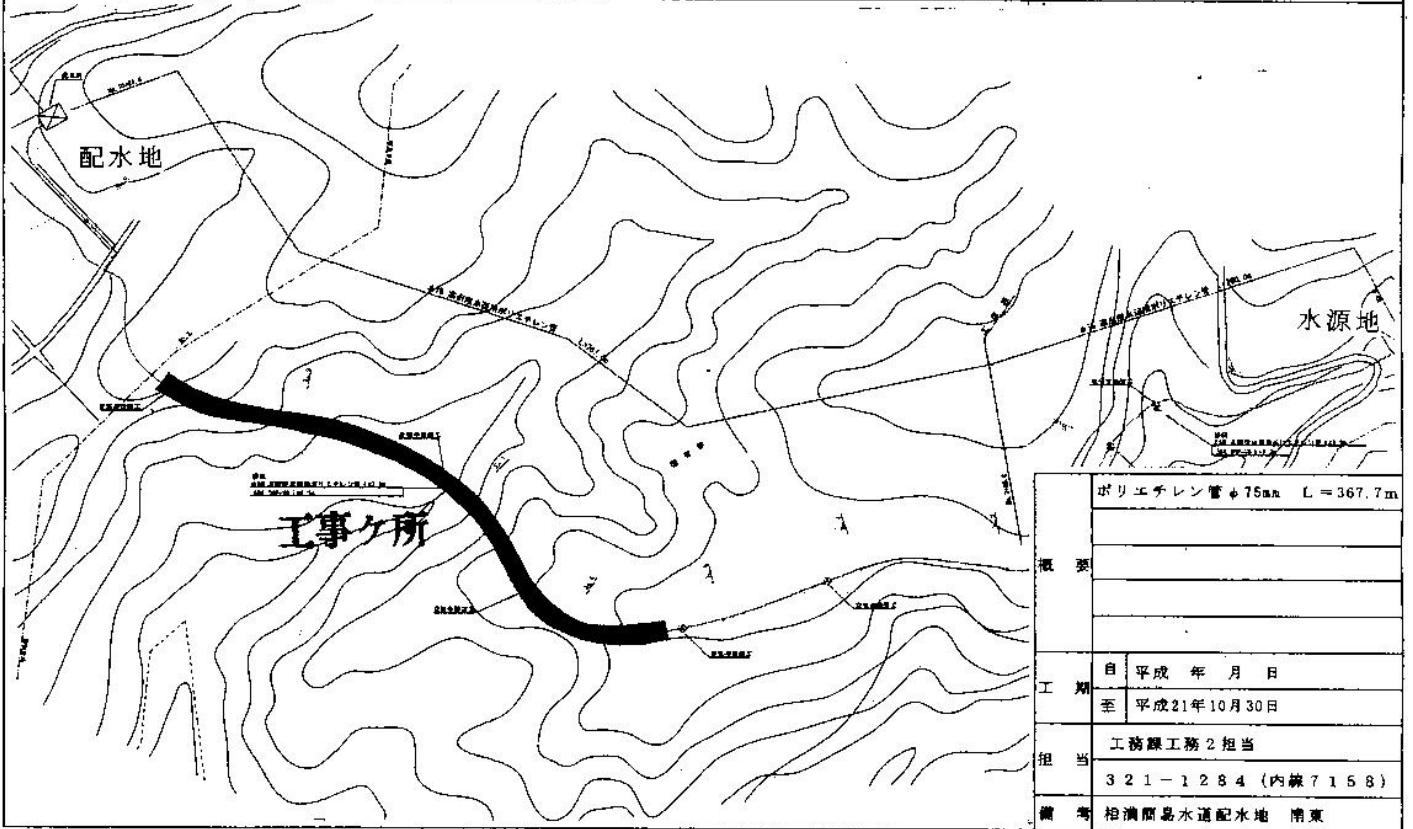

案内図 平成21年度 相満簡易水道 配水管布設替工事 (簡水第3工区) 高崎市 倉渕町権田 地内 縮尺1/6000

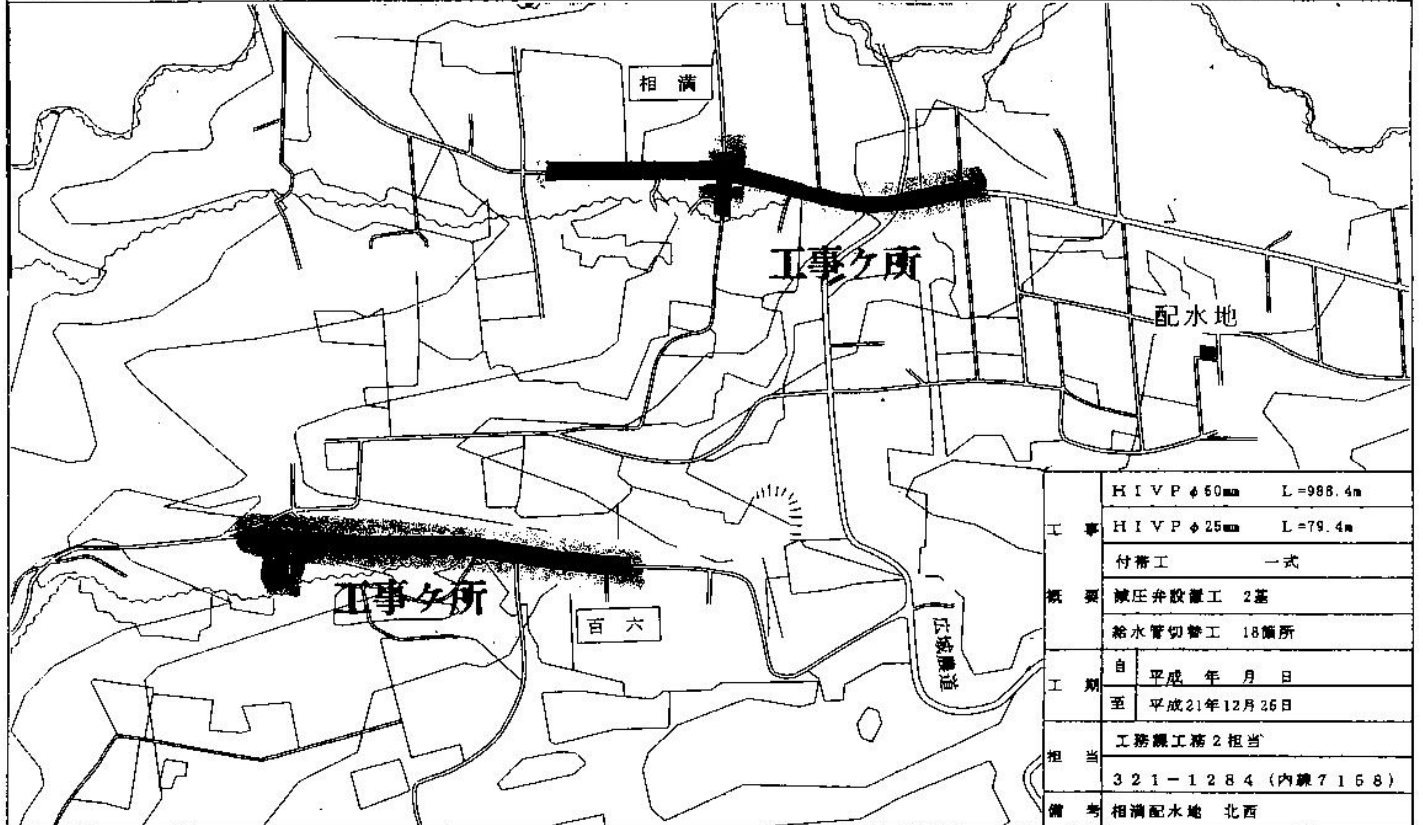

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年9月29日現在

事務事業名	小栗の里整備事業	所属 (支所)	地域振興部地域づくり推進課 (倉渚支所地域振興課)
実施期間	平成18年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民、観光客		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
地域の活性化を図るため、市民や観光客が、憩い楽しめる倉渚地域の情報発信基地の要素をもった拠点施設を整備する。	倉渚地域の自然や観光、小栗上野介の歴史遺産などを活用した施設整備を行なう。	平成18・19年度に委員会の開催、19年度に委員会の開催と基本構想を策定、20年度に基本計画の策定、21年度に基本設計、用地買収、22年度に施設整備、関連施設整備。 平成18年度からの全体事業費 680,946千円、平成21年度までの進捗率1%	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
基本計画の作成	基本設計 実施設計(3,000万円) 用地買収(5,000万円)	施設整備 (55,000万円) 関連史跡整備 (5,000万円)		

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	417	601	<ul style="list-style-type: none"> ■小栗の里整備基本計画策定 ■小栗の里整備基本計画策定連絡会議の開催 委員：庁内関係部課長 22人 開催回数3回 ■小栗の里整備基本計画策定連絡会議専門部会の開催 委員：庁内関係課担当係長 18名 開催回数4回 ■小栗の里物販施設等の意見を聴く会(17団体22名) 開催回数1回
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	417	601	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	5,608	—	<ul style="list-style-type: none"> ■高崎市小栗の里整備事業「道の駅」事例調査業務委託 契約金額 472,000円 委託期間 平成21年7月6日～8月24日 ■高崎市小栗の里整備事業「道の駅」基本方針提案業務委託 契約金額 493,500円 委託期間 平成21年7月10日～8月24日 ■高崎市小栗の里整備基本計画詳細検討業務委託 予算限度額:4,000,000円 委託期間 平成21年11月1日～3月1日 委託内容:倉渚支所周辺施設のコンバージョン基本計画、施設の管理運営方法等 契約の相手方の選定方法:指名型プロポーザル方式 第1回選考委員会 平成21年9月24日、第2回選考委員会 平成21年10月27日 ■推進体制の整備 庁内体制:小栗の里整備事業庁内推進連絡会議、倉渚支所周辺施設利活用検討会議の設置 市民参加型会議:小栗の里拠点施設建設懇話会、物販関係ワーキンググループの設置
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	5,608	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ■拠点施設の基本設計及び実施設計 ■小栗の里拠点施設建設懇話会及び小栗の里整備事業庁内推進連絡会議等の運営
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

小栗の里基本計画詳細検討及び推進体制イメージ図

