

平成 23 年度 第 1 回 高崎市箕郷地域審議会

第 5 次総合計画前期実施計画
事業推進状況報告書

箕郷地域観光施設整備事業	...	1 P ~ 2 P
榛名南麓広域営農団地農道整備事業	...	3 P ~ 6 P
自校方式給食拡充事業	...	7 P ~ 9 P
箕輪城跡保存整備事業	...	10 P ~ 13 P
上水道管網整備事業	...	14 P ~ 15 P
污水管渠整備事業	...	16 P ~ 17 P

平成 23 年 7 月 11 日

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	みさと芝桜公園		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜公園にライトアップ照明整備を行うことにより、営業時間の延長を図り入園者の増加を推進する。 また、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体	6.5 ha
		・芝桜	2.9 ha
		・花園ゾーン	1.2 ha
		・林間ゾーン	0.6 ha
		・駐車場ほか	1.8 ha

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度		
芝桜公園整備運営 計画策定 芝桜公園運営管理	芝桜公園運営管理	芝桜公園用地取得 トイレ設置工事 芝桜公園運営管理		

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	49,454	45,664	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園整備運営計画策定
県	5,702	5,702	芝桜公園運営事業 45,663,446円
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	30,821	19,005	芝桜管理委託業務
一般	12,931	20,957	芝桜保全委託業務
			園内整備事業
			・芝桜まつり実施
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	53,612	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園エントラス・歩道舗装工事
県	5,857	—	芝桜公園運営事業
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	29,980	—	・芝桜まつり関係業務
一般	17,775	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園用地取得
県	—	—	・トイレ設置工事
地方債	—	—	芝桜公園運営事業
その他	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
一般	—	—	・芝桜まつり関係業務

平成23年4月24日 満開の芝桜公園



平成23年4月17日 賑わう売店



平成22年10月8日 補植作業



平成22年9月17日 除草ボランティア



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	榛名南麓広域営農団地農道整備事業	所属 (支所)	農政部 田園整備課 (箕郷支所 建設課)
実施期間	平成19年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名南麓広域農道		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名南麓(箕郷～榛名)における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業について、市が10%負担する。 国50% 県40% 市10%(起債90%)	Ⅱ期工事 進捗率 58% (平成22年度末)	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
箕郷地区 道路工 橋梁工 上部・下部 榛名地区 用地測量委託	箕郷地区 橋梁上部工 道路工 榛名地区 用地買収・道路工	榛名地区 用地買収補償 道路工 橋梁工	



【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	47,259	66,600	<事業費 666,000千円 負担金66,600千円>
国	—	—	・用地買収補償費
県	—	—	・道路工 (改良工事)
地方債	42,525	59,940	・橋梁工 下部工(橋台2基・橋脚4基) 上部工
その他	—	—	
一般	4,725	6,660	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	38,000	—	<事業費 380,000千円 負担金 38,000千円>
国	—	—	・道路工 (上層路盤工・表層工)
県	—	—	・橋梁工 上部工
地方債	34,200	—	
その他	—	—	
一般	3,800	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	・用地買収補償
国	—	—	・道路工
県	—	—	・橋梁工
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	




案内図

榛名南麓広域営農団地農道整備事業
〔フルーツライン〕

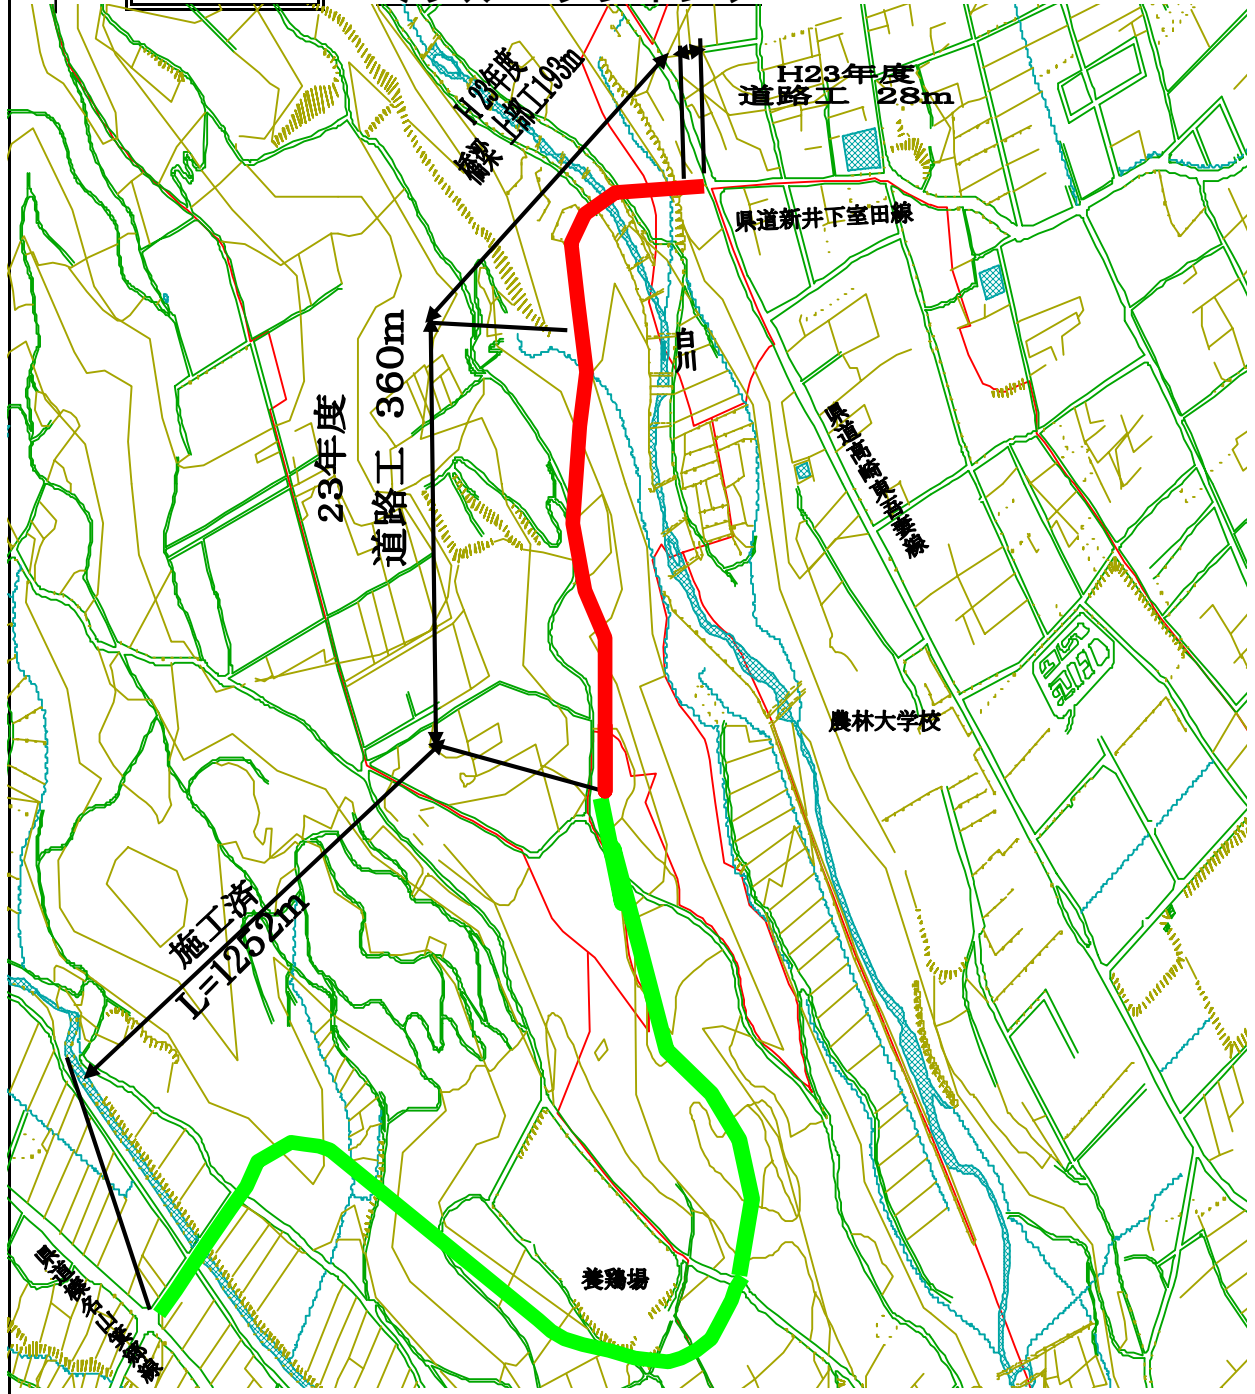

標準部

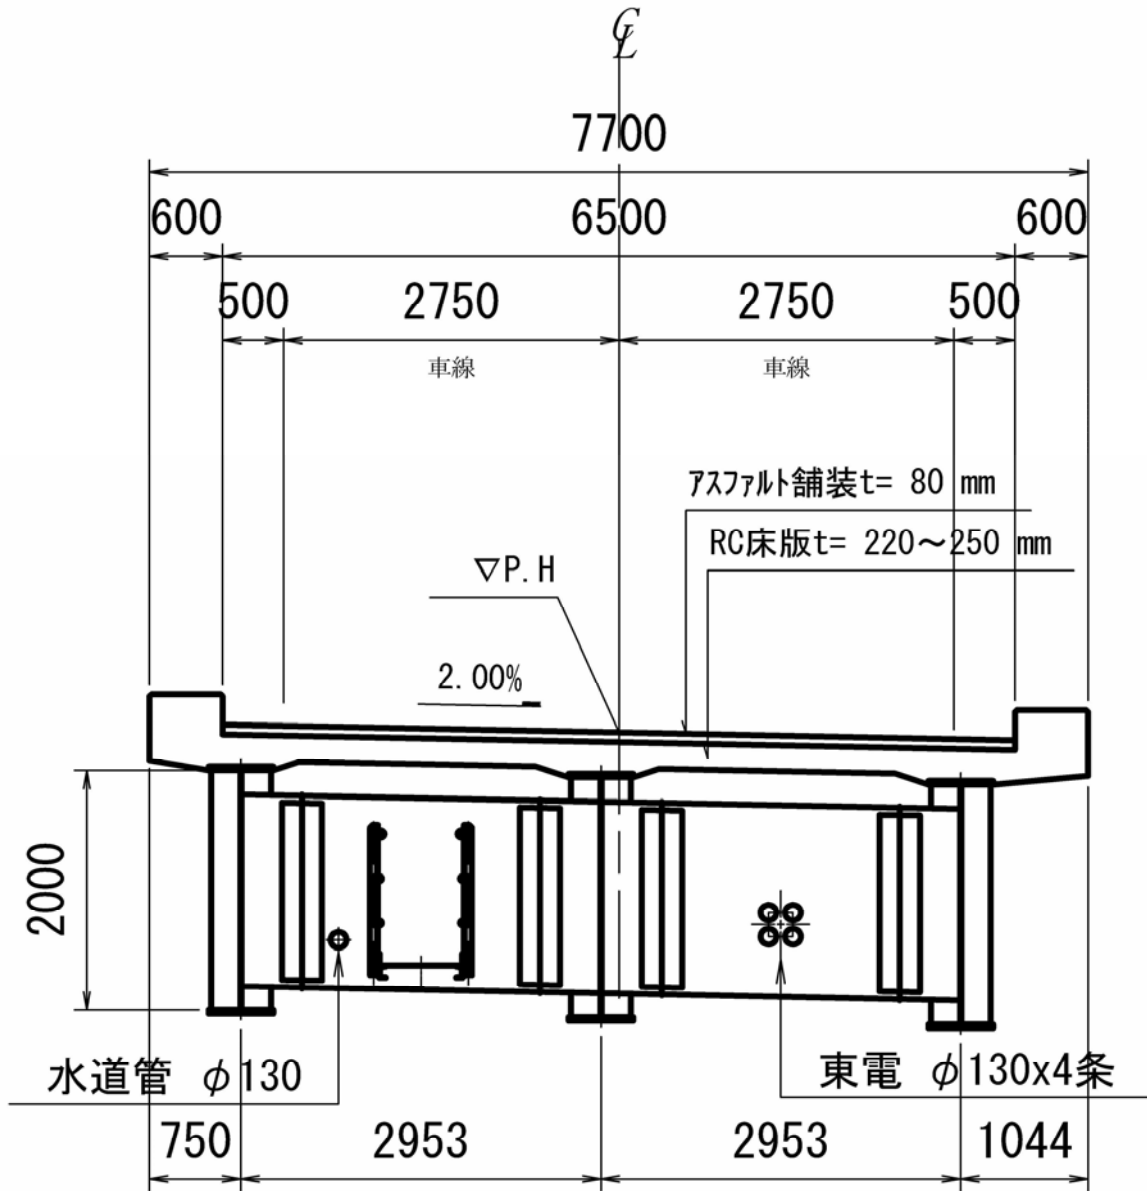

榛名南麓広域営農団地農道整備事業(フルーツライン)

● 橋脚部全景



(榛名白川東側)

平成22年度末 施工状況

(橋脚 4基)



(榛名白川西側)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	給食室、学校給食センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から、自校方式給食制度を取り入れていく。 また、自校方式への移行に伴い、老朽化した学校給食センターについては、施設を廃止する。	各校に給食室を新設する。 また、役目を終えた給食センターについては、随時解体していく。	学校給食センターの老朽化を考慮し、センターが古い地域の順に整備することを基本とし、校舎改築等に織り交ぜて実施する。	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
新設 ・下里見小学校(増築) ・下室田小学校(増築)	新設 ・箕郷中学校(増築) ・群馬中央中学校(増築) 解体 ・榛名学校給食センター	新設 ・新町中学校(増築) ・新町第二小学校(増築)	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	35,087	未定	21年度繰越事業: 地域活性化・きめ細かな臨時交付金を利用 (繰越予算額 420,000 千円) ・下里見小学校 給食室増築完成 23年4月より稼働 ・下室田小学校 給食室増築完成 23年4月より稼働
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	35,087	未定	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	396,360	—	・箕郷中学校 給食室増築 年度内完成予定 24年4月より稼働予定 ・群馬中央中学校 給食室増築 年度内完成予定 24年4月より稼働予定
国	22,490	—	
県	—	—	
地方債	305,800	—	
その他	—	—	
一般	68,070	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	・新町中学校 給食室増築 ・新町第二小学校 給食室増築
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

箕郷中学校給食室平面図

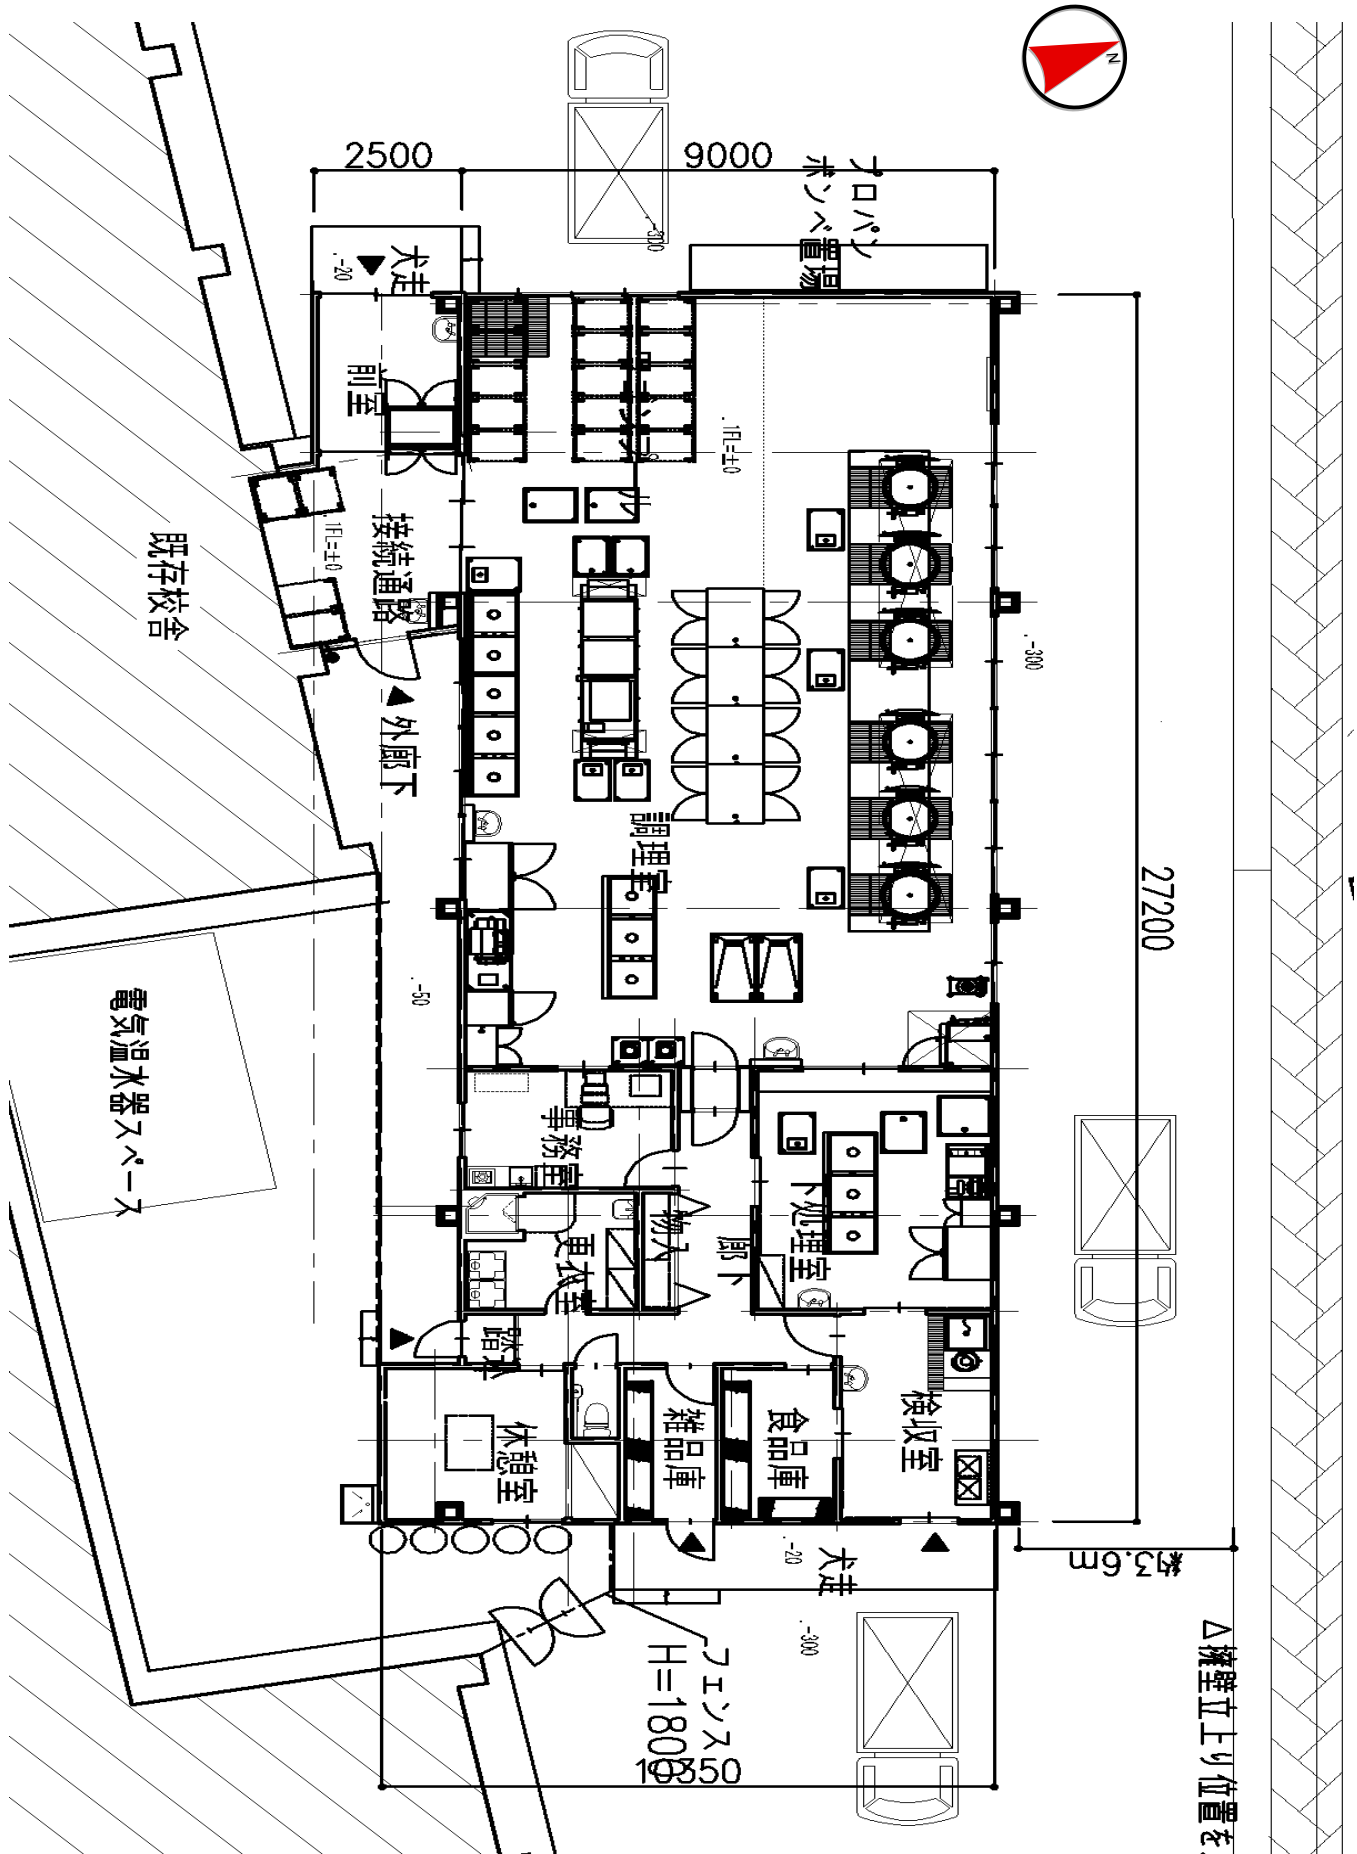

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
国指定史跡箕輪城跡(昭和62年12月17日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。 史跡指定面積約19ha	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告書刊行 平成22年度基本設計 平成22年度までの事業進捗率 12%

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(史跡全体) ・実施設計(樹木伐採) ・保存整備委員会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(園路・施設・防空壕埋戻し等) ・整備工事(樹木伐採) ・保存整備委員会 	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・整備工事(樹木伐採・設備・園路・防空壕埋戻し) ・保存整備委員会 	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	11,512	9,040	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(史跡全体) ・科学的調査(防空壕探査業務委託・ボーリング業務委託) ・実施設計(樹木伐採) ・保存整備委員会開催
国	2,500	2,500	
県	750	750	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	8,262	5,790	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	27,641	—	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(園路・付帯施設・防空壕埋戻し等) ・整備工事(樹木伐採) ・保存整備委員会開催
国	7,000	—	
県	2,100	—	
地方債	0	—	
その他	0	—	
一般	18,541	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(御前曲輪・郭馬出) ・整備工事(樹木伐採・防空壕埋戻し・園路・付帯施設等) ・保存整備委員会開催
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

短期計画 第1期の位置は下図のとおりである。

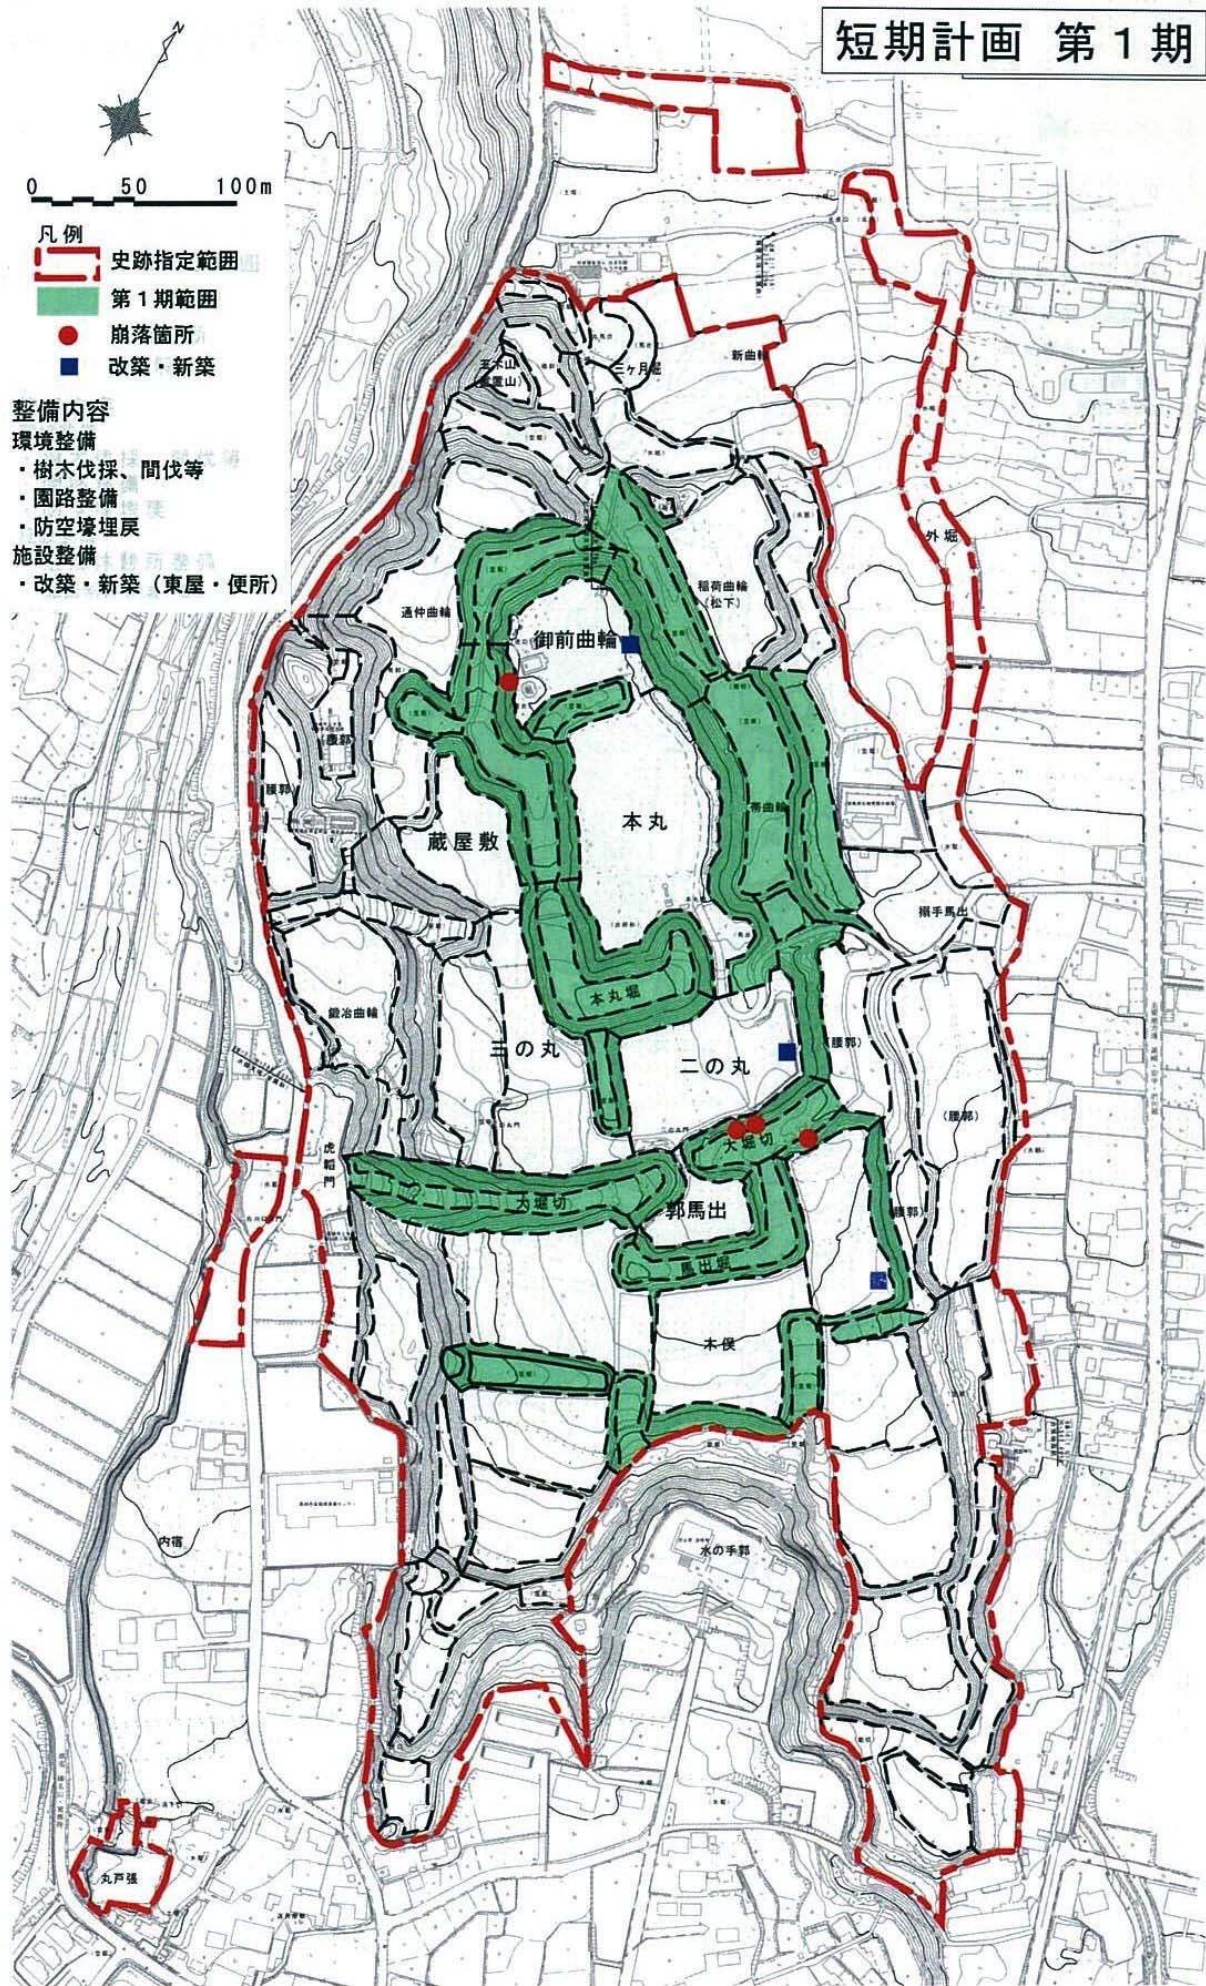


図 71 短期計画 1 期位置図

箕輪城跡平面図



伐採順序

■ 平成23年度

■ 平成24年度

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	上 道管 整備事業	所属 (支所)	道 工務課 (箕郷上下 道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配 管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
率的で に い給 体制を する。	箕郷地域内の セ ント管等の 設 えを行う。	箕郷地域の セ ント管 存延長 (平成22年度末 5,687)	






【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
セ ント管等の 設 1,700	セ ント管等の 設 1,500	セ ント管等の 設 1,400	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 実 績
合計	86,291	81,404	管 整備事業 ・舗装復 工事 1,655.2 ・配 管 設 工事 606.8 ・配 管 設 工事等 1,117.1
国	—	—	
県	—	—	
地方債	41,800	37,900	
その他	—	—	
一般	44,491	43,504	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 内 容
合計	85,500	—	管 整備事業 ・舗装復 工事 1,250.0 ・配 管 設 工事 192.0 ・配 管 設 工事 852.1
国	—	—	
県	—	—	
地方債	40,200	—	
その他	—	—	
一般	45,300	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	2 4 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	管 整備事業 き き、配 管 設()工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

上 道管 整備事業

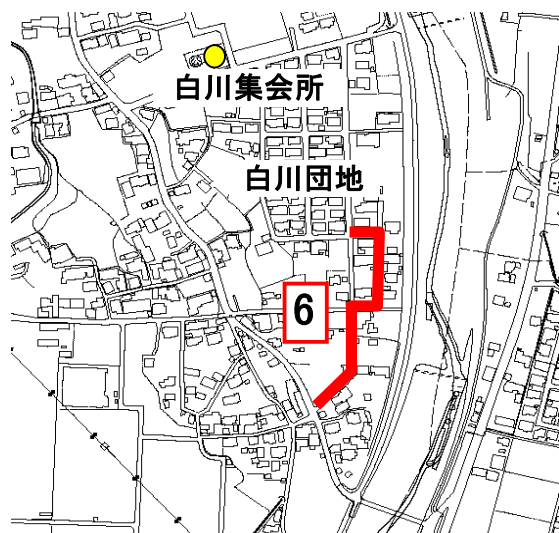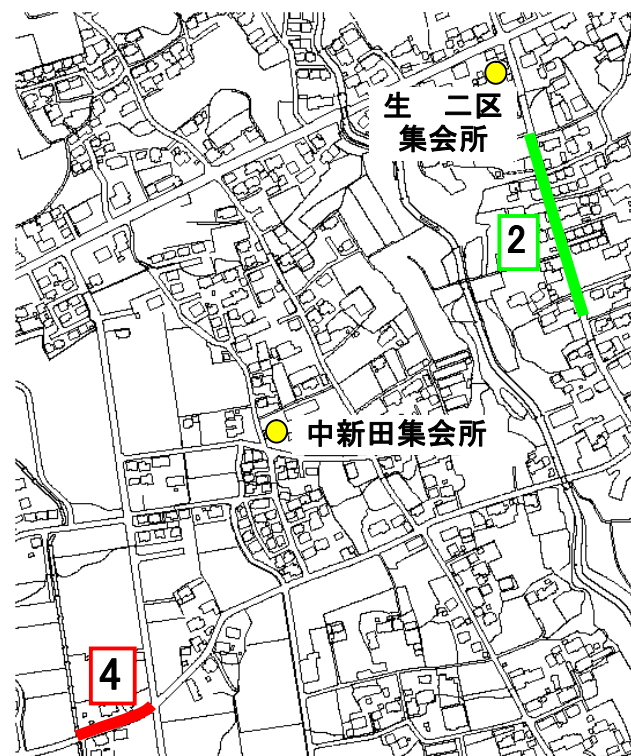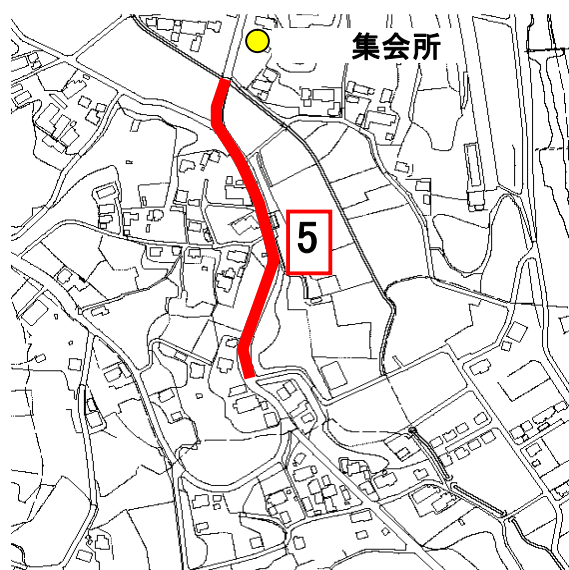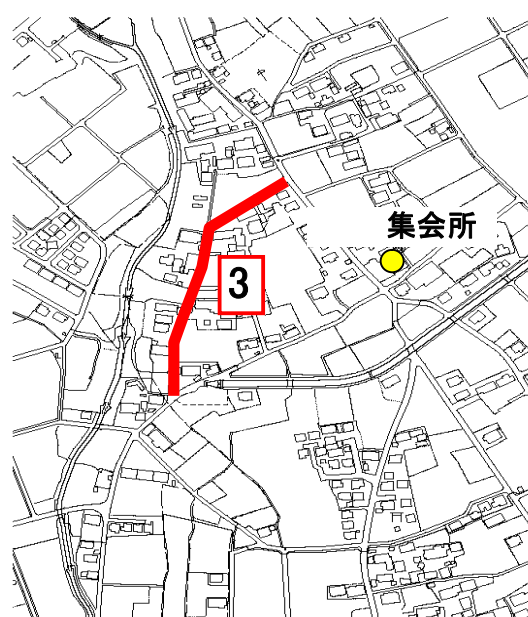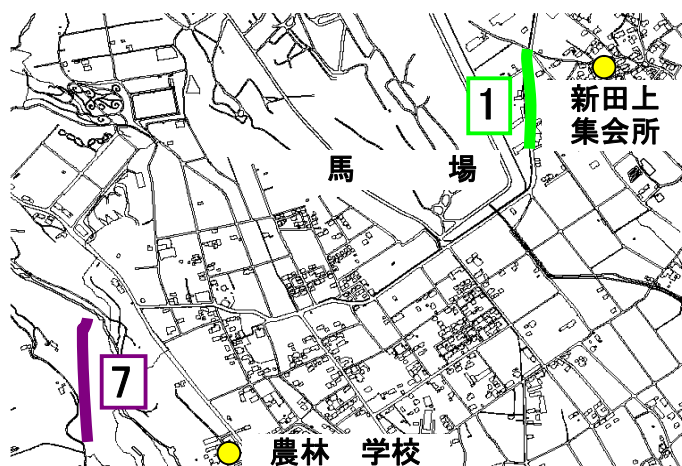

	1	・舗装復	550
	2	生・舗装復	700
	3	・配管設	300
	4	生・配管設	110
	5	・配管設	192.1
	6	白川・配管設	250
	7	・管設	192
舗装復 工事			
配管設 工事			
管 設			

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 3月 31日現在

事務事業名	管 整備事業	所属 (支所)	下 道 整備課 (箕郷上下 道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
適な生活環境の 保と 川の 改善を図る。	計画的に下 道管 を整備する。	平成22年度末 整備面積 205 16ha 整備延長 41 25	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
下 道管 の整備 面積 4ha 延長 1, 841	下 道管 の整備 面積 4ha 延長 1, 841	下 道管 の整備 面積 4ha 延長 1, 841	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	103,931	73,177	実施計画に い、 次管 設工事を実施し、公共下 道の 及率 上に めた。 下 道築造工事施工 箕郷地域 1, 339 13
国	31,815	33,548	
県	0	800	
地方債	49,800	26,429	
その他	18,200	12,400	
一般	4,116	0	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	92,254	—	下 道築造工事発 予定 箕郷地域 管 設 688 5 舗装復 2, 040
国	37,530	—	
県	0	—	
地方債	27,300	—	
その他	12,000	—	
一般	15,424	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	下 道築造工事発 予定 箕郷地域 1, 841
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

管 整備事業

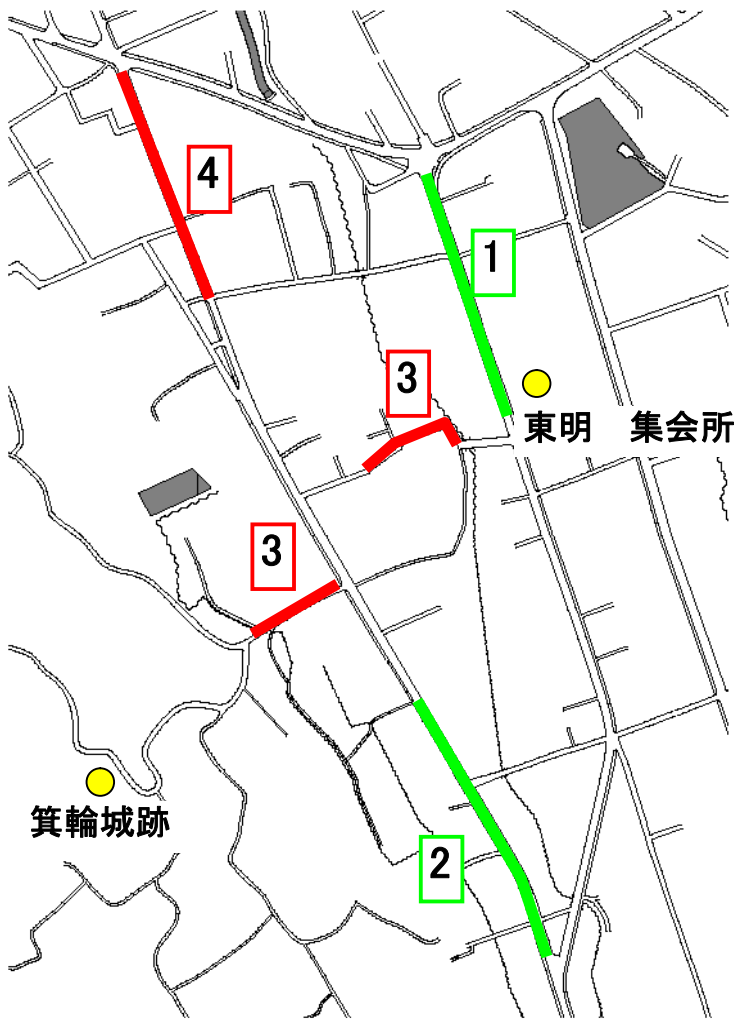

舗装復 工事	
管 設 工事	

1	東明・舗装復	690
2	東明・舗装復	1,350
3	東明・管 設	191.6
4	東明・管 設	161.9
5	下芝・管 設	335

