

群馬地域に関わる事業について

ページ	部門	事務事業名	担当課名 ()内は群馬支所担当課
1	教育・文化	堤ヶ岡第二小学校(仮称)整備事業	教育総務課 (群馬教育課)
2	教育・文化	保渡田古墳群保存整備事業	文化財保護課 (群馬教育課)
3	都市・建設	菅谷南線道路事業	都市施設課 (建設課)
4	健康・福祉	放課後児童健全育成事業	こども家庭課 (福祉課)

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成20年9月30日現在

ハード事業名	堤ヶ岡第二小学校（仮称）建設事業			実施地区	群馬地域	
実施期間	平成18年度～平成20年度		所管課名	教育部教育総務課		
新市建設（基本）計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容（P.40）						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
		用地取得 用地造成 設計 地質調査	校舎建設	校舎建設 プール建設 体育館建設 備品購入等	用地取得 H18 設計 H18 校舎建設 H19～20 プール等建設 H20	
実施計画額	合計（千円）		689,456	520,000	1,410,000	2,619,456
	財源	国庫支出金	0	203,705	407,975	611,680
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	541,500	267,700	560,800	1,370,000
		その他	140,000	0	298,000	438,000
	一般財源	7,956	48,595	143,225	199,776	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	689,456	582,826	用地取得 26,809.48 m ² 契約額 560,318,132 円（登記完了 H18.7.5） 測量 契約額 5,775,000 円（H18.6.9～H19.2.28） 埋蔵文化財発掘調査実施（文化財保護課） 地質調査 契約額 2,278,500 円（H18.11.28～H19.1.31） 校舎等新築設計 契約額 43,575,000 円（H18.9.16～H19.3.26 繰越予定）			
国	0	0				
県	0	0				
市債	541,500	532,300				
その他	140,000	41,000				
一般	7,956	9,526				
区分（千円）	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績			
合計	403,106	479,724	校舎・屋内運動場新築工事 契約額 1,413,300,000 円（H19.9.29～H21.1.30） 校舎・屋内運動場新築電気設備工事 契約額 173,250,000 円（H19.9.29～H21.1.30） 校舎・屋内運動場新築給排水衛生設備工事 契約額 87,150,000 円（H19.10.30～H21.1.30） 校舎・屋内運動場新築空調設備工事 契約額 107,100,000 円（H19.10.30～H21.1.30） 下水道工事実施（下水道局整備課） 負担金 22,521,225 円 《H18年度からの繰越分》 校舎等新築設計（繰越～H19.6.30） 造成工事（1期） 契約額 39,543,000 円（H19.4.28～H19.10.31） 造成工事（その2） 契約額 7,140,000 円（H19.11.27～H20.3.10） 造成工事（その3） 契約額 10,216,500 円（H19.11.27～H20.3.10）			
国	99,960	124,854				
県	0	0				
市債	251,100	217,700				
その他	37,000	37,000				
一般	15,046	100,170				
区分（千円）	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業内容			
合計	1,770,943	-	校舎・屋内運動場新築（電気設備、給排水衛生設備、空調設備）工事（継続～H21.1.30）			
国	334,205	-				
県	-	-	プール建設工事 契約額 85,575,000 円（H20.8.22～H21.2.27）			
市債	1,031,500	-	外構工事 契約額 100,590,000 円（H20.9.11～H21.3.13）			
その他	348,310	-	校庭整地工事、外周道路工事			
一般	56,928	-	備品購入			

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成20年9月30日現在

ハード事業名		菅谷南線道路事業			実施地区	群馬地域
実施期間		平成18年度～平成21年度			所管課名	都市整備部都市施設課
新市建設（基本）計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容(P.89)						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
		用地買収 物件移転補償 測量委託	用地買収 物件移転補償	用地買収 物件移転補償	総事業費： 269,000千円 延長：170m 幅員：17m	
実施計画額	合計（千円）		58,000	90,000	88,000	236,000
	財源	国庫支出金	31,900	49,500	48,400	129,800
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	24,700	38,400	37,600	100,700
		その他	0	0	0	0
	一般財源	1,400	2,100	2,000	5,500	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	58,000	32,706	関係者の立会いが済み、道路詳細設計完成。 事業用地買収実績 ・ 用地買収費 17,813,460円（10件） ・ 補償費 1,967,309円（4件）残地補償及び工作物移転補償			
国	31,900	17,875				
県	0	0				
市債	24,700	0				
その他	0	0				
一般	1,400	14,831				
区分（千円）	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績			
合計	96,709	180,113	平成19年7月31日契約済み （昨年12月末に建物・工作物解体済み） 文化財発掘調査			
国	52,250	99,000				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	44,459	81,113				
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算見込額	20年度事業内容			
合計	63,195		文化財発掘調査終了 道路築造工事（9/17入札予定）			
国	33,000					
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	30,195					

案内図

群馬一井出菅谷引間線
(都市計画道路3・4・64菅谷南線)

菅谷高畑土地区画整理事業

施工区間 L=197.70m

石塚古墳

正徳寺配水池

中興寺飛地

群馬一井出菅谷引間線(都市計画道路3・4・64菅谷南線)
道路築造工事

工事名

道路改良延長

L=197.7m
L=357.8m
39基

側溝工

L=353.2m

街渠併

A=1802.1m²


L型街渠

A=1012.1m²

車道舗装

歩道舗装


工事概要

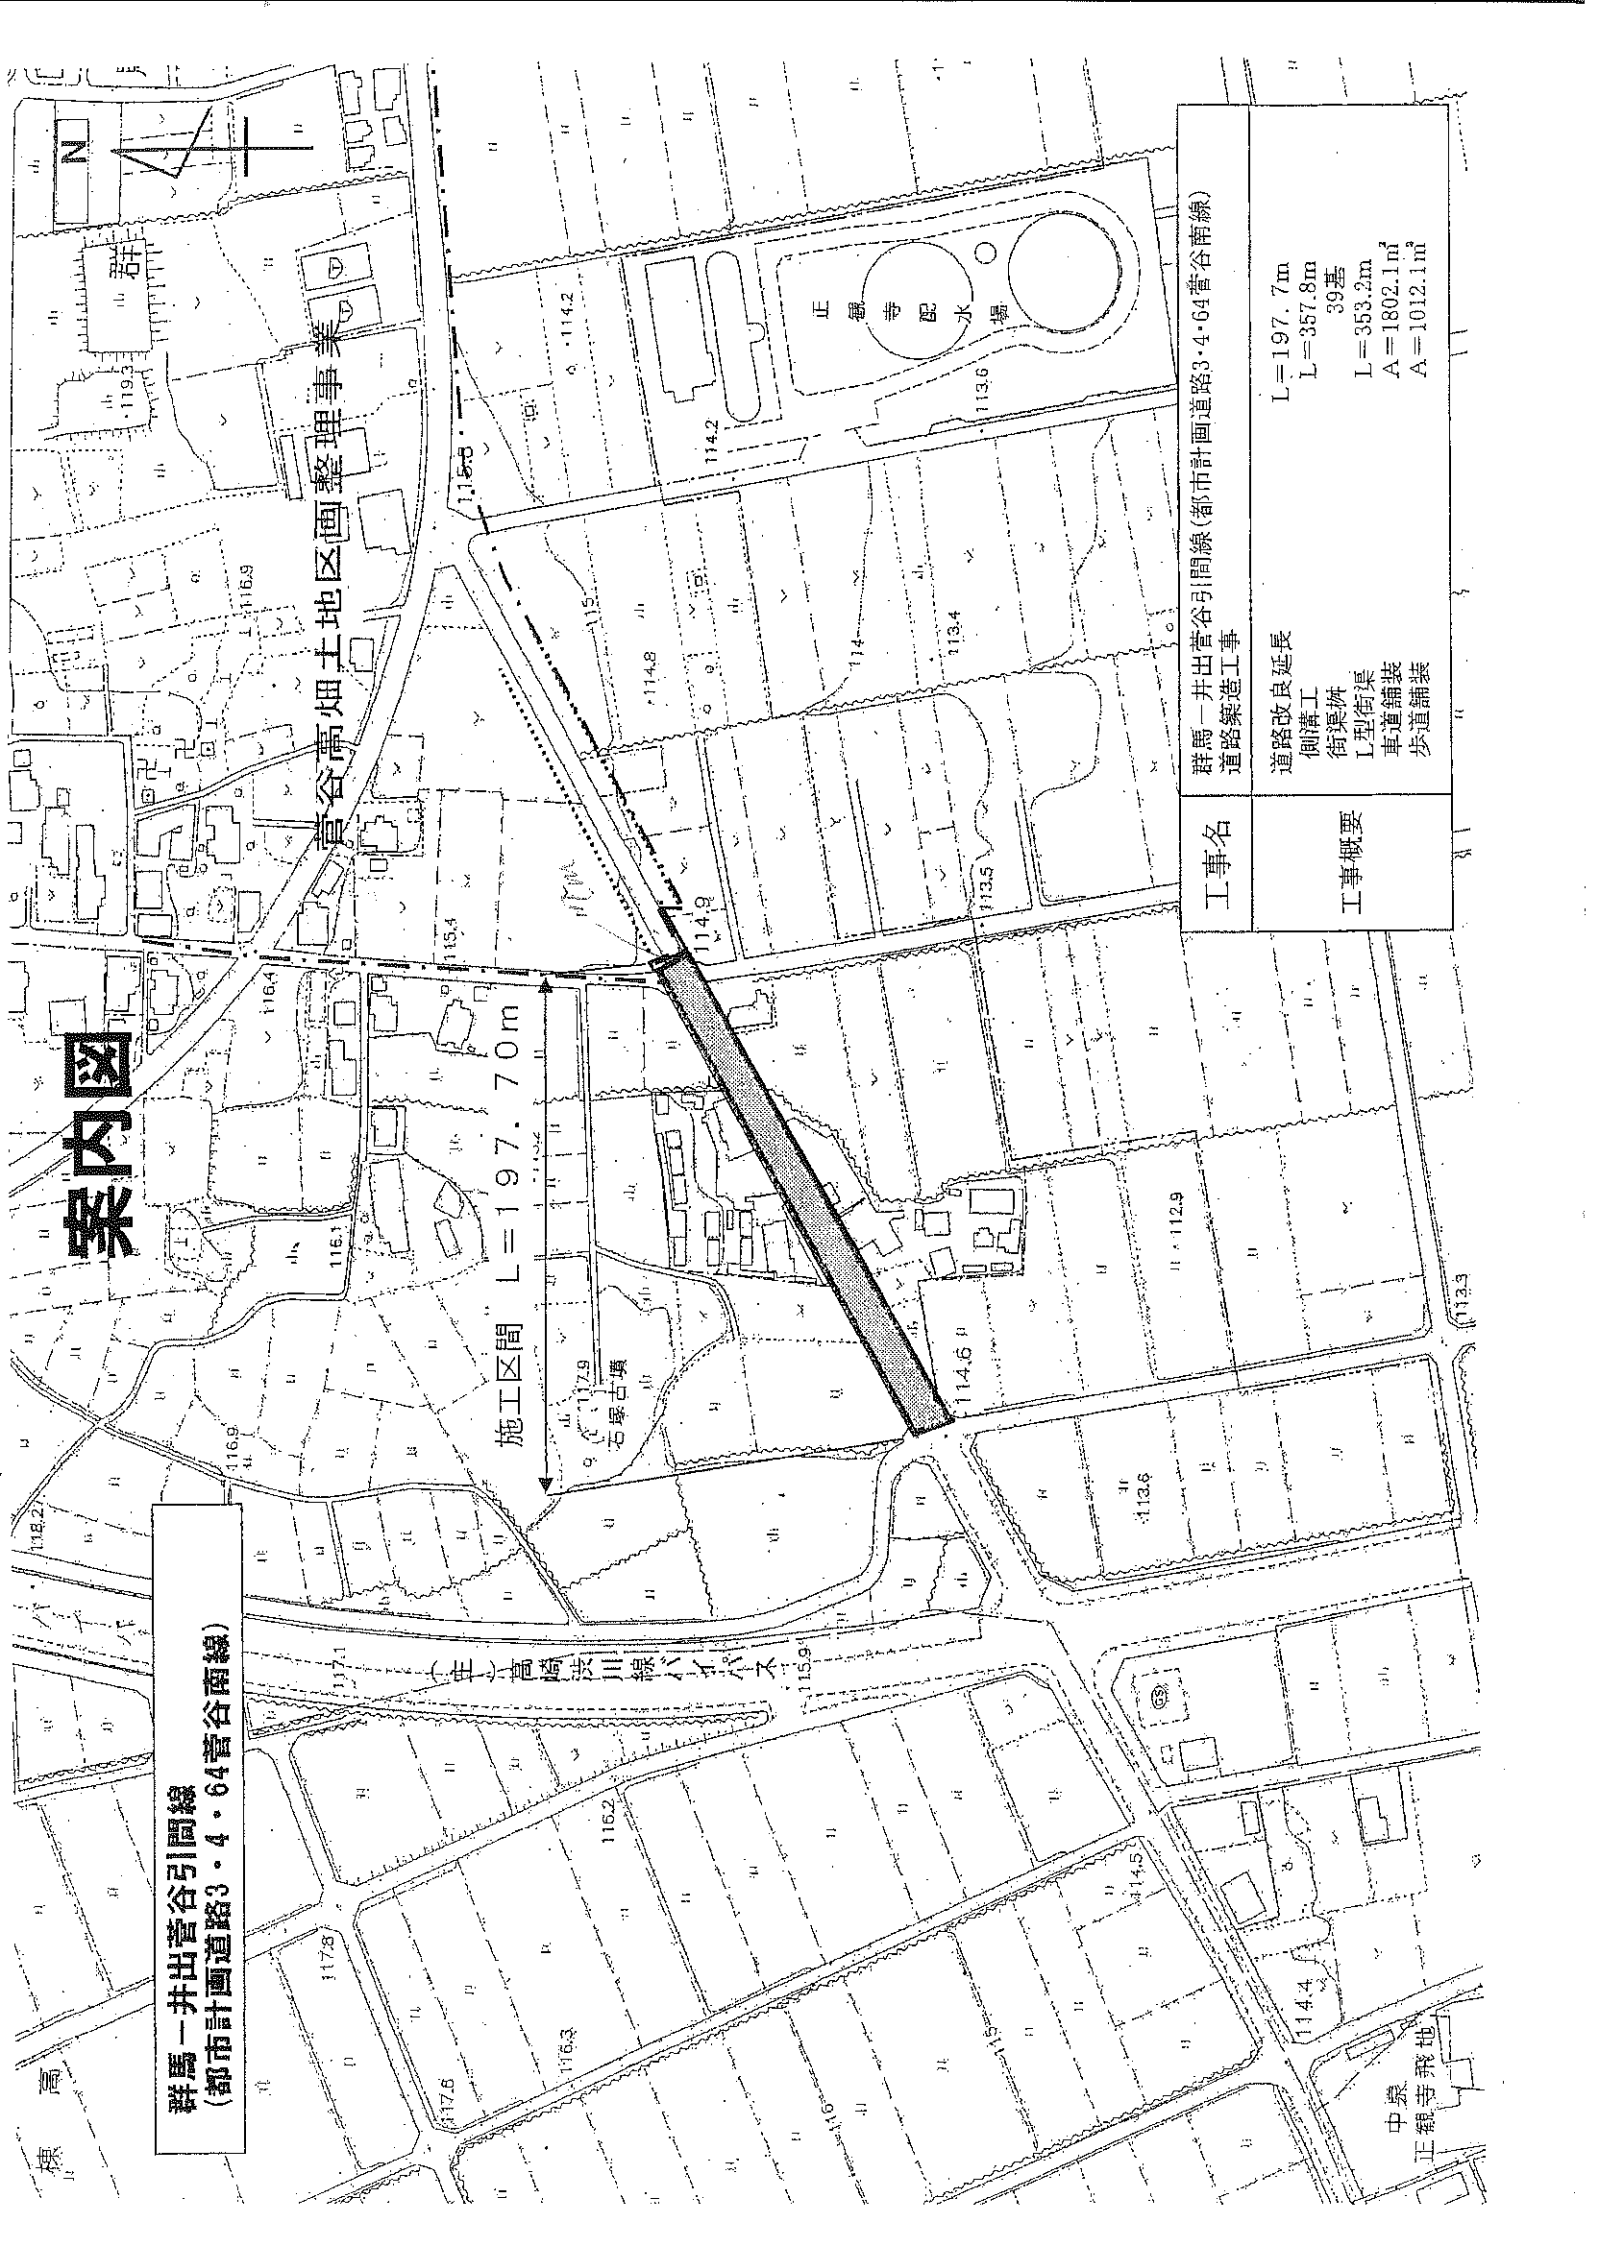

標準断面図

右側 (南側)

左側 (北側)

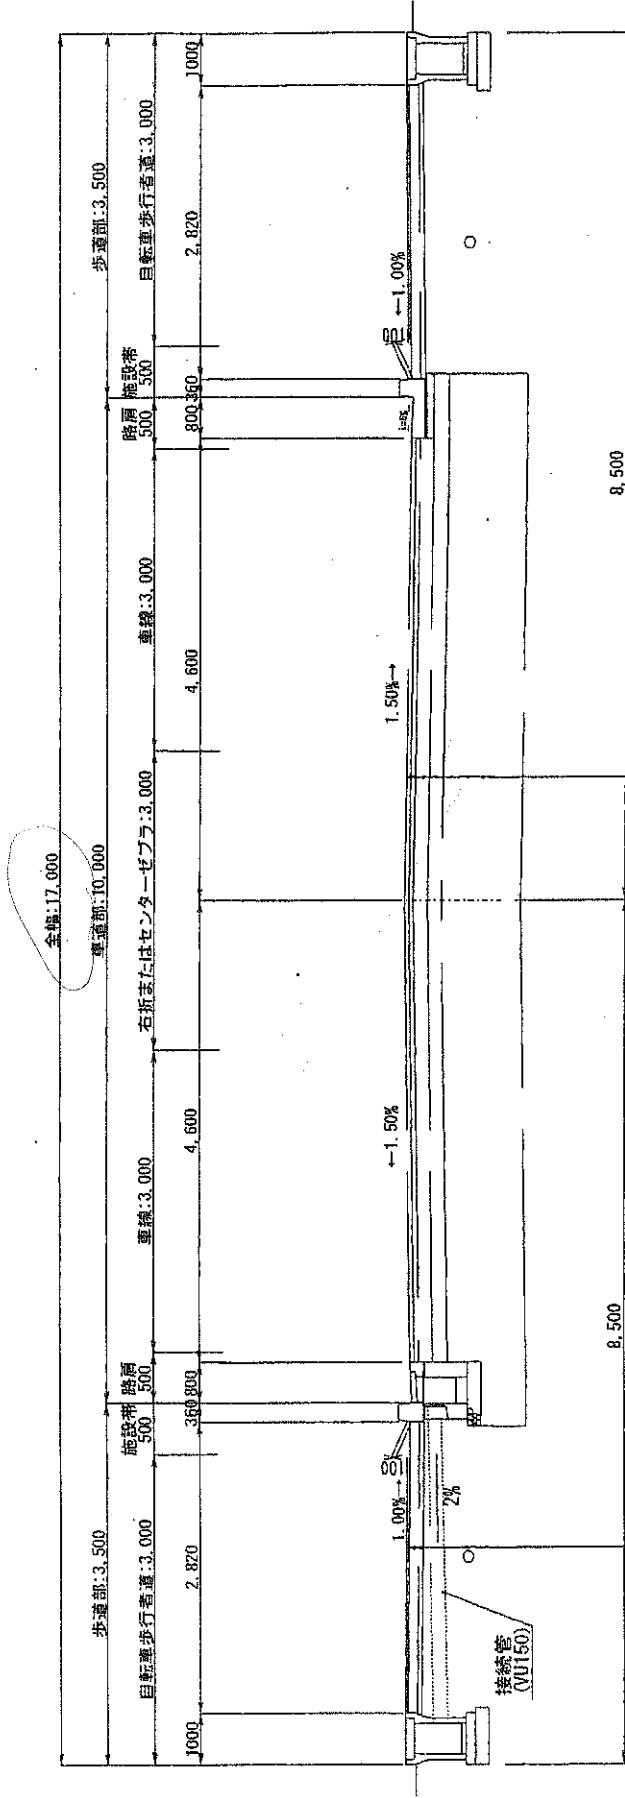

表層	再生密粒度アスコン	t=5cm
基層	再生粗粒度アスコン	t=5cm
上層	粒度調整碎石 (M30-0)	t=15cm
下層	再生碎石 (RC40)	t=15cm
簡換層	山砕 (CBR>20)	t=85cm

歩道透水性舗装

表層	開粒度アスコン	t=3cm
路盤	再生碎石 (RC30)	t=10cm
フィルター層	砂	t=5cm

新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成20年9月30日現在

ソフト事業名	放課後児童健全育成事業		実施地区	高崎市	
実施期間	全期	所管課名	こども家庭課		
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.22)					
事業計画	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備		
実施計画額	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
	項目				
	合計(千円)	216,916	255,494	265,072	
	財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	100,599	115,559	124,025
		地方債	0	0	0
その他		15,945	15,945	15,945	
	一般財源	100,412	123,990	125,102	
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績		
合計	216,916	282,004	・実施状況は、51クラブ、児童数2,439人で実施 ・施設状況は、専用施設31か所、余裕教室9か所、公有地専用施設6か所、その他5か所 ・専用施設整備(建設2か所、購入1か所) <div style="text-align: right;">事業費 282,004千円</div>		
国	0	0			
県	100,759	123,838			
市債	0	0			
その他	15,945	16,396			
一般	100,212	141,770			
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績		
合計	304,384	324,058	・実施状況は、55クラブ、児童数2,561人で実施 ・施設状況は、専用施設31か所、余裕教室9か所、公有地専用施設8か所、その他7か所 ・専用施設設備(建設3か所) <div style="text-align: right;">事業費 324,058千円</div>		
国	0	0			
県	124,756	136,060			
市債	0	0			
その他	18,622	14,391			
一般	161,006	173,607			
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業内容		
合計	383,156		9月30日現在 ・実施は61クラブで実施 ・施設は、専用施設36か所、余裕教室8か所、公有地専用施設7か所、その他10か所 ・専用施設整備予定(建設2か所)		
国	0				
県	147,177				
市債	0				
その他	19,988				
一般	215,991				
