

第 5 次総合計画前期実施計画に係る平成 2 2 年度の推進状況について

第 5 次総合計画前期実施計画事業（新町地域）一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)
1 ~ 2	学校体育施設整備事業	教育部 教育総務課 (新町教育課)
3 ~ 4	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)
5 ~ 6	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
7 ~ 8	上水道施設整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
9 ~ 10	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
11	交通バリアフリー基本構想推進事業	都市整備部 都市計画課
13 ~ 14	新町支所建替事業	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)

新町教育課は、平成 22 年 4 月 1 日付けで、新町支所地域振興課(教育担当)として改編されました。

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	学校体育施設整備事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (新町教育課)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校体育施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
心身ともに健全でゆとりのある学校生活を送るための安全な環境を維持すること及びスポーツの振興に資することを目的とする。 学校施設は災害時に避難場所となることから、安全性の確保は非常に重要である。	老朽化した屋内運動場及びプールの改築を行う。 また、プールの新築も行う。	【屋内運動場】 H20年度: 箕郷中・倉渚中改築 H20年度～H21年度: 新町第一小改築 【プール】 H21年度: 新町第一小改築、箕郷中・倉渚中新築	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
新町第一小屋内体育館改築 箕郷中屋体改築工事 倉渚中屋体改築工事	新町第一小屋内体育館改築 新町第一小プール改築 箕郷中プール新設工事 倉渚中プール新設工事	プール改築	プール改築	プール改築

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	309,093	279,416	■新町第一小屋内運動場建設事業 屋内運動場改築工事、外構工事等 ■新町第一小学校プール建設事業 プール建設工事 ・プール 構造規模: ステンレス製、25mプール: 水面積305㎡、渡渉プール: 水面積50㎡ 工期: H21.10～H22.3完了
国	45,014	82,521	
県	-	-	
地方債	224,700	171,600	
その他	-	-	
一般	39,379	25,295	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業計画
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

新町第一小学校プール完成写真



(25mプール 7コース)



(小プール)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和61年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町駅前第二土地区画整理事業地内		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	・施行面積 : 13.69ha ・総事業費 : 4,544,000千円 ・H20年度末進捗率 : 79.2%	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等	・建物等移転補償 ・道路築造工事 ・仮換地変更、建物調査委託等	・清算金徴収、交付 (事業完了後事務)	・清算金徴収、交付 (事業完了後事務)

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	98,236	未定	・区画街路第3号線道路築造工事 (宝勝寺東門～銀座通り) 幅員6.0m ・ 延長50.0m (平成22年1月完成) ・区画街路第3号線道路築造工事に伴う上下水道、ガス工事 (10月完成) ・建物工作物等移転補償 (宝勝寺周辺を中心に4件実施済)
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	98,236	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	112,678	-	・区画街路第3号線道路築造工事 (銀座通り : サトウカバン店周辺) 幅員 6.0m ・ 延長110.0m (予定) ・公園整備工事(群銀南側) 面積 : 536.8㎡ (予定) ・建物等移転交渉を継続的に実施 ・事業計画変更(期間延長)の申請 (平成23年2月予定)
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	1	-	
一般	112,677	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業計画
合計	-	-	・建物等移転交渉を継続的に実施
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

都市計画事業駅前第二土地区画整理事業 案内図



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の石綿セメント管等をダグ タイル鑄鉄管に布設替えを行う。	新町地域の 石綿セメント管残存延長 (平成 19 年度末 764m)	


【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
石綿セメント管等の 布設替 180m	石綿セメント管等の 布設替 180m	石綿セメント管等の 布設替 180m	石綿セメント管等の布 設替 180m	石綿セメント管等の 布設替 180m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	16,719	36,782	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 8 5 . 3 m ² ・配水管布設工事 L = 3 0 1 . 6 m ・導・配水管布設替工事 L = 2 1 7 . 3 m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	9,200	15,200	
その他	—	—	
一般	7,519	21,582	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	21,941	—	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 1 , 6 1 8 . 2 m ² ・配水管布設工事 L = 1 9 5 . 0 m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	5,200	—	
その他	—	—	
一般	16,741	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

平成22年度上水道管網整備事業

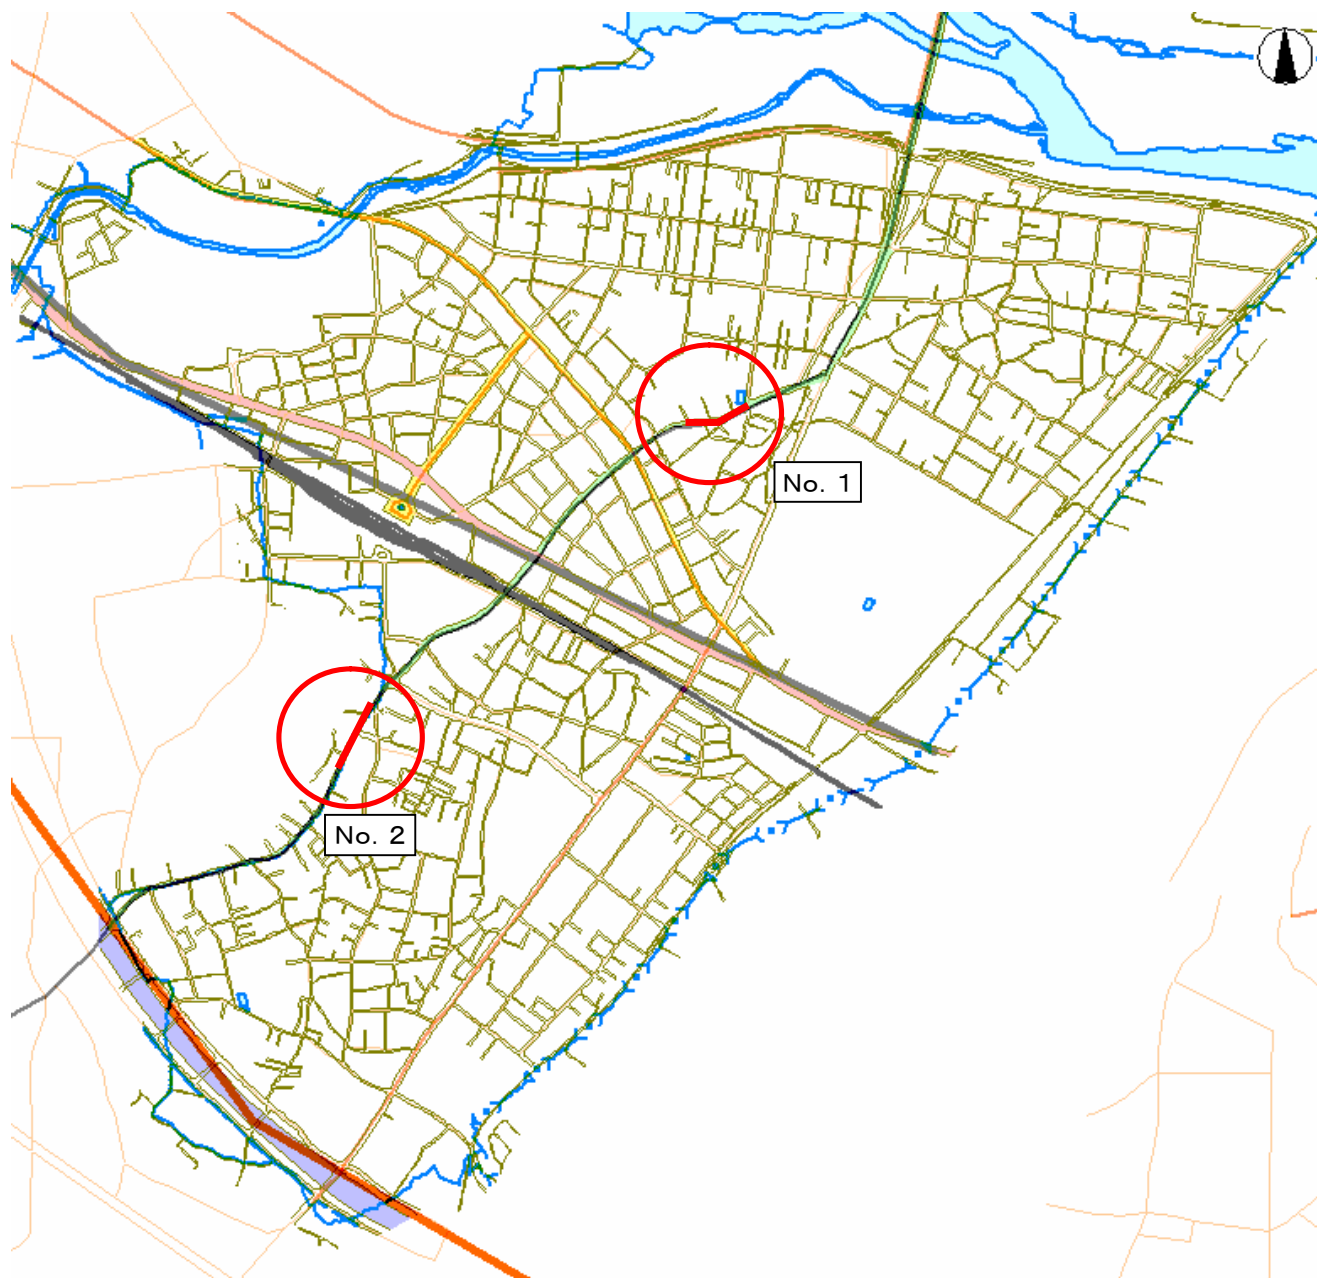

No.	位置	口径等	延長等
1	藤岡・大胡線	φ 150	195m
2	藤岡・大胡線	舗装	1,618㎡

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	上水道施設整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	平成20年度～平成23年度(新町浄水場)	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	上水道施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	老朽化した浄水場等の施設や機器の更新を行う。	水道事業の財政計画も考慮し、浄水場等の施設・機器の更新を行う。	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
受変電設備更新工事 配水ポンプ設備更新工事	水中ポンプ更新工事	中央監視設備更新工事	計装機器更新工事	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	115,331	119,165	施設整備事業 ・盤、計装機器、中央監視、配線、管路等工事 1式 ・次亜注入設備、ポンプ設備、場内配管設備、仕切弁等交換工事 1式
国	—	—	
県	—	—	
地方債	69,000	53,100	
その他	—	—	
一般	46,331	66,065	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	—	—	施設整備事業 事業の前倒しにより、平成21年度で浄水場の設備更新が完了したため、施設整備事業の予定なし。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

< 計装機器 >



< 配水ポンプ >



< 中央監視 >



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を)	雨水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市内における浸水被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成21年度末 整備延長 4.71km	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績		
合計	19,300	5,261	工事名・委託名	発注月	状況
国	4,700	2,700	・新町南排水区地質調査業務委託 (ポーリング8箇所)	H21.10	H22.2完成
県	-	-			
地方債	13,600	2,367			
その他	-	-			
一般	1,000	194			
			22年度事業内容		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	《3月31日現在》		
合計	30,250	-	工事名・委託名	発注月	
国	6,400	-	・新町南排水区詳細設計業務委託	H22.4	
県	-	-			
地方債	17,800	-			
その他	-	-			
一般	6,050	-			
			23年度事業計画		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	工事名・委託名		
合計	-	-	・新町南排水区雨水幹線築造工事	発注月	
国	-	-		第3四半期	
県	-	-			
地方債	-	-			
その他	-	-			
一般	-	-			

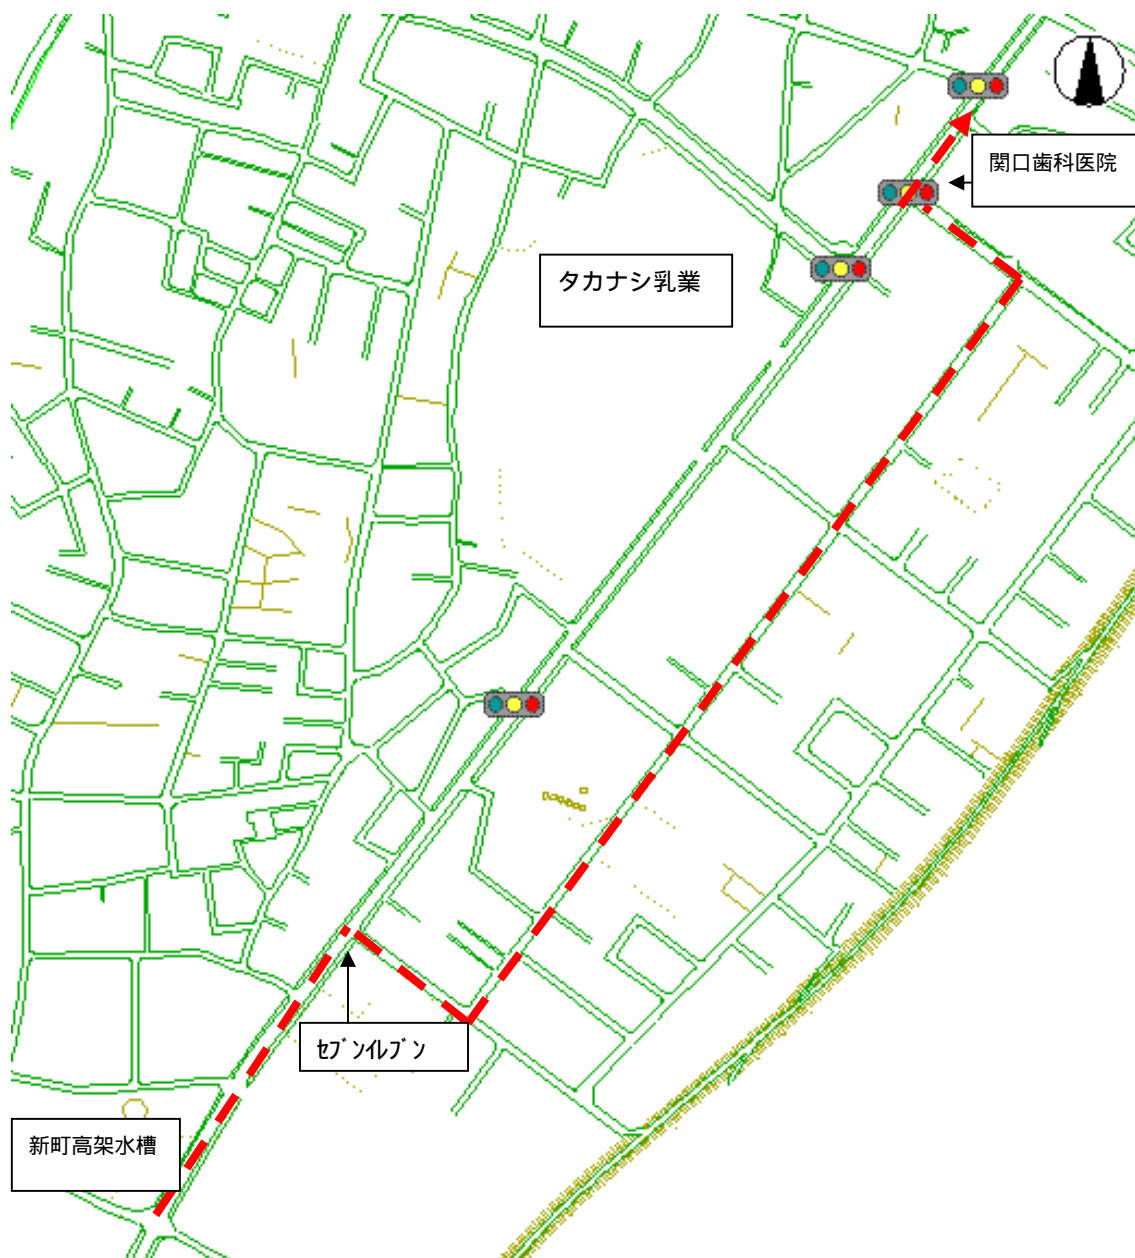

新町南排水区詳細設計業務委託

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	交通バリアフリー基本構想推進事業	所属 (支所)	都市整備部都市計画課
実施期間	全期	事業の種類	ソフト事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市内の駅周辺		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
多くの人が交流する鉄道駅周辺のバリアフリー化を推進して、誰もが安全で快適な社会生活を営むことができるまちの実現を目指す。	高崎市交通バリアフリー基本構想(高崎駅周辺地区)に係る推進組織において、同構想の着実な推進を図る。 乗降客の多い新町駅と井野駅周辺のバリアフリー基本構想の策定について検討を行なう。		

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想推進事業 ○井野駅周辺基本構想策定事業	○高崎駅周辺基本構想推進事業 ・道路特定事業 ○新町駅周辺基本構想推進事業 ○井野駅周辺基本構想策定事業

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業実績
合計	3,000	3,990	バリアフリー推進会議の開催
国	-	-	新町駅周辺基本構想策定に関する調査検討
県	-	-	新町地域バリアフリーワークショップ
地方債	-	-	新町駅周辺バリアフリー基本構想策定協議会
その他	-	-	
一般	3,000	3,990	
	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	4,000	-	実施すべき特定事業の管理者協議等
国	-	-	新町駅周辺バリアフリー基本構想策定協議会
県	-	-	パブリックコメント
地方債	-	-	高崎市バリアフリー基本構想(新町駅周辺地区)策定
その他	-	-	
一般	4,000	-	
	-	-	
区分 (千円)	当初予 算額	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	-	-	バリアフリー推進会議の開催
国	-	-	道路特定事業計画等の作成
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
	-	-	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年3月31日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	地域振興部 地域づくり推進課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成24年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町支所庁舎		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
支所庁舎の耐震診断結果による補強の必要性和老朽化による諸機能の低下に伴い、安全で利便性の高い新庁舎を建設する。	用地の有効利用を図りながら、現在の支所の敷地内に新築する。		

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
				基本計画の作成 基本設計

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地(借地を含む)の整理検討 ・複合化施設の検討
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地(借地を含む)の整理検討 ・複合化施設の検討
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
	-	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業計画
合計	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用地(借地を含む)の整理検討 ・複合化施設の検討
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	
	-	-	

支所庁舎等配置図

