

第5次総合計画前期実施計画に係る平成24年度の推進状況について

## 第5次総合計画前期実施計画事業（新町地域）一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)
1～5	自校方式給食拡充事業	教育部 教育総務課 (新町地域振興課)
7	体育館建設事業	教育部 スポーツ課 (新町地域振興課)
9～10	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)
11～12	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
13～14	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
15～16	新町支所建替事業	総務部 地域行政課 (新町地域振興課)

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育委員会事務局 教育部教育総務課
実施期間	平成23・24年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	給食室・給食センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から自校方式制度を取り入れていく。 また、自校方式への移行に伴い、老朽化した給食センターについて施設を廃止する。	各校に給食室を新設する。また、不要となった給食センターについては、随時解体工事を実施する。		

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
	基本設計 実施設計	新設 ・新町中学校 ・新町第二小学校


### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	12,285	12,285	新町中学校・新町第二小学校 基本設計及び実施設計
国			
県			
地方債			
その他			
一般	12,285	12,285	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	456,795	456,795	新町第二小学校建設経費 202,895千円 建設等工事 197,135千円 初度調弁費 5,760千円
国	17,832	17,832	
県			
地方債	363,700	363,700	新町中学校給食室建設費 253,900千円 建設等工事 247,750千円 初度調弁費 6,150千円
その他			
一般	75,263	75,263	

### 25年度以降事業予定


--	--	--	--

# 新町中学校給食室(増築部分)配置図

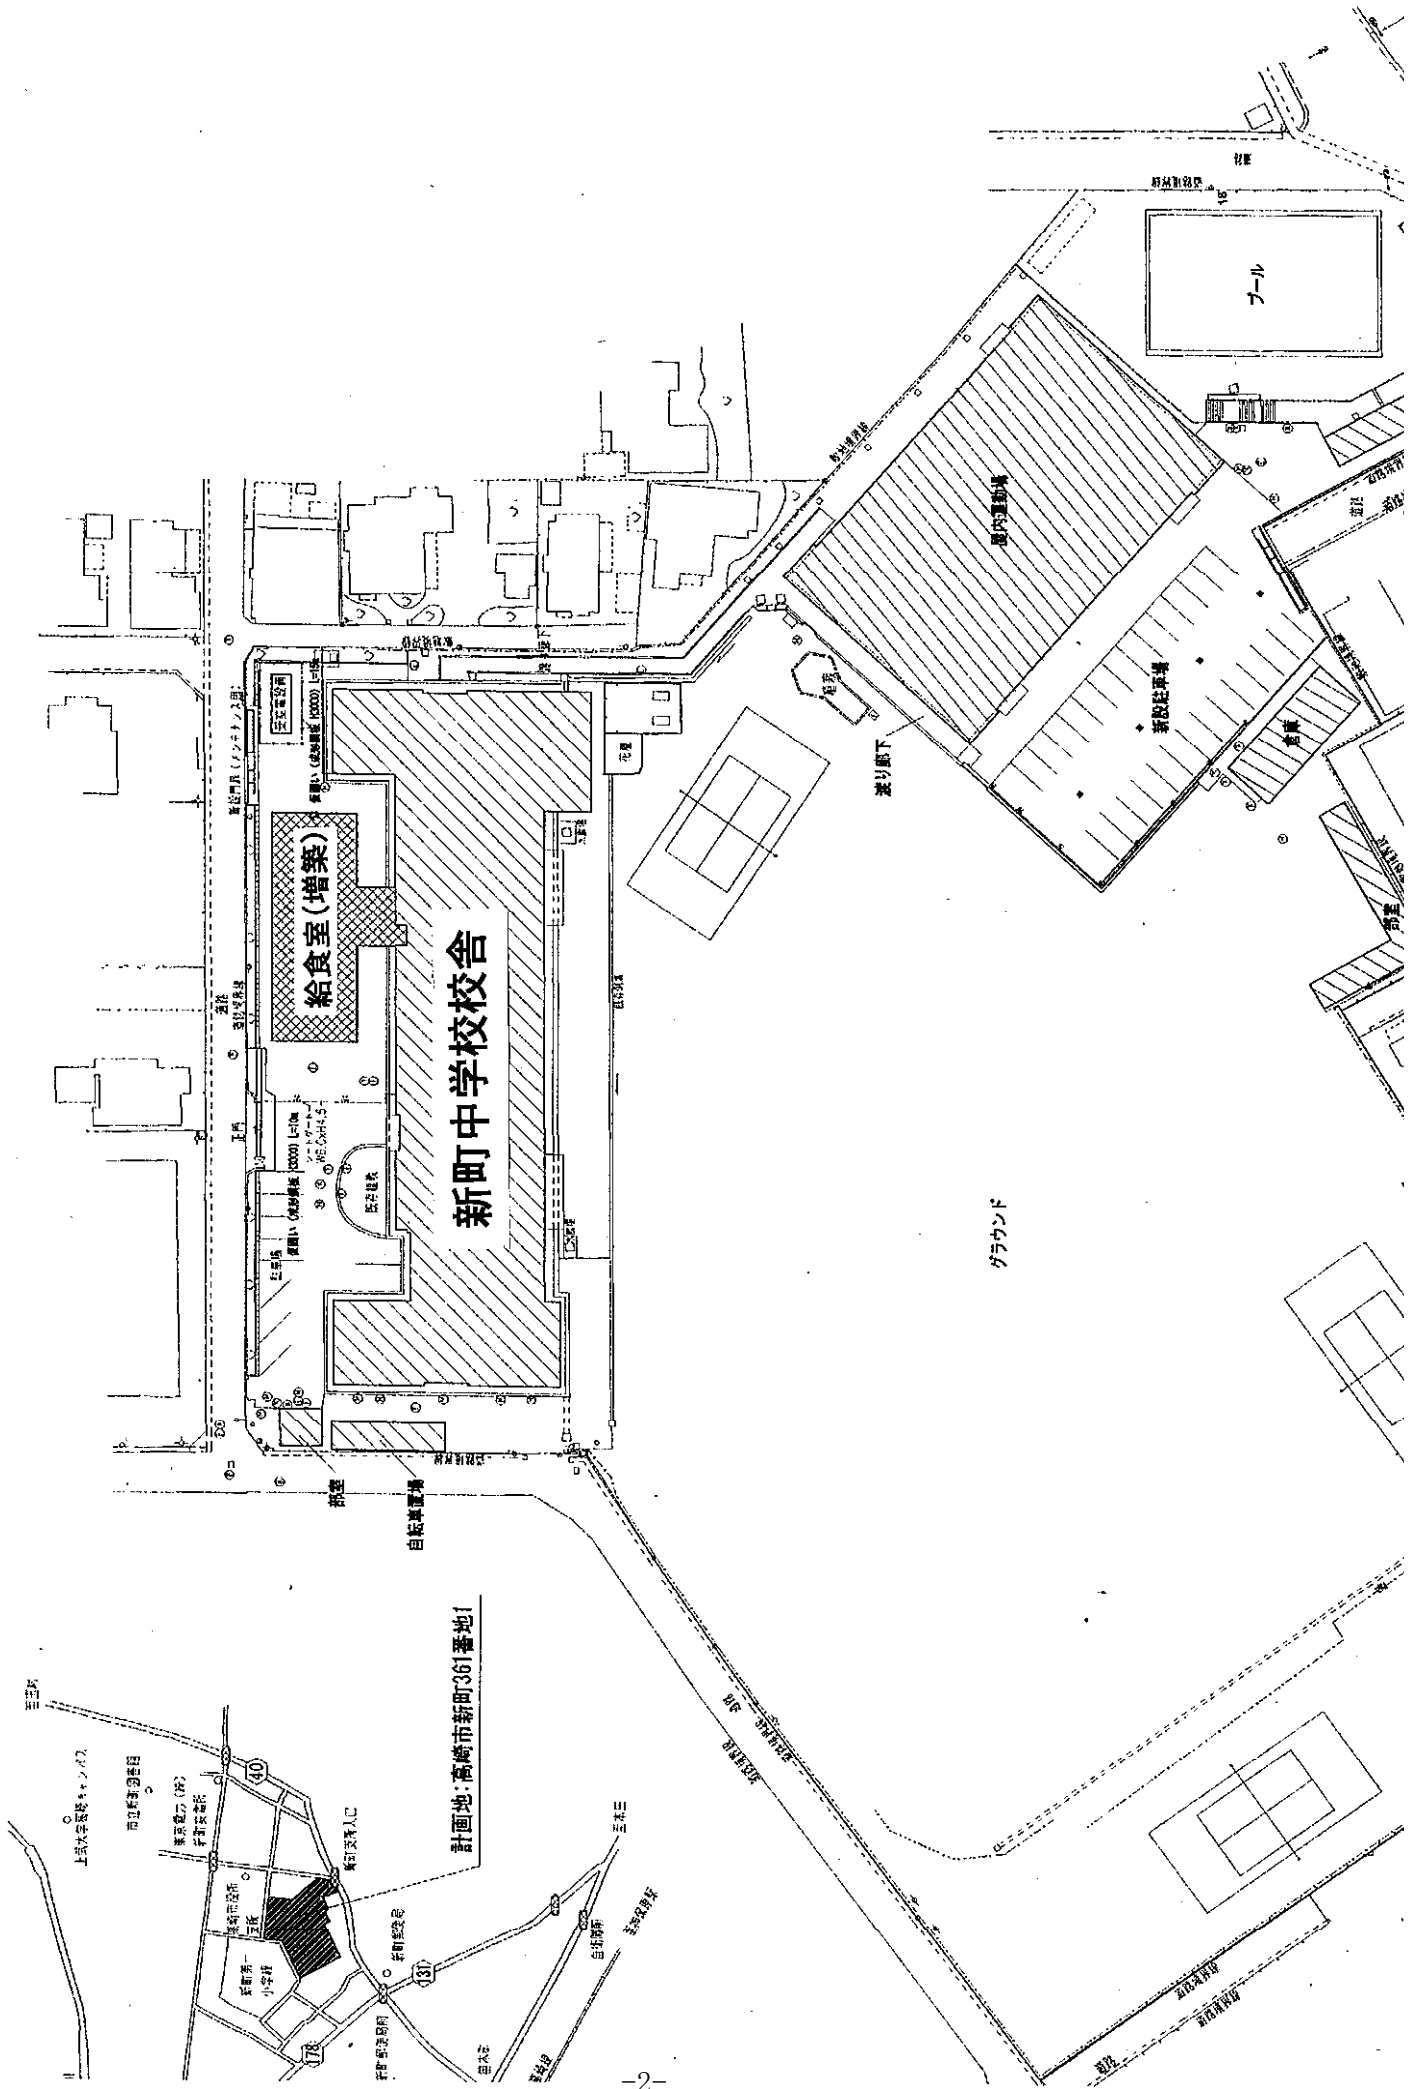



# 新町第二小学校給食室(増築部分)配置図

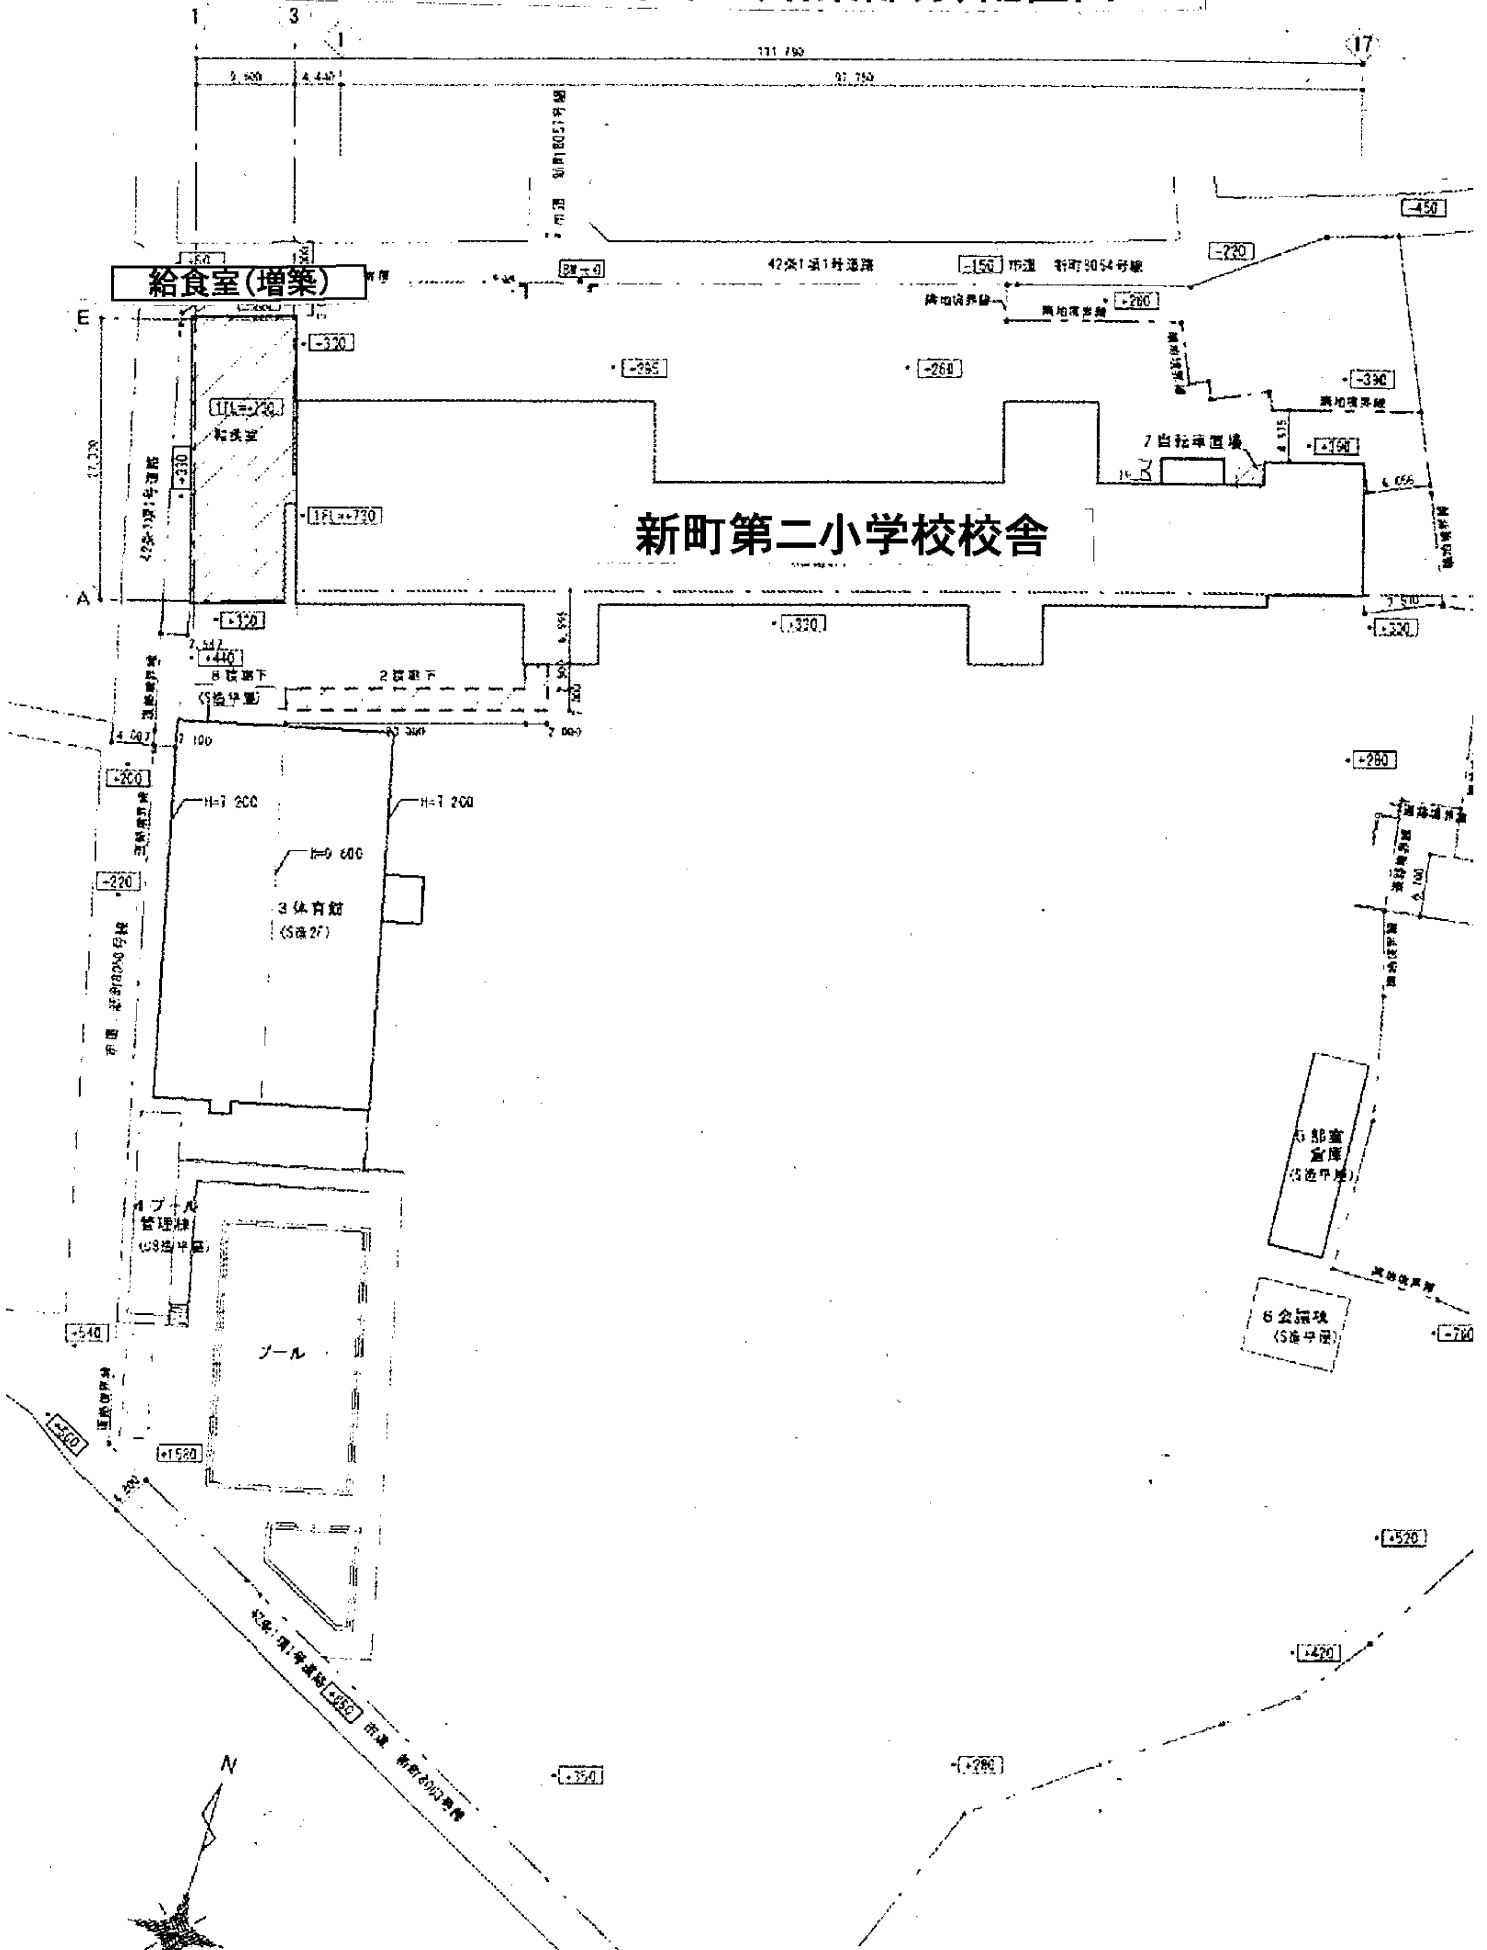

高崎市立新町第二小学校給食室建設等スケジュール（案）

平成23年5月17日現在

	平成23年度												平成24年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
給食室設計																									
その他業務																									
給食室建設工事																									
付帯工事																									
学校給食																									
人員配置等																									

Detailed description of the Gantt chart data:

- 給食室設計 (Cafeteria Design):**
  - 基本設計 (Basic Design): FY23.6 - FY23.9
  - 実施設計 (Implementation Design): FY23.9 - FY23.12
- その他業務 (Other Business):**
  - 校地測量業務 (School Site Measurement Business): FY23.8 - FY23.10
  - 地質調査 (Geological Survey): FY23.6 - FY23.8
- 給食室建設工事 (Cafeteria Construction Work):**
  - 配管切廻工事 (Pipe Cutting/Re-routing Work): FY23.6 - FY23.7
  - 給食室建設工事 (Cafeteria Construction Work): FY23.7 - FY24.1
  - 外構工事 (Exterior Work): FY24.1 - FY24.2
- 付帯工事 (Ancillary Work):**
  - (準備工事) (Preparation Work): FY23.4 - FY23.7 (dashed line)
  - (駐車場整備工事) (Parking Lot Improvement Work): FY23.4 - FY23.7 (dashed line)
- 学校給食 (School Lunch):**
  - 給食センターからの配送 (Delivery from the Cafeteria Center): FY23.12 - FY24.3
- 人員配置等 (Staff Configuration, etc.):**
  - 栄養士・給食技士配置 (Dietician/Cafeteria Technician Assignment): FY24.2 - FY24.3
  - 物品購入 (Purchase of Materials): FY24.2 - FY24.3





## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	体育館建設事業	所属 (支所)	教育委員会事務局教育部 スポーツ課
実施期間	平成24年度～	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)
体育施設の充実を図るため、老朽化している中央体育館及び新町住民体育館の建替建設を行う。	市内の施設配置を考慮した建設候補地の選定を行い、市民の利用促進が図れる体育館建設を目指す。	

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
25年度以降事業予定			



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和61年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	新町駅前第二土地区画整理事業地内		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施行面積 : 13.69ha</li> <li>・総事業費 : 4,564,000千円</li> <li>・H23年度末進捗率 : 84.7%</li> </ul>	

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等移転補償</li> <li>・道路築造工事</li> <li>・仮換地変更、建物調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等移転補償</li> <li>・道路築造工事</li> <li>・仮換地変更、建物調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等移転補償</li> <li>・道路築造工事</li> <li>・仮換地変更、建物調査委託等</li> </ul>

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	91,554	43,030	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物工作物等移転補償(3件完了) 建物 2件 ・ 工作物等 1件</li> <li>・区画街路第12-3号線外1道路築造工事 (一部完成)</li> <li>・区画整理審議会委員選挙人名簿作成業務(完了)</li> </ul>
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	91,554	43,030	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	49,672	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物等移転交渉を継続的に実施 (建物工作物等6件予定)</li> <li>・区画整理審議会委員選挙の実施</li> </ul>
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	49,672	-	

### 25年度以降事業予定

--

区画街路第 12-3 号線外 1 工事



工 事 前



工 事 後

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	新町地域の 石綿セメント管残存延長 (平成21年度末 517m)	


### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の 布設替  100m	石綿セメント管等の布 設替  100m	石綿セメント管等の 布設替  100m

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計	20,500	25,011	管網整備事業 ・配水管布設替工事 L = 472.4m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	5,400	16,199	
その他	—	—	
一般	15,100	8,812	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	22,266	—	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 1,050.0㎡ ・配水管布設工事 L = 218.8m ・配水管布設替工事 L = 50.0m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	6,000	—	
その他	—	—	
一般	16,266	—	
25年度以降事業予定			

平成24年度上水道管網整備事業

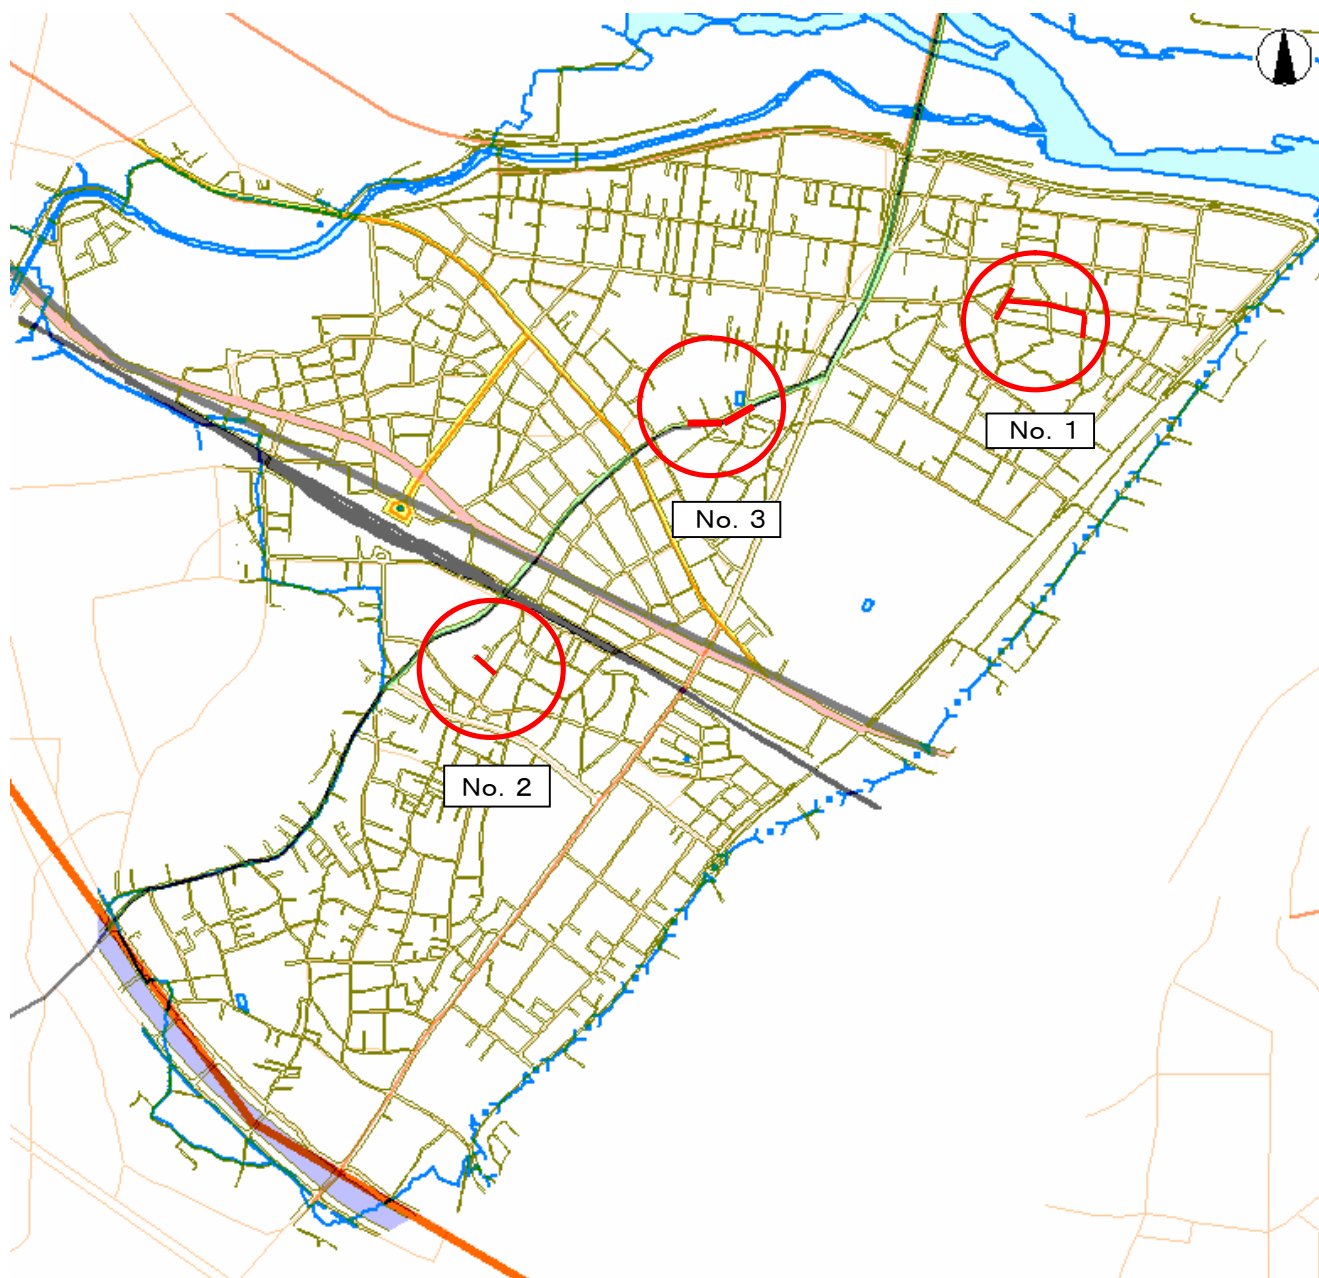

No.	位置	口径等	延長等
1	字下河原地内	φ100	218.8m
2	第二保育園東	φ100	50.0m
3	藤岡・大胡線	舗装	1,050m <sup>2</sup>

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】


対象(誰を、何を)	雨水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市内における浸水被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成23年度末 整備延長 4.81km	

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	雨水管渠の整備 (神流川流域)	

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	23年度事業実績
合計	36,035	29,202	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>工事名・委託名</p> <p>・神流川雨水1-2号幹線築造工事(第1工区) (□1200mm×1000mm L=106.2m)</p> <p>・新町中排水区基本設計業務委託 (基本設計雨水 A=54ha)</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>発注月</p> <p>H23.10</p> <p>H23.12</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>状況</p> <p>H24.3 完成</p> <p>H24.3 完成</p> </div> </div>
国	7,500	12,537	
県	-	-	
地方債	15,500	4,300	
その他	-	-	
一般	13,035	12,365	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計	46,408	-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>《3月31日現在》</p> <p>・新町南排水区雨水幹線築造工事 L=82m</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>発注予定</p> <p>第2四半期</p> </div> </div>
国	7,500	-	
県	-	-	
地方債	17,500	-	
その他	-	-	
一般	21,408	-	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	25年度以降事業予定
合計	-	-	
国	-	-	
県	-	-	
地方債	-	-	
その他	-	-	
一般	-	-	

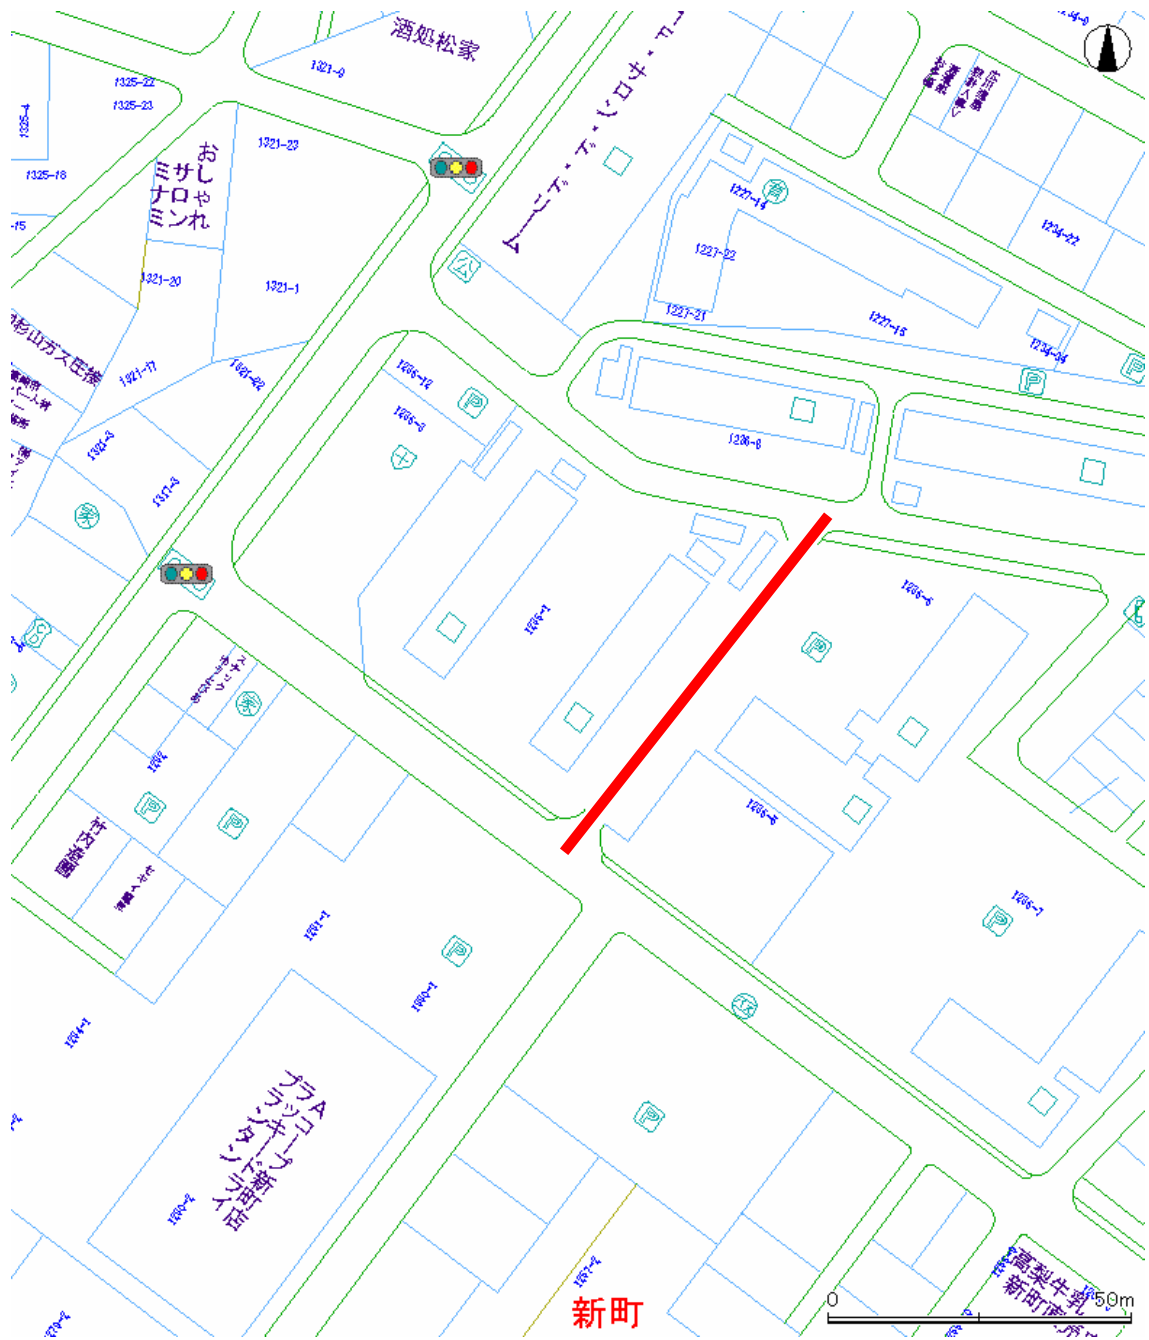

新町南排水区雨水幹線築造工事



## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	総務部 地域行政課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成24年度～	事業の種類	ハード事業

### 【事業概要】

対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
支所庁舎の耐震診断結果による補強の必要性と老朽化による諸機能の低下に伴い、安全で利便性の高い新庁舎を建設する。	用地の有効利用を図りながら、現在の支所の敷地内に新築する。		

### 【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度

### 【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業実績
合計			・公共用地(借地を含む)の整理事業 ・複合化施設の検討
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業内容
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
25年度以降事業予定			

# 支所庁舎等配置図

