

新町地域の事業推進状況について

新町地域の事業推進状況一覧

頁	事業名	担当課 (支所担当課)
1	体育館建設事業	教育部 スポーツ課 (新町地域振興課)
2~3	新町駅前第二土地区画整理事業	都市整備部 市街地整備課 (新町区画整理事務所)
4~5	上水道管網整備事業	水道局 工務課 (新町上下水道事務所)
6	雨水管渠整備事業	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
7	新町支所建替事業	総務部 地域行政課 (新町地域振興課)

新町地域の事業推進状況報告書

平成25年 9月30日現在

事務事業名	体育館建設事業	所属 (支所)	教育委員会事務局 教育部 スポーツ課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成24年度～	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象			
実施目的	具体的手段	そ の 他	
体育施設の充実を図るため、老朽化している中央体育館及び新町住民体育館の建替建設を行う。	市内の施設配置を考慮した建設候補地の選定を行い、市民の利用促進が図れる体育館建設を目指す。		

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	0	500	・男女トイレ各1ヶ所様式化工事
国			
県			
地方債			
その他			
一般	0	500	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計		
国		
県		
地方債		
その他		
一般		

新町地域の事業推進状況報告書

平成25年 9月30日現在

事務事業名	新町駅前第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部市街地整備課 (新町区画整理事務所)
実施期間	昭和61年度～平成27年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	<ul style="list-style-type: none"> ・施行面積: 13. 69ha ・総事業費: 4, 564, 000千円 ・H24年度末進捗率: 82. 4%

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	49, 672	55, 127	<ul style="list-style-type: none"> ・建物工作物等移転補償(2件) ・区画街路第3号線道路築造工事(一部側溝工事11m)
国			
県			
地方債			
その他			
一般	49, 672	55, 127	


【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	43, 022	<ul style="list-style-type: none"> ・建物移転交渉を継続的に実施(3件完了) ・建物工作物等調査 ・区画街路第3号線道路側溝工事(L=110m) ・区画街路第3号線道路照明設置工事 ・区画街路第3号線道路舗装工事
国		
県		
地方債		
その他		
一般	43, 022	

高崎市計画事業 駅前第二土地区画整理事業 現況図

設計図

▲	新築
□	建築計画区域
○	建築区域
○	公園
○	水路
○	電線
○	境界

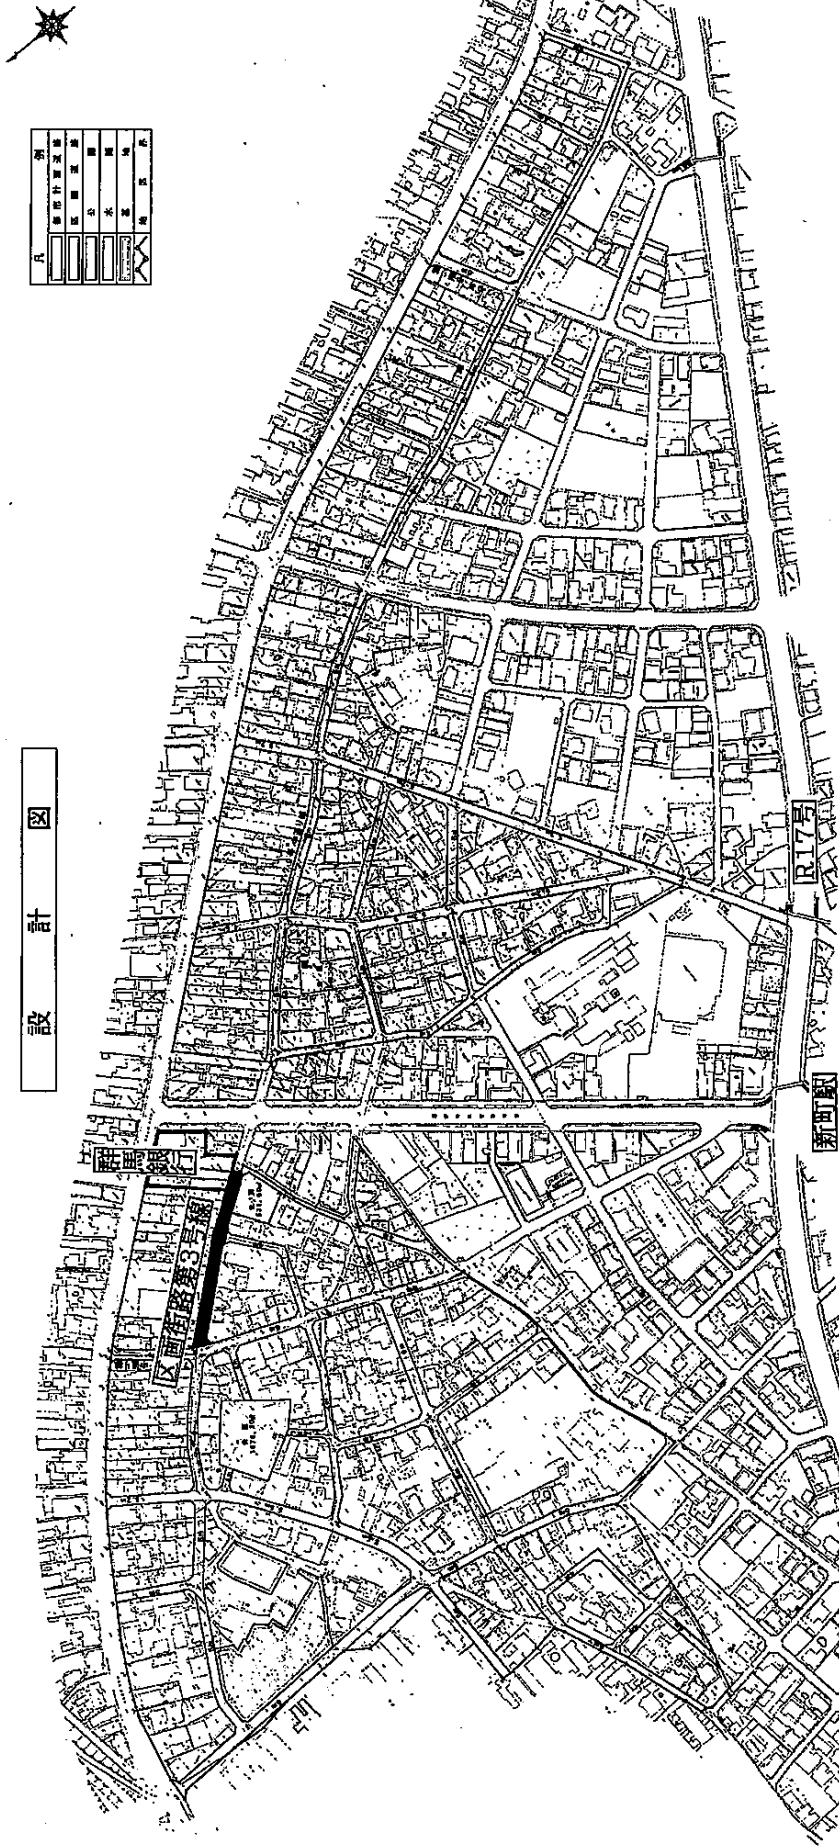

新町地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (新町上下水道事務所)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	配水管		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	新町地域内の老朽管の更新および石綿セメント管布設替を行う。	新町地域の石綿セメント管残存延長 (平成24年度末 39.6m)	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績
合計	22,266	29,043	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A=1,137.7㎡ ・配水管布設工事 L= 222.7m ・配水管布設替工事 L= 71.8m (布設・布設替 計 L= 294.5m)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	6,000	6,000	
その他	—	—	
一般	16,266	23,043	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	20,830	管網整備事業 ・配水管布設工事 L= 200.0m ・配水管布設替工事 L= 43.0m (布設・布設替 計 L= 243.0m) (9月末現在 当初予算額ベース進捗率 26%) 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	
県	—	
地方債	6,800	
その他	—	
一般	14,030	

平成25年度上水道管網整備事業



No.	位置	口径等	延長等
1	新町郵便局北側道路	φ 150mm	38.0m
		φ 75mm	5.0m
2	県道中島・新町線	φ 100mm	297.0m

新町地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	雨水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (新町上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	配水管		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
市内における浸水被害の解消を目指す。	計画的に雨水管渠を整備する。	平成24年度末 整備延長 4.81km	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	24年度事業実績		
合計	46,408	21,001	工事名・委託名	発注月	状況
国	7,500	8,899	・神流川雨水 1-2 号幹線築造工事(第2工区)	H24. 9	H25.4 完成予定
県	-	-	・神流川雨水 1-2 号幹線築造工事(第3工区)	H24.12	H25.5 完成予定
地方債	17,500	12,102	・新町中排水区(雨水)地質調査業務委託	H24.11	H25.3 完成
その他	-	-			
一般	21,408	0			

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定			
合計	19,822	H24 年度事業繰越			
国	-	・神流川雨水 1-2 号幹線築造工事(第2工区) H25.4 完成			
県	-	・神流川雨水 1-2 号幹線築造工事(第3工区) H25.5 完成			
地方債	-				
その他	-				
一般	19,822				

新町地域の事業推進状況報告書

平成25年9月30日現在

事務事業名	新町支所建替事業	所属 (支所)	総務部 地域行政課 (新町支所 地域振興課)
実施期間	平成25年度～	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	支所庁舎の耐震診断結果による補強の必要性と老朽化による諸機能の低下に伴い、安全で利便性の高い新庁舎を建設する。	用地の有効活用を図りながら、現在の支所の敷地内での整備及び複合化施設も視野にいれ、別の場所への整備も検討していく。	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業実績
合計	—	—	・複合化施設の検討
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	25年度事業予定
合計	—	・支所内において、庁舎に関する課題・問題点等について検討し、関係部署との調整を図る。
国	—	
県	—	
地方債	—	
その他	—	
一般	—	
