

平成 23 年度 第 2 回 高崎市箕郷地域審議会

第 5 次総合計画前期実施計画
事業推進状況報告書

箕郷地域観光施設整備事業	...	1 P ~ 2 P
榛名南麓広域営農団地農道整備事業	...	3 P ~ 6 P
自校方式給食拡充事業	...	7 P ~ 8 P
箕輪城跡保存整備事業	...	9 P ~ 11 P
上水道管網整備事業	...	12 P ~ 13 P
污水管渠整備事業	...	14 P ~ 15 P

平成 23 年 10 月 26 日

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月30日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	みさと芝桜公園		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜公園にライトアップ照明整備を行うことにより、営業時間の延長を図り入園者の増加を推進する。 また、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体	6.5 ha
		・芝桜	2.9 ha
		・花園ゾーン	1.2 ha
		・林間ゾーン	0.6 ha
		・駐車場ほか	1.8 ha

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
芝桜公園整備運営 計画策定 芝桜公園運営管理	芝桜公園運営管理	芝桜公園用地取得 トイレ設置工事 芝桜公園運営管理	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	49,454	45,664	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園整備運営計画策定
県	5,702	5,702	芝桜公園運営事業 45,663,446円
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	30,821	19,005	芝桜管理委託業務
一般	12,931	20,957	芝桜保全委託業務
			園内整備事業
			・芝桜まつり実施
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	53,612	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園エントラス・歩道舗装工事
県	5,857	—	芝桜公園運営事業
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	29,980	—	芝桜管理委託業務 6,300,000円
一般	17,775	—	芝桜保全委託業務 5,856,400円
			園内整備事業 1,287,300円
			・芝桜まつり実施関係業務
			8,887,085円
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園用地取得
県	—	—	・トイレ設置工事
地方債	—	—	芝桜公園運営事業
その他	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
一般	—	—	・芝桜まつり関係業務



【平成23年4月28日】



【休みどころ】



【除草作業】



【植替作業前】



【芝桜移設様子】

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月30日現在

事務事業名	榛名南麓広域営農団地農道整備事業	所属 (支所)	農政部 田園整備課 (箕郷支所 建設課)
実施期間	平成19年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名南麓広域農道		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名南麓(箕郷～榛名)における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業について、市が10%負担する。 国50% 県40% 市10%(起債90%)	Ⅱ期工事 進捗率 58% (平成22年度末)	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
箕郷地区 道路工 橋梁工 上部・下部 榛名地区 用地測量委託	箕郷地区 橋梁上部工 道路工 榛名地区 用地買収・道路工	榛名地区 用地買収補償 道路工 橋梁工	



【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	47,259	66,600	<事業費 666,000千円 負担金66,600千円> ・用地買収補償費 ・道路工(改良工事) ・14号橋 下部工(橋台2基・橋脚4期) 上部工
国	—	—	
県	—	—	
地方債	42,525	59,940	
その他	—	—	
一般	4,725	6,660	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	38,000	—	<事業費 380,000千円 負担金 38,000千円> ・道路工(上層路盤工・表層工) ・14号橋 上部工
国	—	—	
県	—	—	
地方債	34,200	—	
その他	—	—	
一般	3,800	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	・用地買収補償 ・道路工 ・15号橋
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	




案内図

榛名南麓広域営農団地農道整備事業
〔フルーツライン〕

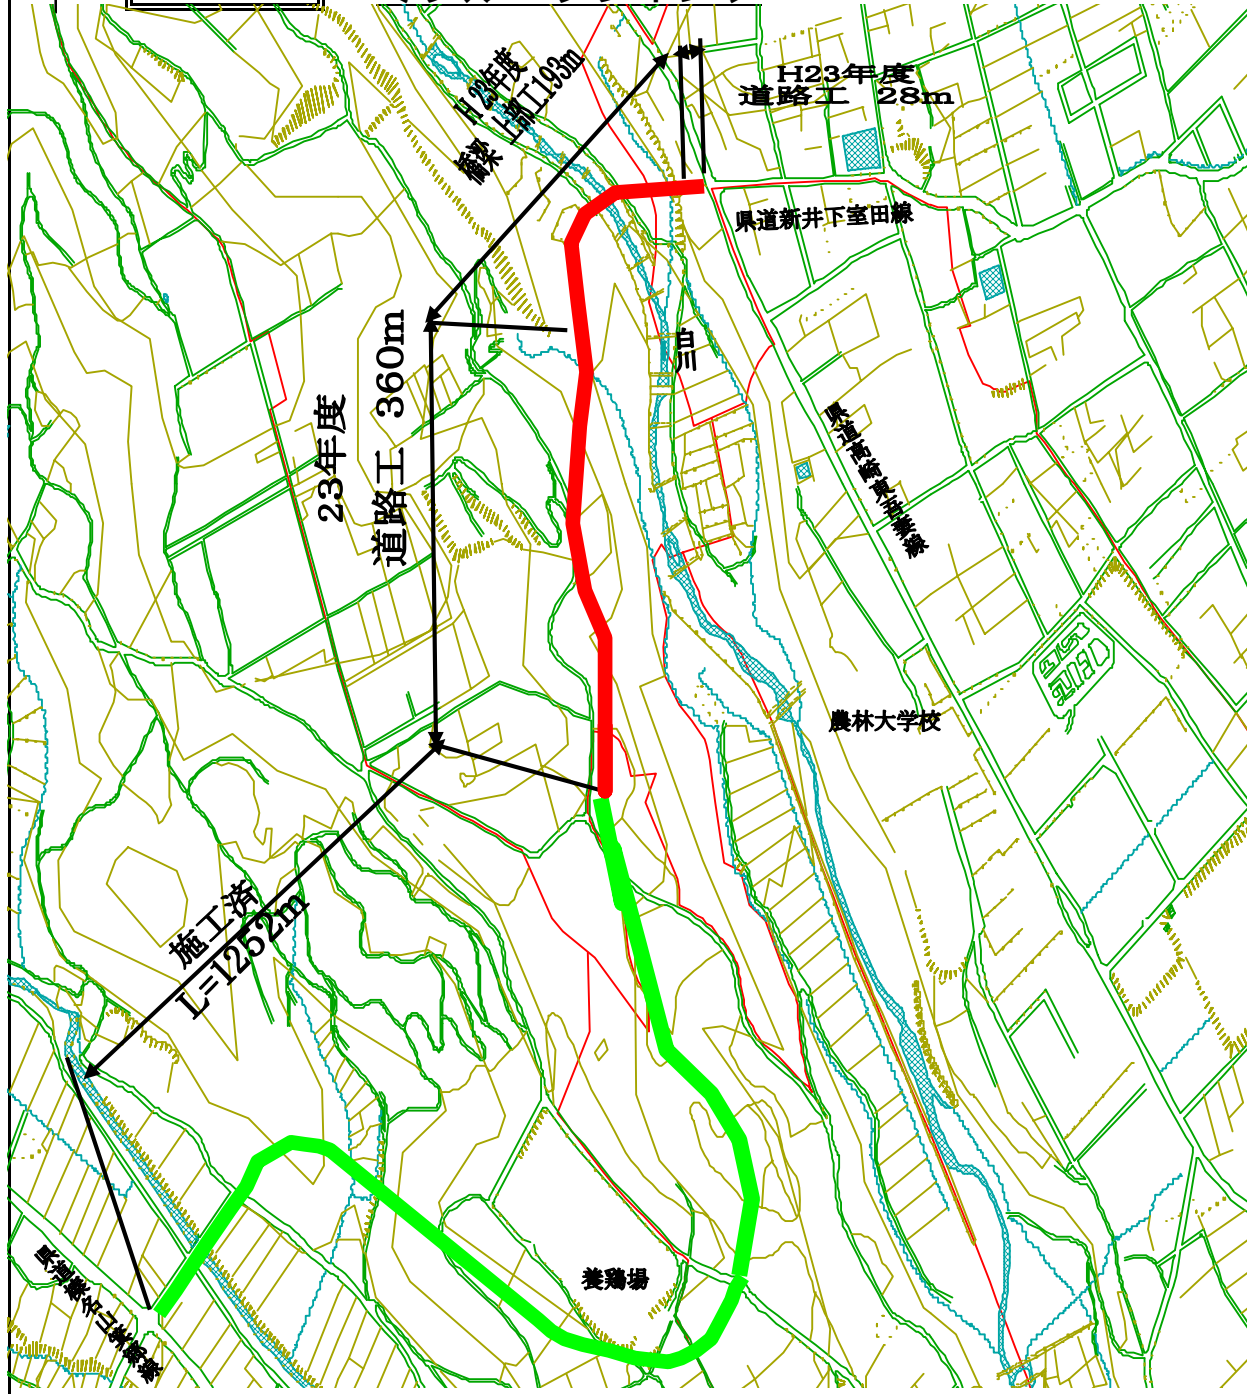

標準部

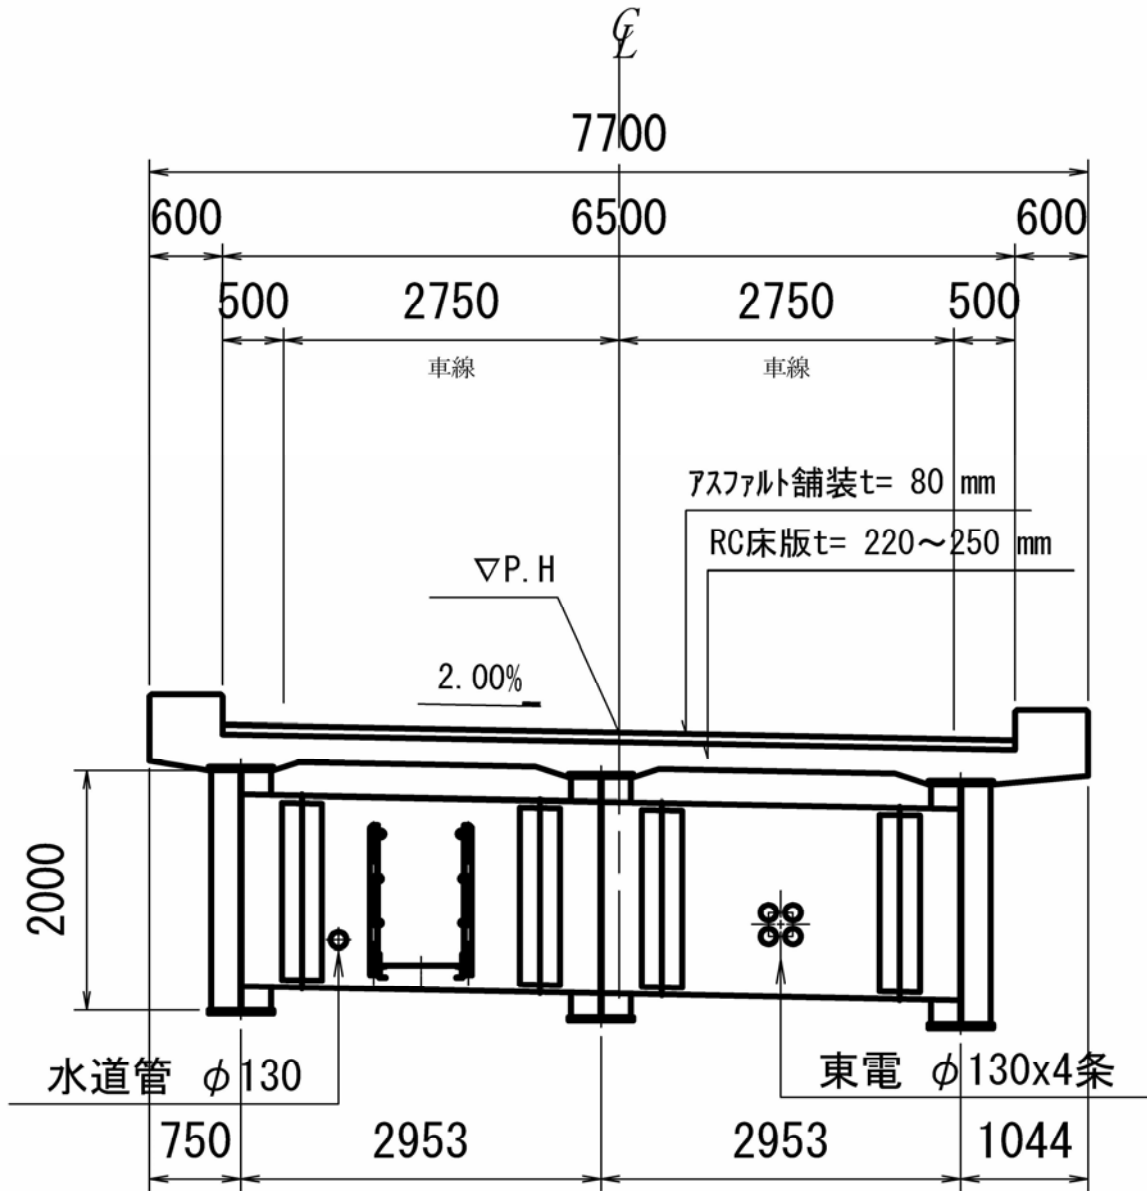

榛名南麓広域営農団地農道整備事業(フルーツライン)

●橋脚部全景
(南方向)



(榛名白川東側)

平成23年度9月末 施工状況

(橋梁 上部工施工中)



(榛名白川西側)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月 30日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から、自校方式給食制度を取り入れていく。 また、自校方式への移行に伴い、老朽化した学校給食センターについて、施設を廃止する。	各学校に給食室を新設する。 また、役目を終えた給食センターについては、随時解体していく。	学校給食センターの老朽化を考慮し、センターが古い地域の順に整備することを基本とし、校舎改築等に織り交ぜて実施する。	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度		
新設 ・下里見小学校 ・下室田小学校	新設 ・箕郷中学校 ・群馬中央中学校 解体 ・榛名学校給食センター	新設 ・新町中学校 ・新町第二小学校		


【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	35,087	27,081	21年度繰越事業:地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用 (繰越予算額 420,000 千円) ・下里見小学校 給食室増築完成 23年4月より稼働 ・下室田小学校 給食室増築完成 23年4月より稼働
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	35,087	27,081	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	396,360	—	・箕郷中学校 給食室増築 年度内完成予定 24年4月より稼働予定 ・群馬中央中学校 給食室増築 年度内完成予定 24年4月より稼働予定
国	22,490	—	
県	—	—	
地方債	305,800	—	
その他	—	—	
一般	68,070	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	・新町中学校 給食室増築 ・新町第二小学校 給食室増築
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

箕郷中学校給食室配置図



箕郷中学校給食室建設場所現況写真

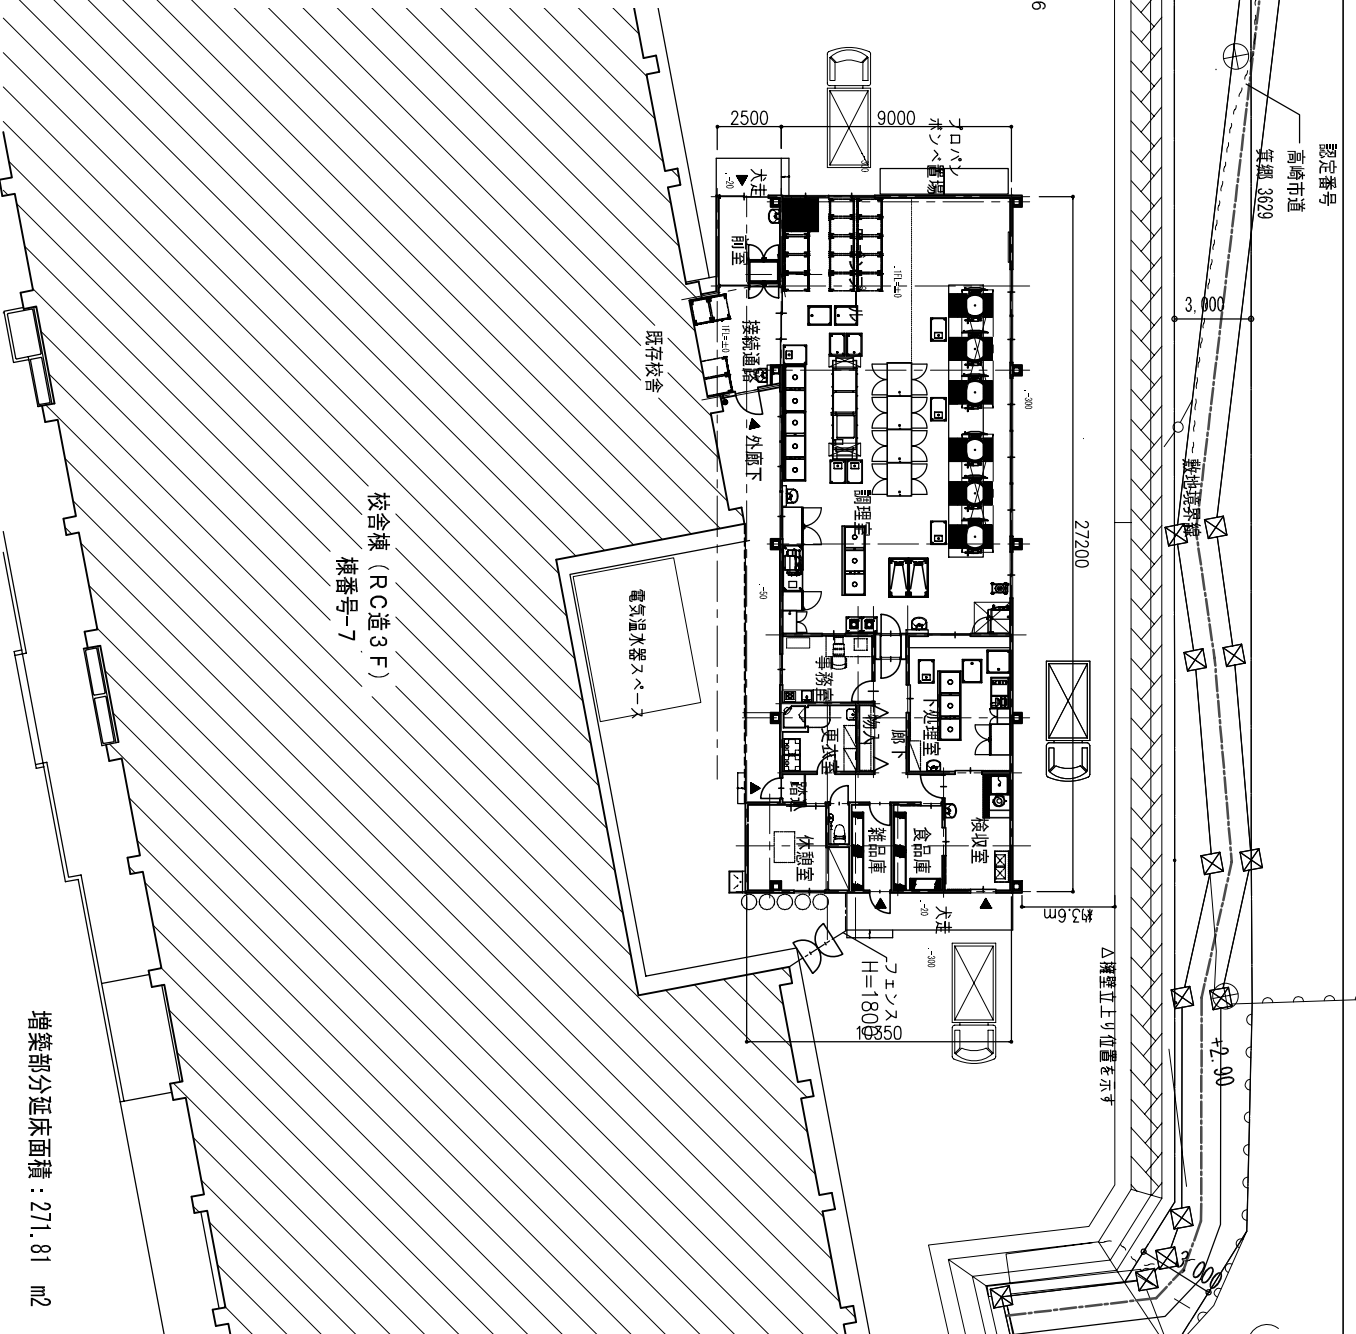

校舎棟 (RC造3F)
棟番号-7

増築部分延床面積：271.81 m²

株式会社 You & You 建築設計 〒420-0801 静岡県浜松市東区箕郷 3-3-3 TEL 057-343-0488 FAX 057-343-0484	一般建築士 登録番号 一般建築士 登録番号 構造設計一般建築士 登録番号 設備設計一般建築士 登録番号
--	--

設計年月日 H22.12.03	訂正年月日 1. 2. 3. 4. 5. 6.
--------------------	---

出庫 設計 監理 建築 承認 工事名 高崎市立 箕郷中学校 給食室 新築工事
--

図面名 計画案 06 周辺配置図	縮尺 A1 1 : 100 A3 1 : 200	図面番号 A -
---------------------	------------------------------------	-------------

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月 30日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)			
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡箕輪城跡(昭和62年12月17日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。 史跡指定面積約19ha	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	平成15年度 基本計画 平成19年度 発掘調査報告書刊行 平成22年度基本設計 平成22年度までの事業進捗率 12%	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(史跡全体) ・実施設計(樹木伐採) ・保存整備委員会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(園路・施設・防空壕埋戻し等) ・整備工事(樹木伐採) ・保存整備委員会 	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・整備工事(樹木伐採・設備・園路・防空壕埋戻し) ・保存整備委員会 	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	11,512	9,040	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(史跡全体) ・科学的調査(防空壕探査業務委託・ボーリング業務委託) ・実施設計(樹木伐採) ・保存整備委員会開催
国	2,500	2,500	
県	750	750	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	8,262	5,790	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	27,641	—	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(園路・付帯施設・防空壕埋戻し等) ・整備工事(樹木伐採) ・保存整備委員会開催
国	7,000	—	
県	2,100	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	18,541	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査 ・基本設計(復元建造物) ・実施設計(御前曲輪・郭馬出) ・整備工事(樹木伐採・防空壕埋戻し・園路・付帯施設等) ・保存整備委員会開催
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

箕輪城平成23年度工事の状況



伐採前の状況(参考写真)



本丸西側の堀、伐採後の状況(23年10月7日現在)
堀底を北から南にむかって見た状況。

* 伐採木の整理は今後実施。



本丸南側の堀、伐採後の状況（23年10月7日現在）
二の丸から本丸に至る土橋の上で、東から西を見た状況
堀の雄大さがよくわかるようになった。

* 伐採木の整理は今後実施。



伐採後の状況（23年10月7日現在）
本丸南側の堀
堀底を西から東にむかって見た状況

* 伐採木の整理は今後実施。

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月30日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	箕郷地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	箕郷地域の石綿セメント管残存延長 (平成22年度末 5,687m)	





【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
石綿セメント管等の布設替 1,700m	石綿セメント管等の布設替 1,500m	石綿セメント管等の布設替 1,400m	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	86,291	81,404	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A=1,655.2㎡ ・送配水管布設工事 L= 606.8m ・送配水管布設替工事等 L=1,117.1m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	41,800	37,900	
その他	—	—	
一般	44,491	43,504	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	85,500	—	管網整備事業 <執行実績> ・舗装復旧工事 A= 634.3㎡ ・送水管布設工事 L= 613.0m ・配水管布設替工事 L= 434.5m <発注予定> ・舗装復旧工事 A= 550㎡ ・配水管布設替工事 L= 173m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	40,200	—	
その他	—	—	
一般	45,300	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	管網整備事業 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

上水道管網整備事業

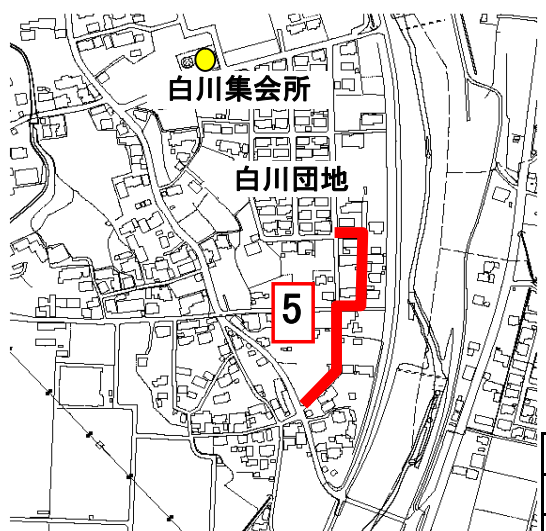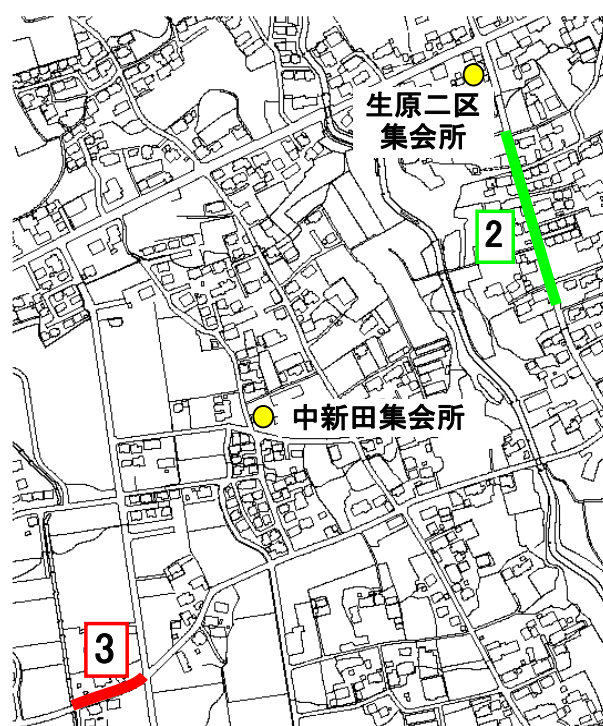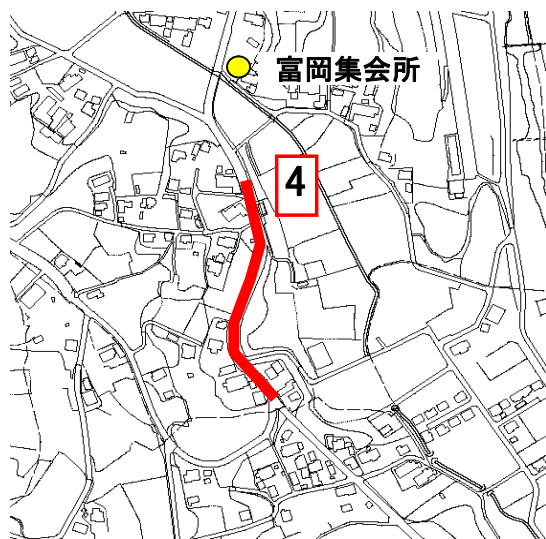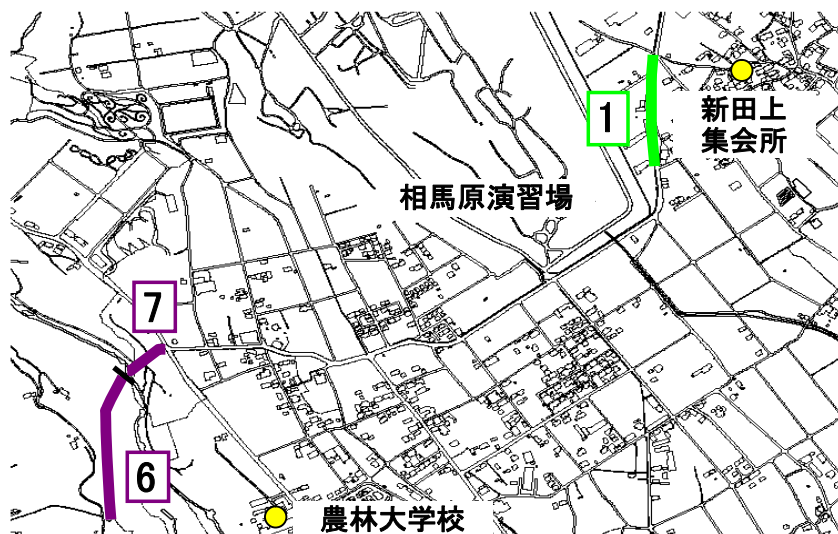

1	矢原・舗装復旧	A = 550.0m ²
2	生原・舗装復旧	A = 634.3m ²
3	生原・配水管布設替	L = 157.0m
4	富岡・配水管布設替	L = 173.1m
5	白川・配水管布設替	L = 277.5m
6	松之沢・送水管布設	L = 336.9m
7	松之沢・送水管布設	L = 276.1m

凡 例	
舗装復旧工事	
配水管布設替工事	
送水管布設	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年 9月30日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成22年度末 整備面積 205.16ha 整備延長 41.25km	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	22年度事業実績
合計	103,931	73,177	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 管渠布設 L=1,339.13m
国	31,815	33,548	
県	—	800	
地方債	49,800	26,429	
その他	18,200	12,400	
一般	4,116	0	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	92,254	—	下水道築造工事発注済 管渠布設 L=319.7m 舗装復旧 A=2,098.5㎡ 下水道築造工事発注予定 管渠布設 L=210.0m
国	37,530	—	
県	—	—	
地方債	27,300	—	
その他	12,000	—	
一般	15,424	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	下水道築造工事発注予定 管渠布設 L=1,841m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

污水管渠整備事業

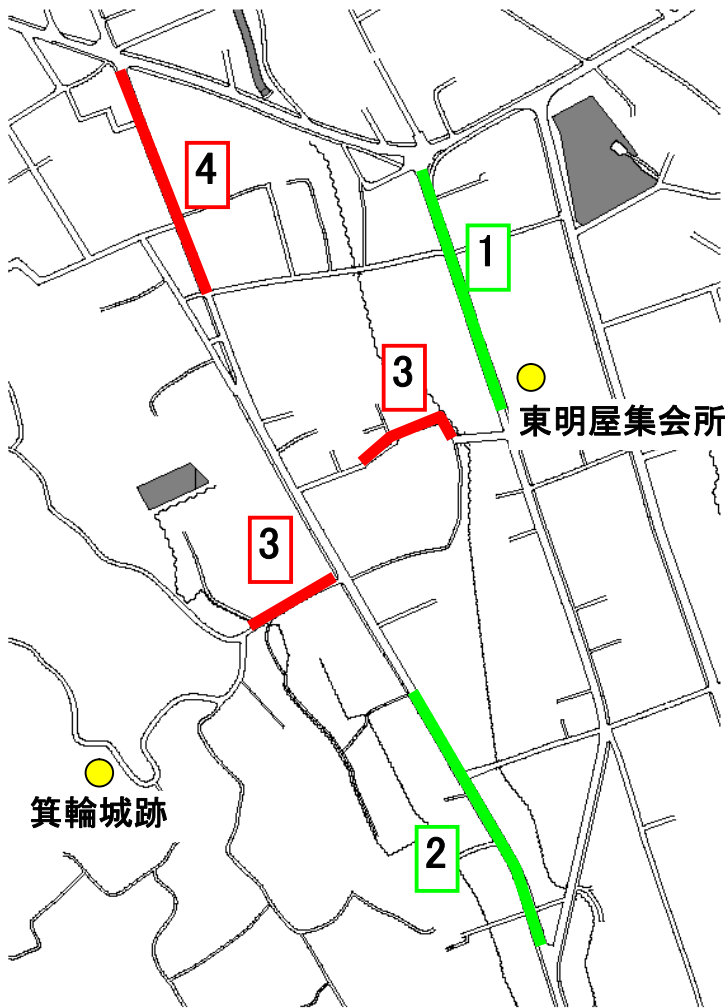

凡例	
舗装復旧工事	
管渠布設工事	

1	東明屋・舗装復旧	A = 803.0m ²
2	東明屋・舗装復旧	A = 1,295.5m ²
3	東明屋・管渠布設	L = 141.9m
4	東明屋・管渠布設	L = 177.8m
5	下芝・管渠布設	L = 210.0m

