

平成24年度 第2回 高崎市箕郷地域審議会

第5次総合計画前期実施計画  
事業推進状況報告書

- |                |          |
|----------------|----------|
| ① 箕郷地域観光施設整備事業 | … 1P～2P  |
| ② 箕輪城跡保存整備事業   | … 3P～6P  |
| ③ 上水道管網整備事業    | … 7P～8P  |
| ④ 污水管渠整備事業     | … 9P～10P |

平成24年7月2日

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

|       |              |            |                     |
|-------|--------------|------------|---------------------|
| 事務事業名 | 箕郷地域観光施設整備事業 | 所属<br>(支所) | 商工観光部<br>(箕郷支所 産業課) |
| 実施期間  | 平成19年度～全期    | 事業の種類      | ハード事業               |

### 【事業概要】

|                                     |   |            |       |
|-------------------------------------|---|------------|-------|
| 対象(誰を、何を)                           | みさと芝桜公園   |            |       |
| 実施目的(どういった状態に)                      | 具体的手段(どういった手段で)   | その他(全体計画等) |       |
| 芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。 | 芝桜公園にライトアップ照明整備を行なうことにより、営業時間の延長を図り入園者の増加を推進する。<br>また、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。 | 芝桜公園全体     | 6.5ha |
|                                     |   | ・芝桜        | 2.9ha |
|                                     |   | ・花園ゾーン     | 1.2ha |
|                                     |   | ・林間ゾーン     | 0.6ha |
|                                     |   | ・駐車場ほか     | 1.8ha |

### 【年度別事業計画】

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| 平成22年度                       | 平成23年度   | 平成24年度   |
| 芝桜公園整備運営<br>計画策定<br>芝桜公園運営管理 | 芝桜公園運営管理 | 芝桜公園運営管理 |

### 【年度別推進状況】

| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 23年度事業実績   |
|------------|-----------|-----------|--|
| 合計         | 53,612    | 44,215    | 芝桜公園整備事業 8,064,000円<br>・芝桜公園エントランス・歩道舗装工事                                |
| 国          |           |           |  |
| 県          | 5,857     | 5,857     | 芝桜公園運営事業 36,150,838円<br>・芝桜管理及び保全関係業務<br>・芝桜まつり実施関係業務                    |
| 地方債        |           |           |  |
| その他        | 29,980    |           |  |
| 一般         | 17,775    | 38,358    |  |
|            |           |           |  |
| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 24年度事業内容   |
| 合計         | 34,170    |           | 芝桜公園運営事業<br>・芝桜管理及び保全関係業務<br>芝桜管理委託業務 5,300,000円<br>芝桜保全委託業務 11,000,000円 |
| 国          |           |           |  |
| 県          |           |           |  |
| 地方債        |           |           |  |
| その他        | 25,920    |           | ・芝桜まつり実施関係業務 9,688,000円  |
| 一般         | 8,250     |           |  |
|            |           |           |  |
| 25年度以降事業予定 |           |           |  |
|            |           |           |  |



2012芝桜公園満開



混み合う売店



整備後のエントランス広場

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

|       |              |            |                          |
|-------|--------------|------------|--------------------------|
| 事務事業名 | 箕輪城跡保存整備事業   | 所属<br>(支所) | 教育部文化財保護課<br>(箕郷支所地域振興課) |
| 実施期間  | 平成6年度～平成28年度 | 事業の種類      | ハード事業                    |

### 【事業概要】


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 対象(誰を、何を)  |  |  |  |
| 実施目的(どういった状態に)   | 具体的手段(どういった手段で)  | その他(全体計画等)   |  |
| 国指定史跡箕輪城跡(昭和62年12月17日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共有の文化的・歴史的遺産として活用を図る。<br>史跡指定面積約19ha | 市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史活用の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。 | 平成15年度 基本計画(史跡全体)<br>平成19年度 発掘報告書<br>平成22年度 基本設計(史跡全体)<br>平成23年度 整備事業1年次<br>23年度までの事業進捗率 15% |  |

### 【年度別事業計画】

| 平成22年度  | 平成23年度   | 平成24年度   |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・発掘調査</li> <li>・基本設計(史跡全体)</li> <li>・実施設計(樹木伐採)</li> <li>・保存整備委員会</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発掘調査</li> <li>・基本設計(復元建造物)</li> <li>・実施設計(園路・施設・防空壕埋戻し等)</li> <li>・整備工事(樹木伐採)</li> <li>・保存整備委員会</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計(復元建造物)</li> <li>・整備工事(樹木伐採・トイレ・四阿)</li> <li>・保存整備委員会</li> </ul> |

### 【年度別推進状況】

| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 23年度事業実績   |
|------------|-----------|-----------|--|
| 合計         | 27,641    | 21,617    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発掘調査</li> <li>・基本設計(復元建造物)</li> <li>・実施設計(園路・付帯施設・防空壕埋戻し等)</li> <li>・整備工事(樹木伐採)</li> <li>・保存整備委員会開催</li> </ul> |
| 国          | 7,000     | 6,500     |  |
| 県          | 2,100     | 1,950     |  |
| 地方債        | 0         | 0         |  |
| その他        | 0         | 0         |  |
| 一般         | 18,541    | 13,167    |  |
| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 24年度事業内容   |
| 合計         | 54,910    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計(復元建造物)</li> <li>・整備工事(樹木伐採・トイレ設置・四阿改修等)</li> <li>・保存整備委員会開催</li> </ul>                                    |
| 国          | 21,500    |           |  |
| 県          | 6,450     |           |  |
| 地方債        | 0         |           |  |
| その他        | 0         |           |  |
| 一般         | 26,960    |           |  |
| 25年度以降事業予定 |           |           |  |
|            |           |           |  |

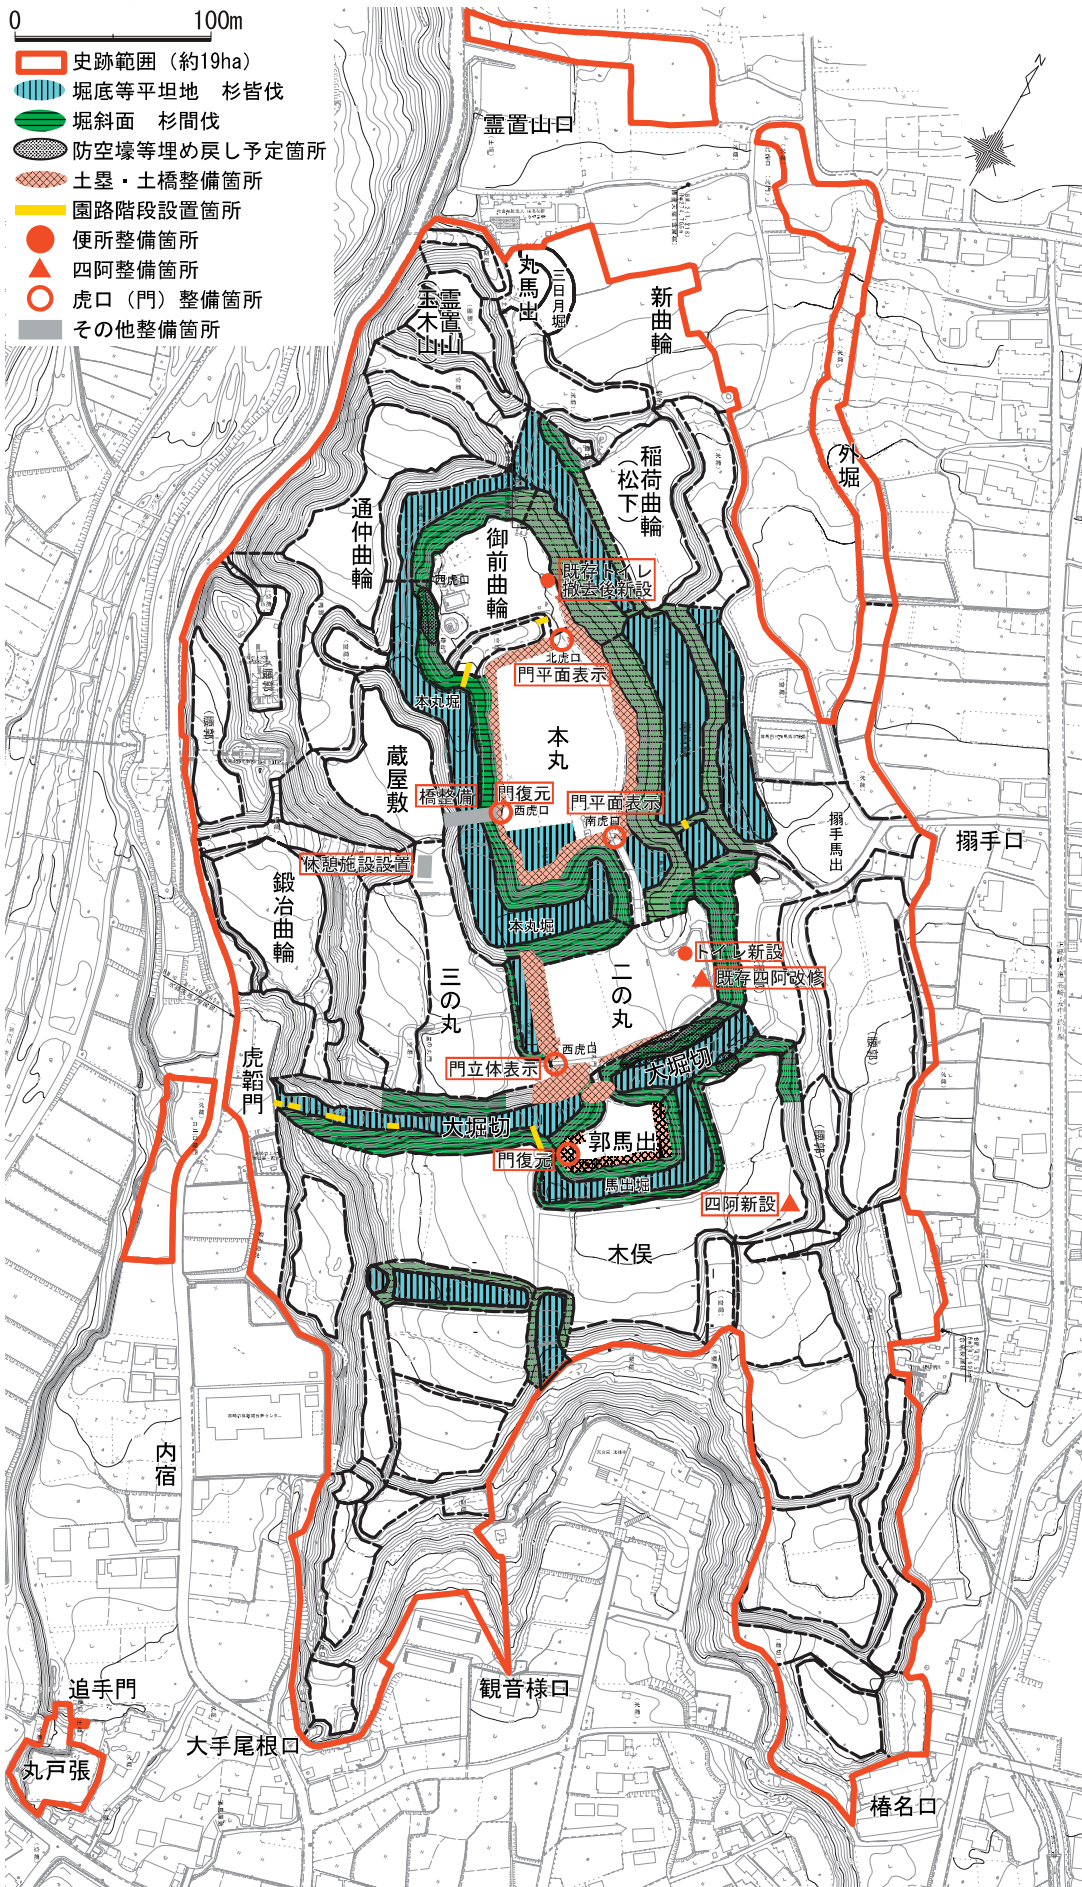

箕輪城跡短期整備（平成 23～32 年度）計画図



箕輪城跡平成 23・24 年度樹木伐採位置図



本丸南堀の伐採前



本丸南堀の伐採後

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

|       |           |            |                       |
|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 事務事業名 | 上水道管網整備事業 | 所属<br>(支所) | 水道局工務課<br>(箕郷上下水道事務所) |
| 実施期間  | 全期        | 事業の種類      | ハード事業                 |

### 【事業概要】

|                     |                         |                                      |  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 対象(誰を、何を)           | 配水管                     |                                      |  |
| 実施目的(どういった状態に)      | 具体的手段(どういった手段で)         | その他(全体計画等)                           |  |
| 効率的で災害に強い給水体制を確立する。 | 箕郷地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。 | 箕郷地域の石綿セメント管残存延長<br>(平成23年度末 4,965m) |  |

### 【年度別事業計画】






| 平成22年度                 | 平成23年度                 | 平成24年度                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 石綿セメント管等の布設替<br>1,700m | 石綿セメント管等の布設替<br>1,500m | 石綿セメント管等の布設替<br>1,400m |

### 【年度別推進状況】

| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 23年度事業実績  |
|------------|-----------|-----------|---|
| 合計         | 85,500    | 73,536    | 管網整備事業<br>・舗装復旧工事      A= 726.8㎡<br>・送水管布設工事      L= 606.1m<br>・配水管布設替工事      L= 625.7m |
| 国          | —         | —         |   |
| 県          | —         | —         |   |
| 地方債        | 40,200    | 28,010    |   |
| その他        | —         | —         |   |
| 一般         | 45,300    | 45,526    |   |
| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 24年度事業内容  |
| 合計         | 72,256    | —         | 管網整備事業<br>・舗装復旧工事      A=1,170㎡<br>・配水管布設替工事      L=1,100m                              |
| 国          | —         | —         |   |
| 県          | —         | —         |   |
| 地方債        | 28,900    | —         |   |
| その他        | —         | —         |   |
| 一般         | 43,356    | —         |   |
| 25年度以降事業予定 |           |           |   |
|            |           |           |   |



# 上水道管網整備事業

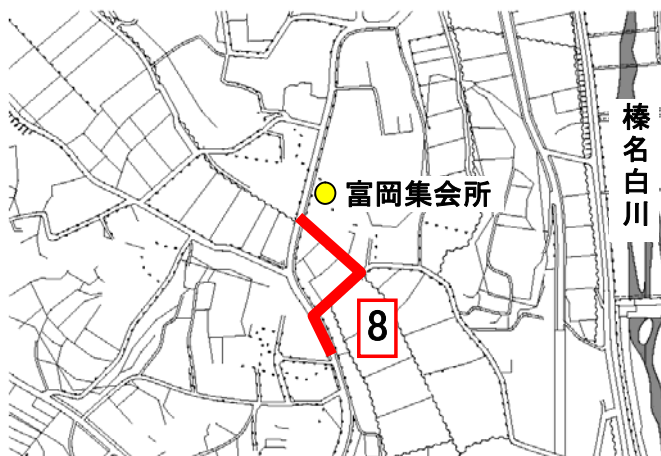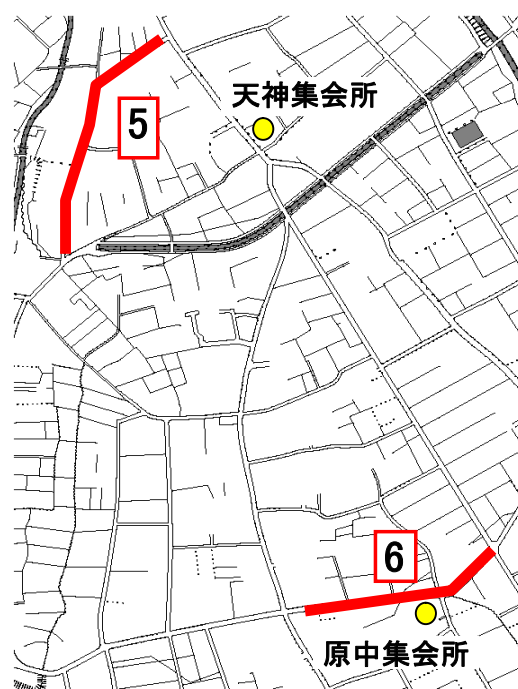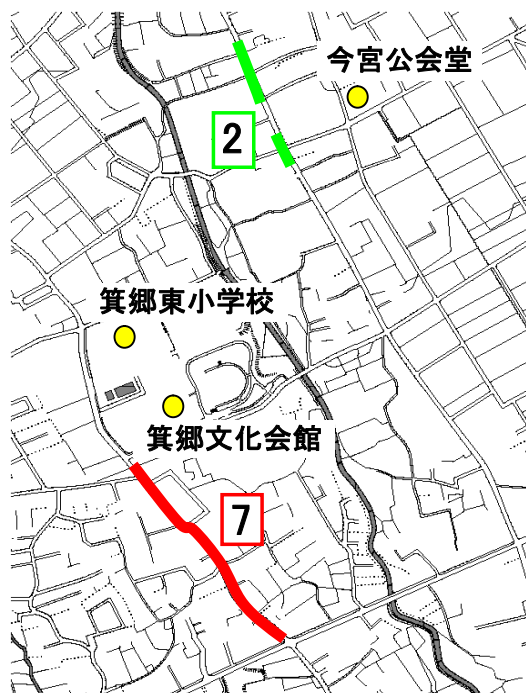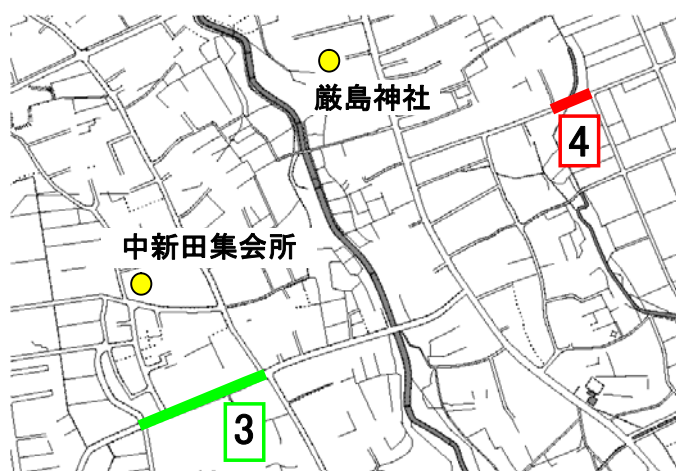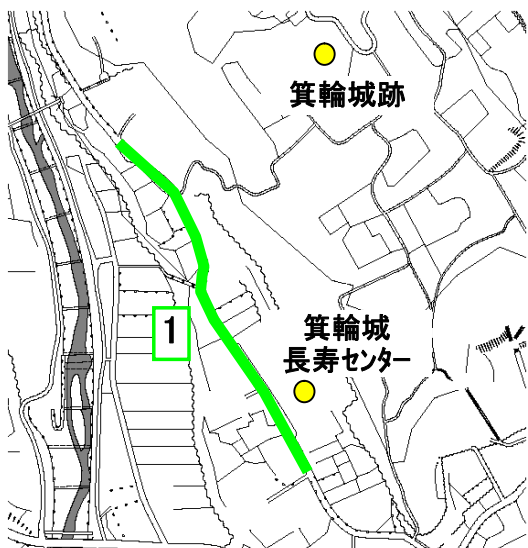

| 凡例       |  |
|----------|--|
| 舗装復旧工事   |  |
| 配水管布設替工事 |  |

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| 1 | 西明屋・舗装復旧  | A=500㎡ |
| 2 | 柏木沢・舗装復旧  | A=350㎡ |
| 3 | 生原・舗装復旧   | A=320㎡ |
| 4 | 生原・配水管布設替 | L= 30m |
| 5 | 矢原・配水管布設替 | L=300m |
| 6 | 矢原・配水管布設替 | L=240m |
| 7 | 生原・配水管布設替 | L=320m |
| 8 | 富岡・配水管布設替 | L=210m |

## 第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成24年3月31日現在

|       |          |            |                         |
|-------|----------|------------|-------------------------|
| 事務事業名 | 汚水管渠整備事業 | 所属<br>(支所) | 下水道局 整備課<br>(箕郷上下水道事務所) |
| 実施期間  | 全期       | 事業の種類      | ハード事業                   |

### 【事業概要】

|                        |                 |  |  |
|------------------------|-----------------|--|--|
| 対象(誰を、何を)              | 汚水管渠            |  |  |
| 実施目的(どういった状態に)         | 具体的手段(どういった手段で) | その他(全体計画等)                               |  |
| 快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。 | 計画的に下水道管渠を整備する。 | 平成23年度末<br>整備面積 209.14ha<br>整備延長 41.96km |  |



### 【年度別事業計画】

| 平成22年度                          | 平成23年度                          | 平成24年度                          |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 下水道管渠の整備<br>面積 4ha<br>延長 1,841m | 下水道管渠の整備<br>面積 4ha<br>延長 1,841m | 下水道管渠の整備<br>面積 4ha<br>延長 1,841m |

### 【年度別推進状況】

| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 23年度事業実績   |
|------------|-----------|-----------|--|
| 合計         | 92,254    | 71,667    | 実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。<br>下水道築造工事<br>管渠布設 L=701.10m |
| 国          | 37,530    | 33,763    |  |
| 県          | 0         | 60        |  |
| 地方債        | 27,300    | 26,644    |  |
| その他        | 12,000    | 11,200    |  |
| 一般         | 15,424    | 0         |  |
| 区分<br>(千円) | 当初<br>予算額 | 決算<br>見込額 | 24年度事業内容   |
| 合計         | 80,577    | —         | 下水道築造工事発注予定<br>管渠布設 L=517.9m<br>舗装復旧 A=3,655㎡                      |
| 国          | 30,075    | —         |  |
| 県          | 600       | —         |  |
| 地方債        | 29,300    | —         |  |
| その他        | 8,000     | —         |  |
| 一般         | 12,602    | —         |  |
| 25年度以降事業予定 |           |           |  |
|            |           |           |  |

# 污水管渠整備事業

| 凡例     |   |
|--------|---|
| 舗装復旧工事 |  |
| 管渠布設工事 |  |

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| 1 | 東明屋・舗装復旧   | A=1,970㎡ |
| 2 | 矢原、生原・舗装復旧 | A=1,020㎡ |
| 3 | 生原・舗装復旧    | A= 665㎡  |
| 4 | 東明屋・管渠布設   | L= 36m   |
| 5 | 東明屋・管渠布設   | L= 90.9m |
| 6 | 生原・管渠布設    | L=226m   |
| 7 | 下芝・管渠布設    | L=165m   |

