

第 5 次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

ページ	部門	事 務 事 業 名	担当課名 ()内は群馬支所担当課
1	教育・文化	生涯学習センター（仮称）建設事業	社会教育課 （群馬教育課）
2	教育・文化	北谷遺跡保存整備事業	文化財保護課 （群馬教育課）
3	教育・文化	群馬地域運動場（仮称）整備事業	スポーツ課 （群馬教育課）
4	環境・安全	北部公園（仮称）整備事業	公園緑地課 （建設課）
5	環境・安全	三ツ寺公園整備事業	公園緑地課 （建設課）
6	都市・建設	群馬中央第二土地区画整理事業	区画整理 1 課 （区画整理事務所）
7	都市・建設	菅谷高畑土地区画整理事業	区画整理 1 課 （区画整理事務所）
8	都市・建設	上水道管網整備事業（石綿セメント管の付設替）	水道局工務課 （上下水道事務所）
9	都市・建設	汚水管渠整備事業	下水道局整備課 （上下水道事務所）

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	生涯学習センター(仮称)建設事業	所属(支所)	教育部社会教育課 (群馬教育課)
実施期間	平成18年～平成23年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	社会教育施設(生涯学習センター)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
現在の群馬公民館は、昭和48年に建設され、築33年が経過し老朽化している。公民館に変わる施設を建設し、より一層の地域住民の生涯学習の向上の場としたい。	旧中央中学校の跡地に、群馬地区の生涯学習センター(仮称)を建設する。	平成19年建設委員会設立 基本構想 平成20年基本構想 平成21年基本設計 実施設計 平成22年本体工事 平成23年本体工事・完成	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
基本構想	基本構想 基本設計	本体工事	本体工事 完 成	開 館

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計			建設検討委員会及び専門部会設置 基本構想
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	5,000	4,620	基本構想策定委託
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	5,000	4,620	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	67,966		基本設計・測量設計 地質調査 柔剣道場解体 用地買収
国	—	—	
県	—	—	
地方債	38,200		
その他	—	—	
一般	29,766		

生涯学習センター（仮称）位置図



300m

1/6000

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	北谷遺跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (群馬教育課)
実施期間	平成12年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡北谷遺跡(平成17年7月14日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である北谷遺跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う、	全体面積 4.2ha 平成12年度～15年度 範囲確認発掘調査 平成16年度 調査報告書刊行 平成18年度 説明板設置 平成19年度までの事業進捗率2%	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
史跡整備計画(保存管理計画)策定準備 2次指定(住宅地)に向け、文化庁等との協議	史跡整備計画(保存管理計画)策定 史跡整備用地買収準備 保存整備委員会発足	史跡地の2次指定 史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催	史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催	史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	1,809	246	・説明板設置場所の管理(除草等)(6月・7月・9月)
国	0	0	
県	0	0	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	1,809	246	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	409	278	・説明板設置場所の管理(除草等)(6月・8月・9月) ・文化庁等との協議
国	0	0	
県	0	0	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	409	278	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容及び予算詳細
合計	409		・説明板設置場所の管理(除草等) ・保存管理計画に向けた下準備 ・二次指定に向けて文化庁等との協議
国	0		
県	0		
地方債	0		
その他	0		
一般	409		

北谷遺跡指定範囲

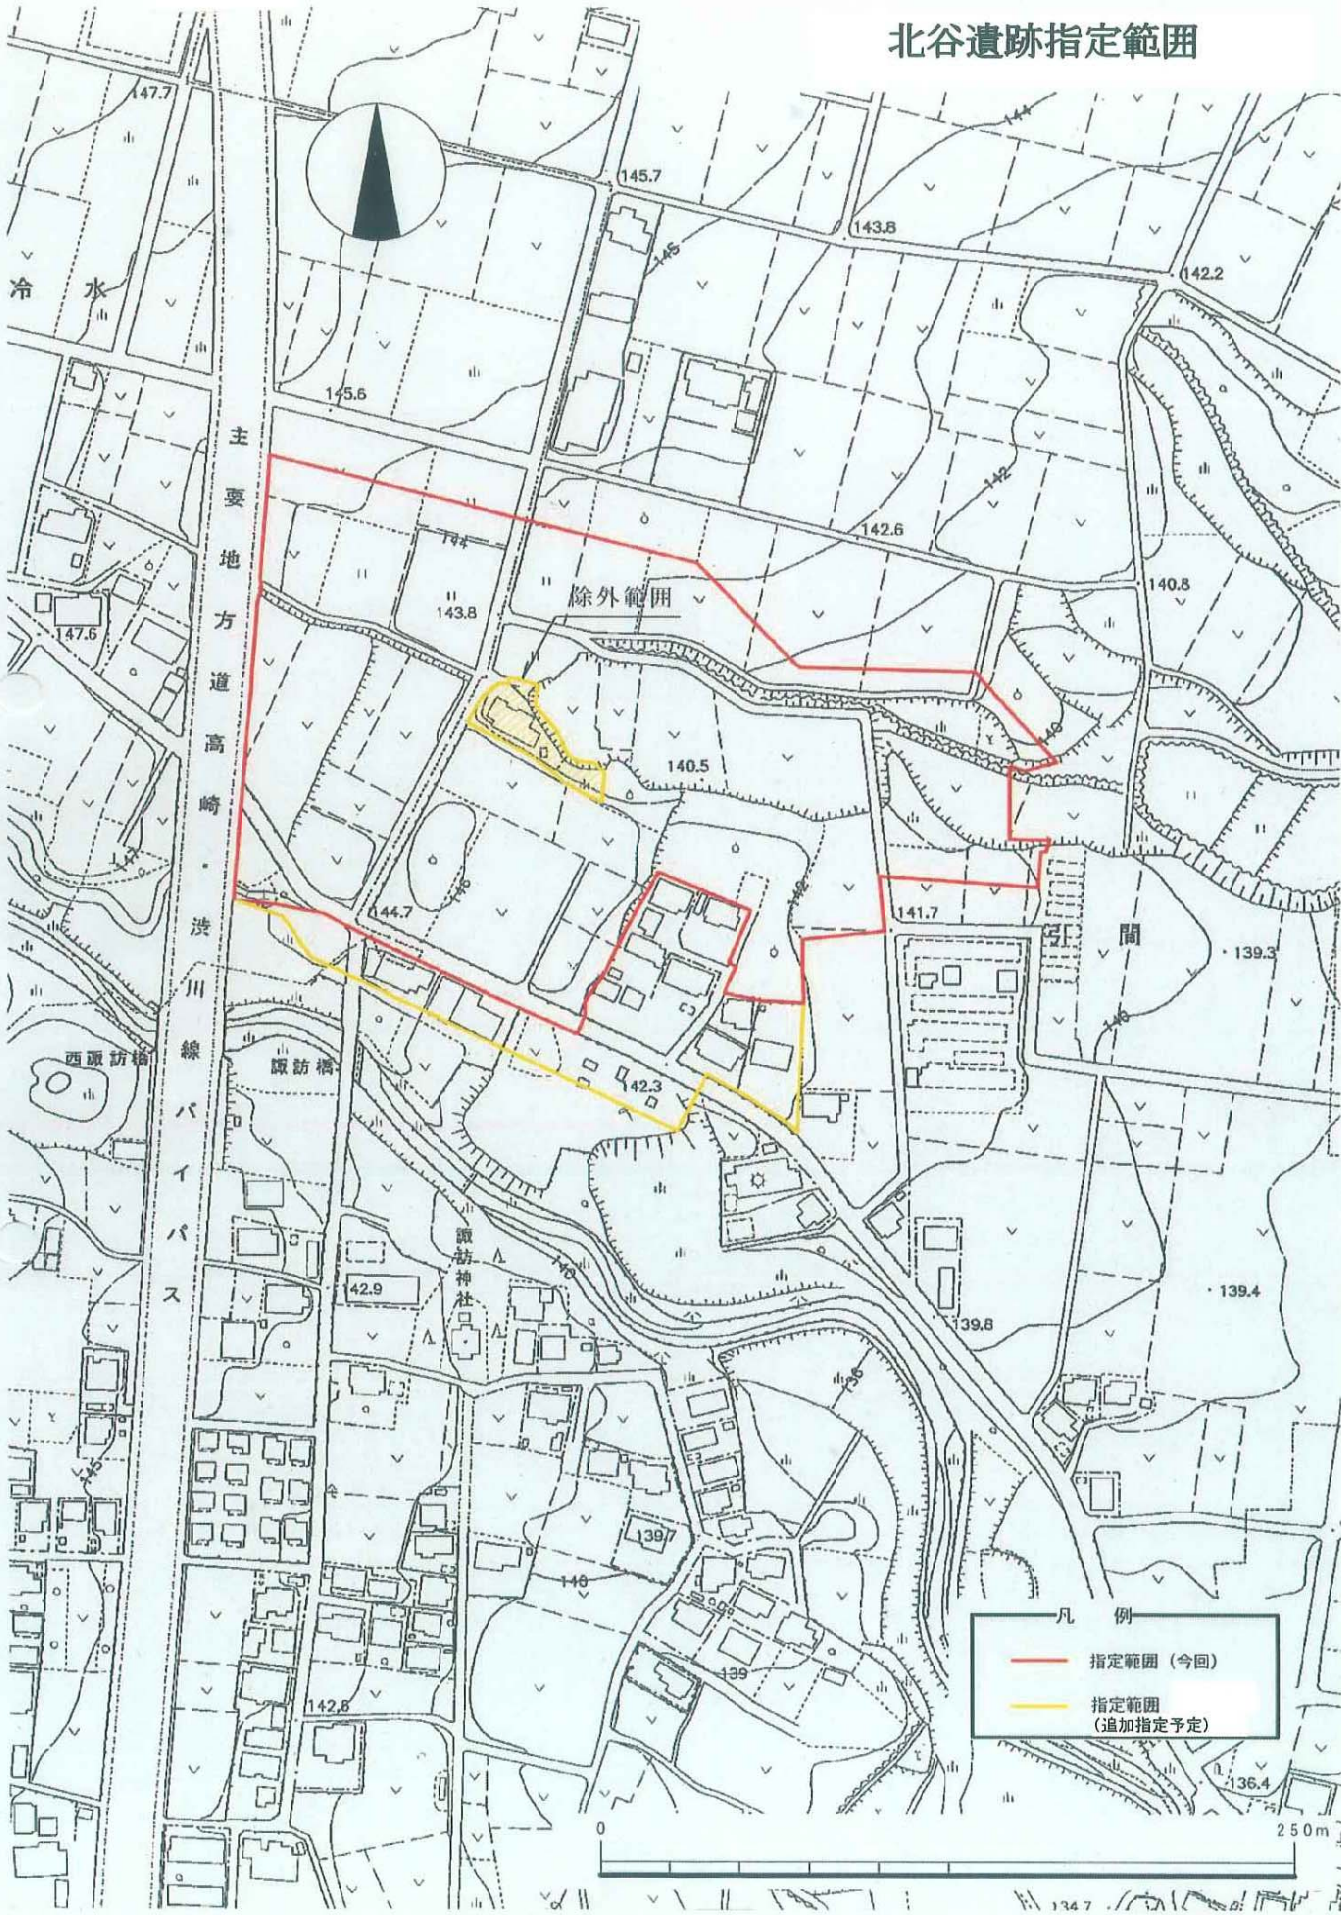

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	群馬地域運動場(仮称)整備事業	所属(支所)	教育部スポーツ課 (群馬教育課)
実施期間	平成18年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	社会体育施設(野球場・多目的運動場)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
生涯スポーツによる健康増進及び体育施設の充実を計るため新設野球場を建設する。併設施設として多目的運動場を整備する。	建設検討委員会を設置後、野球場の規模や構造等を確定させる。地権者の了承により、用地を買収し、建設工事を進める。	平成19年候補地決定 平成20年測量調査・事業認定取得・用地買収・用地買収・基本設計 平成21年用地買収・実施設計・建設工事 平成22年建設工事・完成	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
測量調査・事業認定取得・用地買収・基本設計・埋蔵文化財調査	用地買収 埋蔵文化財調査 実施設計 建設工事	建設工事 完 成		

【年度別推進状況】

区分(千円)	当初予算額	決算額	19年度事業実績
合計			野球場建設場所の決定 地権者説明会
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般			
区分(千円)	当初予算額	決算見込額	20年度事業内容
合計	475,020	24,256	用地測量(公園用地含む) 事業認定の取得及び基本設計 不動産鑑定
国	—	—	
県	—	—	
地方債	434,500	0	
その他	—	—	
一般	40,520	24,256	
区分(千円)	当初予算額	決算見込額	21年度事業計画
合計	911,321		用地買収(公園用地含) 実施設計 地質調査
国	—	—	
県	—	—	
地方債	865,700		
その他	—	—	
一般	45,621		

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	北部公園(仮称)整備事業	所属(支所)	都市整備部公園緑地課 (群馬支所建設課)
実施期間	平成20年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	公園施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
群馬地域北部に自然環境と調和した公園、散歩や休息、運動施設も含めた総合公園とする。	なだらかな丘陵地の立地条件を利用し、野球場、中規模運動広場と一体的な公園として整備する。	野球場、運動広場を併設。	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
全体整備計画 用地買収	群馬地域運動場(仮称)と同一事業となる			

【年度別推進状況】

区分(千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	—	—	建設場所の選定 地権者説明会
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
区分(千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	—	—	全体整備計画 用地買収(野球場含む) 群馬地域運動場(仮称)と一体整備予定
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
区分(千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	—	—	用地買収(野球場含む) 群馬地域運動場(仮称)と一体整備→事業認定も同一事業認定で申請 以後は、群馬地域運動場(仮称)の名称とする
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	三ツ寺公園整備事業	所属 (支所)	都市整備部公園緑地課 (群馬支所建設課)
実施期間	平成5年度～平成21年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】


対象(誰を、何を)	公園施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市民が1日ゆったり憩える総合公園を整備する。市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供すること。	親水エリアをメインとした1期整備に引き続き、運動・遊戯広場をメインにした2期分を隣接する北部地区に整備する。	全体整備面積：10.8ha 平成5年度～平成21年度 1期整備(完成)：6.0ha 2期整備(継続)：4.8ha	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
造成・遊具施設工事	運動施設工事			

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	267,000	279,564	用地買収 (10,822.7 m ²)
国	89,000	93,188	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	178,000	186,376	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	207,000	205,452	設計委託、測量・ 用地造成工事・遊具設置工事・多目的広場設置工事 完成予定 平成21年3月17日まで
国	100,000	99,118	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	107,000	106,334	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	200,000	—	ソフトボール場設置、大型複合遊具設置、その他
国	100,000	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	100,000	—	

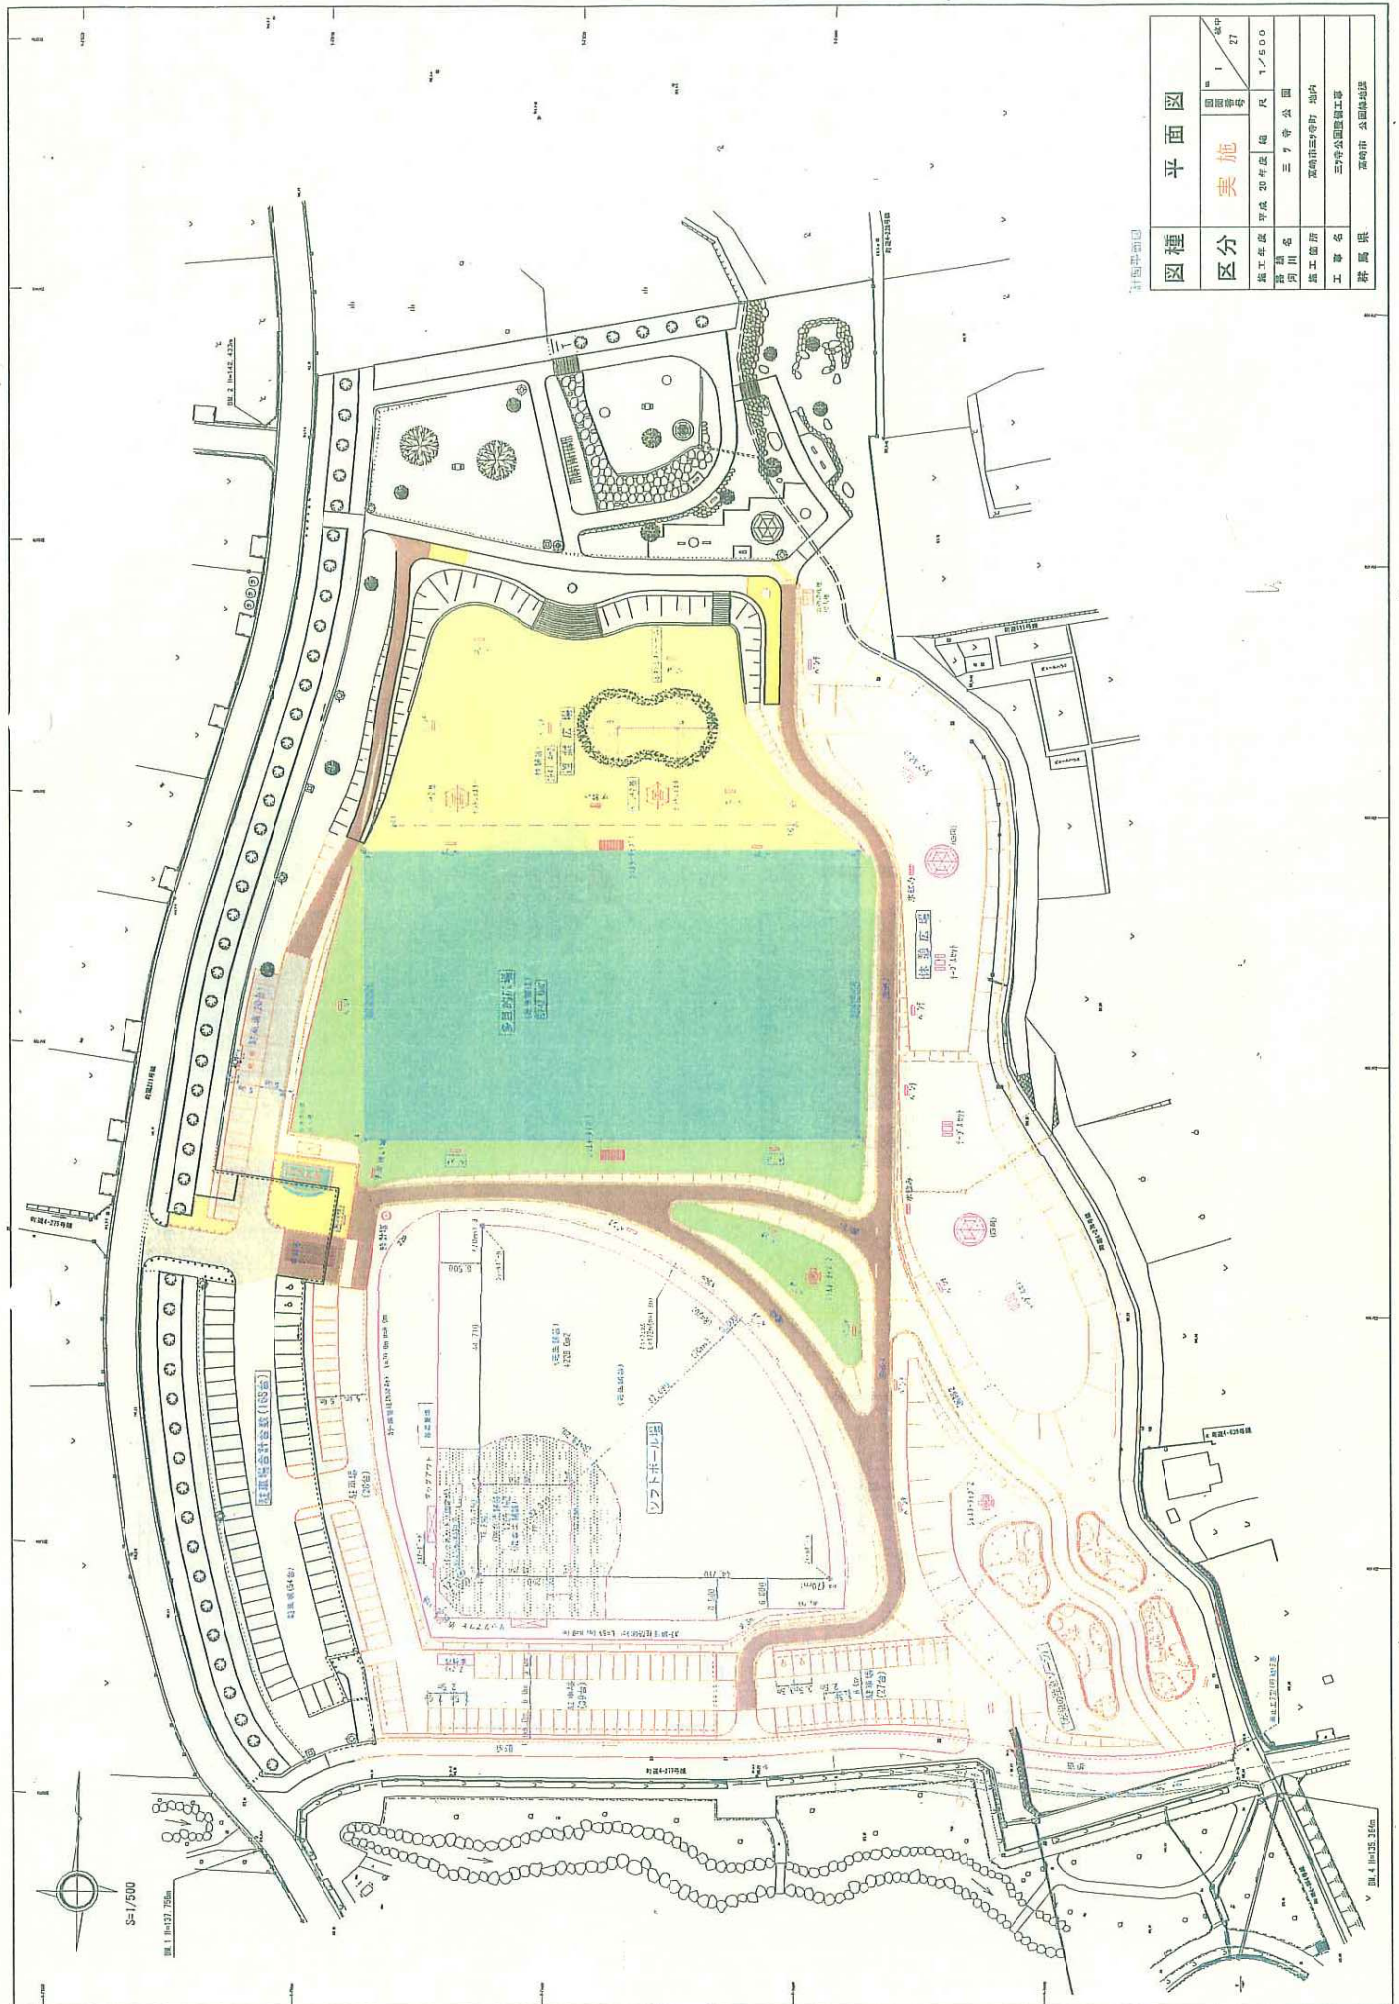

計画平面図

図種		平面図	
区分	美施	図層番号	1/27
竣工年度	平成 20 年度	図 尺	1/2500
所在地	三ノ宮公園	竣工場所	京都市三ノ宮区 市内
工事名	三ノ宮公園緑地等	設計者	京都市公園緑地課
建築業	京都市公園緑地課		

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	群馬中央第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理1課 (群馬区画整理事務所)
実施期間	平成9年度～平成35年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	群馬中央第二土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】 72.02ha 【総事業費】 12,900百万円 【事業概要】 都市計画道路4,993m、区画道路13,098m 物件移転606戸 H19末進捗率 12.1%	

【年度別事業計画】


平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他




【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績	
合計	364,693	258,908	・道路築造工事外	10件
国	111,200	75,161	・建物調査委託外	9件
県		—	・建物移転補償物件外	12件
地方債	11,800	11,200		
その他		4,209		
一般	241,693	168,338		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容	
合計	388,185	299,485	《3月19日現在》	
国	140,350	103,200	・道路築造工事外	6件完成
県	—	—	・建物調査委託外	9件完成
地方債	5,500	16,225	・建物移転補償物件外	7件完成
その他	—	—		2件施工中 3月末完成予定
一般	242,335	180,060		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画	
合計	347,698	—	・道路築造工事外	6件
国	121,650	—	・建物調査委託外	10件
県	—	—	・建物移転補償物件外	10件
地方債	11,800	—		
その他	—	—		
一般	214,248	—		

中央第二土地区画整理事業 位置図

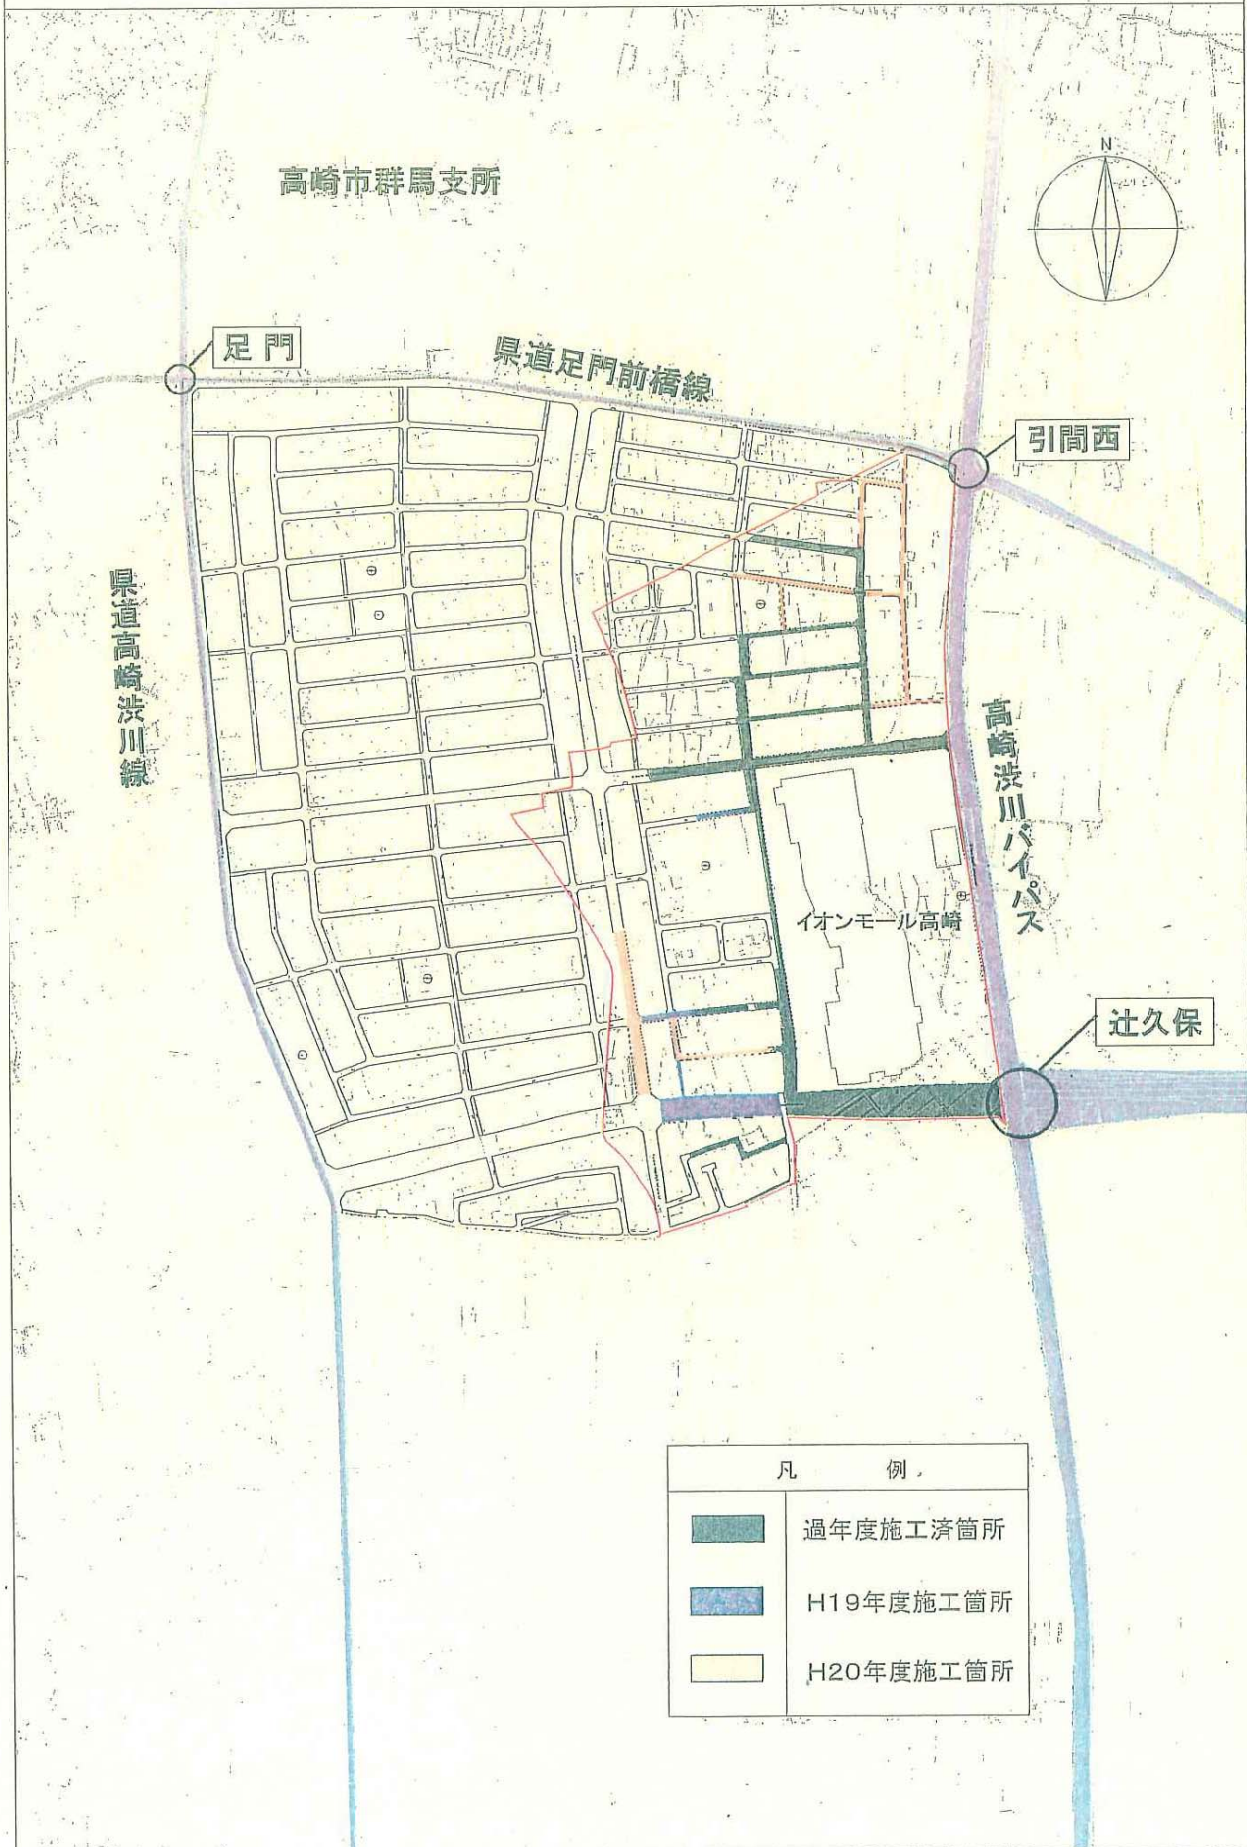1:8000



凡 例	
	過年度施工箇所
	H19年度施工箇所
	H20年度施工箇所

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	菅谷高畑土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理1課 (群馬区画整理事務所)
実施期間	平成9年度～平成25年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	菅谷高畑土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】 21.89ha 【総事業費】 3,550百万円 【事業概要】 都市計画道路1,486m、区画道路4,845m 物件移転118戸 H19末進捗率 50.00%	

【年度別事業計画】


平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績		
合計	103,086	87,948	・道路築造工事外	9件	
国			・建物調査委託外	9件	
県			・建物移転補償物件外	16件	
地方債	10,000	10,000			
その他					
一般	93,086	77,948			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容		
合計	77,410	77,410	《3月19日現在》		
国	—	—	・道路築造工事外	3件完成	
県	—	—	・建物調査委託外	7件完成	
地方債	6,300	6,300	・建物移転補償物件	4件完成	1件施工中 21年度繰越予定
その他	—	—			
一般	71,110	71,110			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画		
合計	96,064	—	・道路築造工事外	4件	
国	—	—	・建物調査委託外	5件	
県	—	—	・建物移転補償物件外	7件	
地方債	27,000	—			
その他	—	—			
一般	69,064	—			

菅谷高畑土地区画整理事業 位置図

1:6000

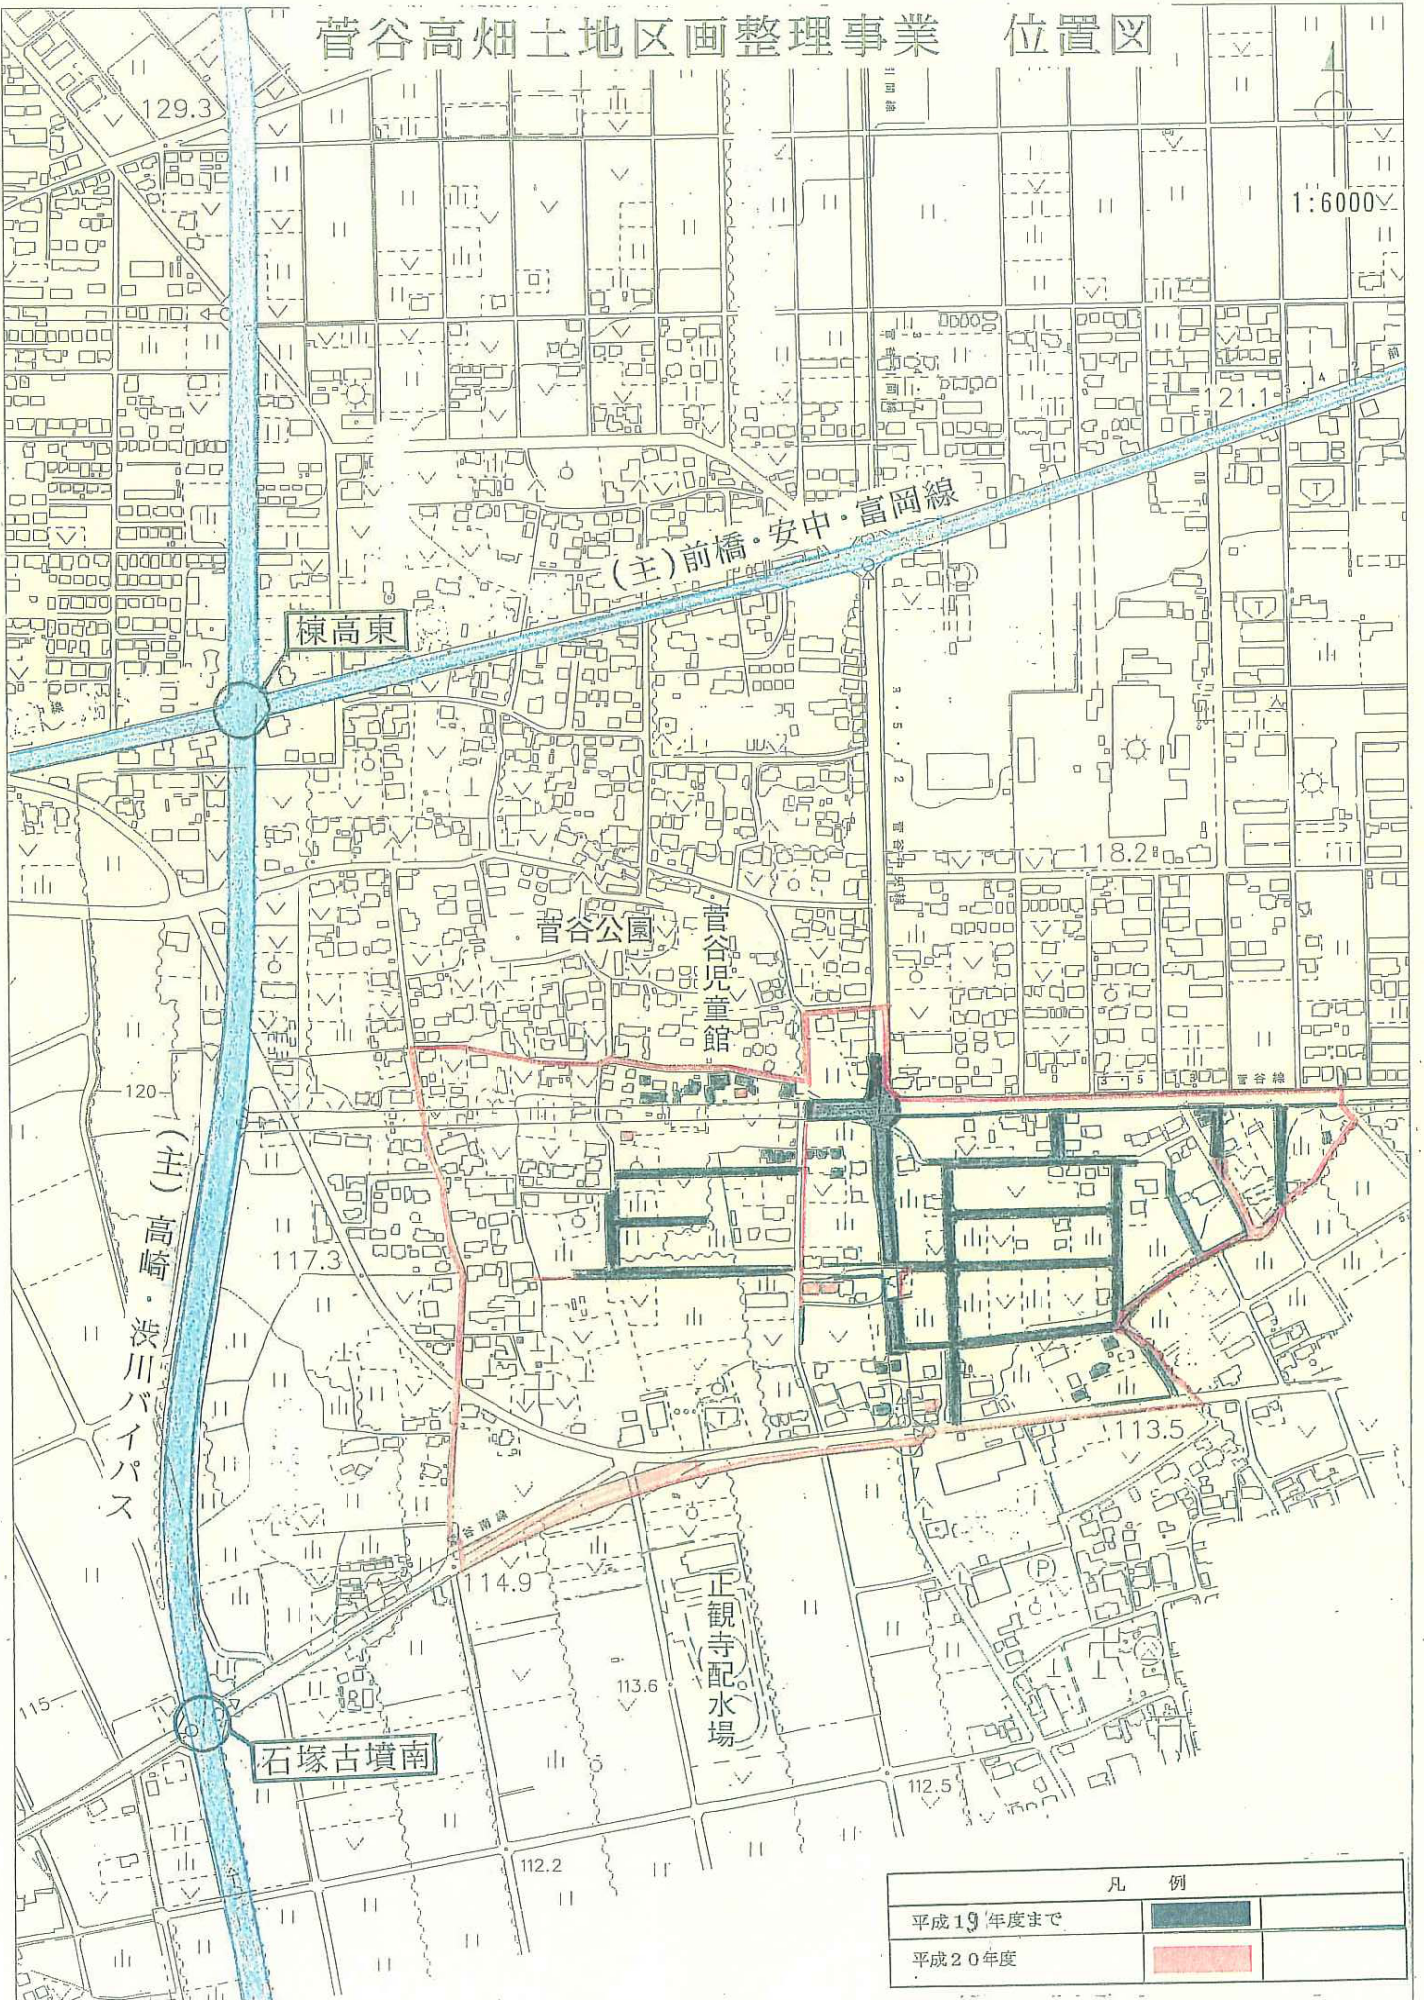

凡 例	
平成19年度まで	
平成20年度	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	群馬地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	群馬地域の 石綿セメント管残存延長 (平成19年度末 74,445m)	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
石綿セメント管等の 布設替 2,500m	石綿セメント管等の 布設替 2,600m	石綿セメント管等の 布設替 2,850m	石綿セメント管等の布 設替 2,850m	石綿セメント管等の 布設替 2,850m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	103,372	96,052	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 300.0㎡ ・配水管布設工事 L = 339.2m ・配水管布設替工事 L = 2,191.0m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	103,372	96,052	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	186,603	222,830	<執行実績> 管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 2,597.5㎡ ・配水管布設替工事 L = 4,150.5m 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	186,603	222,830	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	179,458	—	管網整備事業を計画的に実施する。 ・配水管布設替工事 L = 4,680m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	179,458	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

事務事業名	汚水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	汚水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成19年度末 整備面積 259.82ha 整備延長 65.13km	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
下水道管渠の整備 面積 2.94ha 延長 1,350m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	19年度事業実績
合計	192,750	168,388	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 群馬地域 4,007m
国	75,000	75,000	
県	—	—	
地方債	86,700	49,500	
その他	13,500	32,760	
一般	17,550	11,128	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業内容
合計	118,600	113,967	≪3月19日現在≫ 下水道築造工事発注済 群馬地域 1,215.8m 下水道築造工事発注予定 群馬地域 0m 計 1,215.8m
国	30,000	32,000	
県	—	—	
地方債	44,000	27,300	
その他	20,070	35,000	
一般	24,530	19,667	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業計画
合計	222,640	—	下水道築造工事発注予定 群馬地域 2,190m
国	87,000	—	
県	—	—	
地方債	101,300	—	
その他	24,300	—	
一般	10,040	—	
