

新市建設計画実施計画事業推進状況

= 目 次 =

1 . 倉渕中学校施設整備事業	1 ・ 2 ページ
2 . 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）.....	3 ・ 4 ページ
3 . 小栗の里整備事業	5 ・ 6 ページ
4 . 倉渕・ふるさと住宅建設事業	7 ・ 8 ページ
5 . 高崎都市内地域連携事業	9 ・ 10 ページ

新市建設計画実施計画事業推進状況

= 目 次 =

1 . 倉渕中学校施設整備事業	1 ・ 2 ページ
2 . 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）.....	3 ・ 4 ページ
3 . 小栗の里整備事業	5 ・ 6 ページ
4 . 倉渕・ふるさと住宅建設事業	7 ・ 8 ページ
5 . 高崎都市内地域連携事業	9 ・ 10 ページ

1. 倉淵中学校施設整備事業経過報告

実施期間		平成15年度～平成19年度			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
	屋体耐力度調査 H13 校舎改築設計工事 H15～H17	屋内運動場改築設計委託	屋内運動場改築工事		校舎改築設計工事 H15～H17 屋内運動場改築設計委託 H18 屋内運動場改築工事 H18	
当初計画額	財源	国庫支出金		67,366		67,366
		県支出金				
		地方債		121,200		121,200
		その他				
		一般財源	12,544	191,934		204,478
合計(千円)		12,544	380,500		393,044	
《18年度執行状況》						
(6月1日現在の状況及び課題) ・事業実施にあたり、関係各課と建設位置等の事業内容について調整中である。						
(今後の予定及び方針) ・小学校統廃合校の中学校隣接地建設を検討するなかで、屋内運動場の建設位置等を決定し、設計に着手したい。						
(9月7日現在の状況及び課題) ・関係各課との調整を引き続き行っている。						
(今後の予定及び方針) ・小学校統廃合校の中学校隣接地建設を検討するなかで、屋内運動場の建設位置等を決定し、設計に着手したい。						

倉淵中学校 配置図



2. 自然公園整備事業（大規模開発跡地整備構想）経過報告


実施期間		平成18年度～平成20年度			所管課名	公園緑地課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
		地元説明会	基本構想の策定 施設整備	施設整備	地元説明会 H18 基本構想・施設整備 H19～H20	
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債		50,000	50,000	100,000
		その他				
		一般財源	200			200
合計（千円）		200	50,000	50,000	100,200	
《18年度執行状況》						
<p>（6月1日現在の状況及び課題） 予定なし</p> <p>（今後の予定及び方針） 地元説明会（時期未定）</p>						
<p>（9月7日現在の状況及び課題） 予定なし</p> <p>（今後の予定及び方針） 地元説明会（時期未定）</p>						

市界	町界	村界	大字界	郡界	府界
●	○	△	□	■	■
市界	町界	村界	大字界	郡界	府界
●	○	△	□	■	■

- 高崎市 (内国府中郡区域外) 114町 612,904㎡ (109町 501,278㎡)
- 高崎市 (地上部のみ) 37町 100,024㎡
- 高崎市 (地下部) 4町 3,891㎡ (土地の内敷)
- 68町 60,712.5㎡
- 高崎市 (地下部) 4町 3,103㎡

- 陸境により取得済
- 陸境対象外で個人名義のもの

- 県庁センター一級地盤
- 国府中郡
- 高崎市 (国府中郡区域外) 5町 11,625㎡

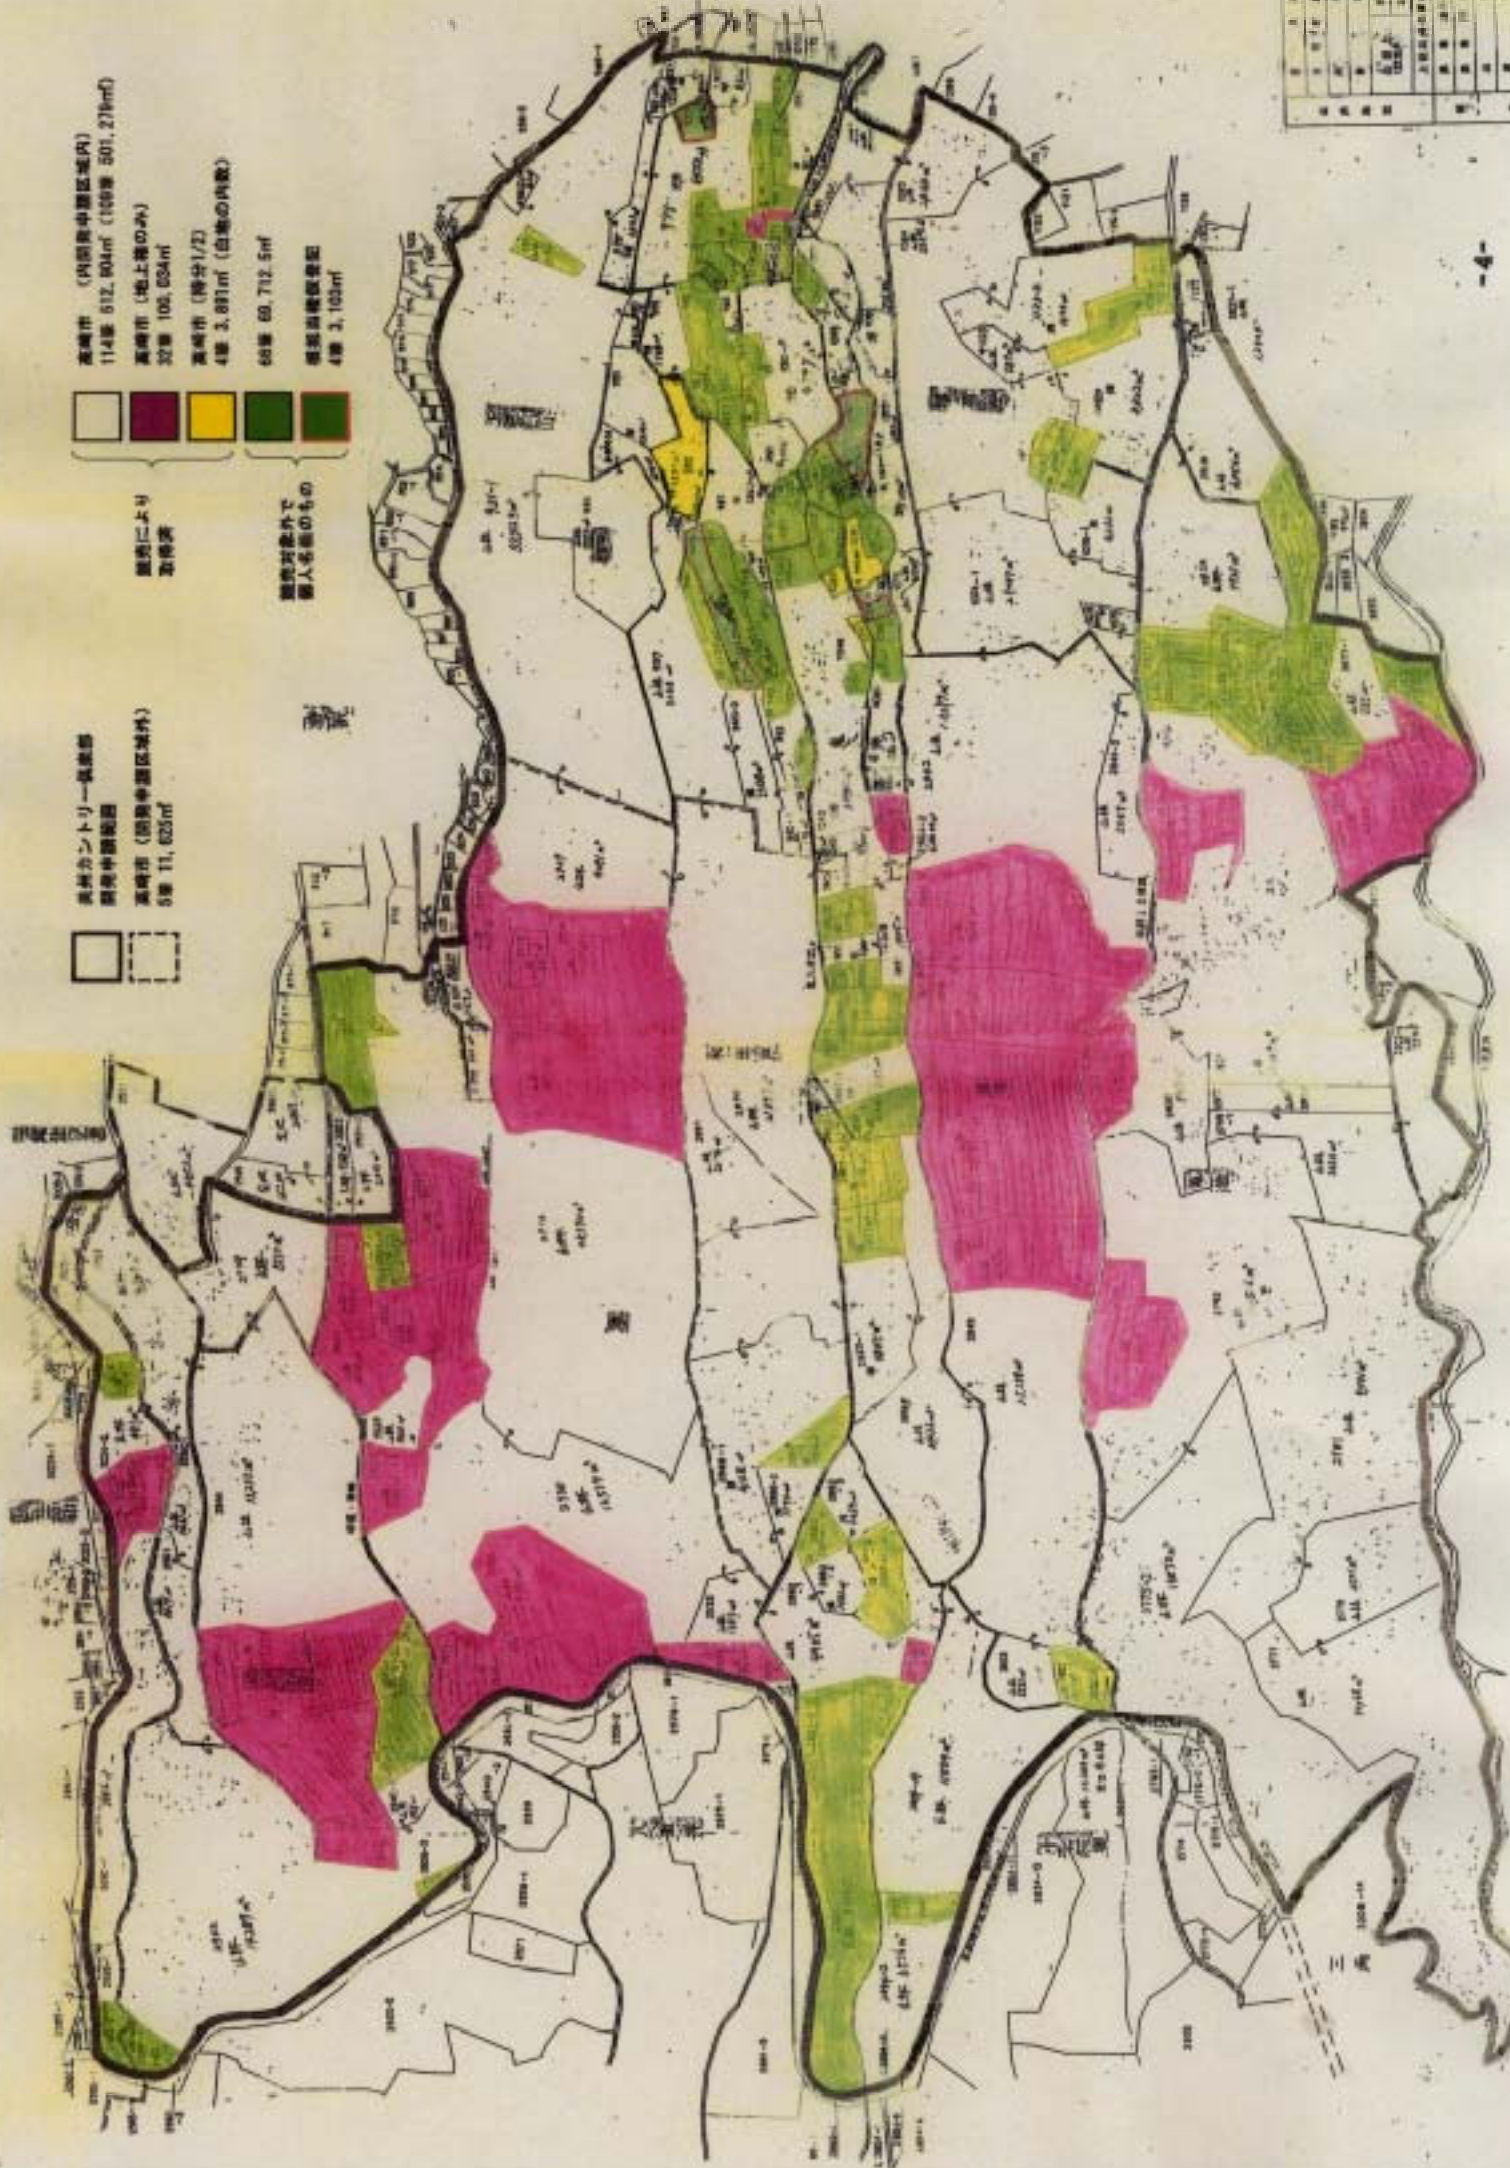

三島

3. 小栗の里整備事業経過報告

実施期間		平成18年度～平成22年度			所管課名	倉淵支所	地域振興課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画		
	審議会(4回)	審議会 事業構想の策定	用地買収 5000㎡ 詳細設計の作成	道の駅の整備 ・展示コーナー ・特産品コーナー ・休憩所(食堂) 斬首地整備	平成18年度 基本 構想 平成19年度 用地 買収(5,000㎡) 平成20～21年度 道の駅の整備(展示 コーナー、特産品販 売コーナー、休憩所) 斬首地整備		
当初計画額	財源	国庫支出金					
		県支出金					
		地方債		60,000	150,000	210,000	
		その他					
		一般財源	1,929	500	500	2,929	
合計(千円)		1,929	60,500	150,500	212,929		
《18年度執行状況》							
<p>(6月1日現在の状況及び課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成16年10月小栗の里づくり事業について、倉淵村小栗の里整備審議会より答申 平成16年12月から平成17年3月にかけて土地関係者の意向調査を実施 <p>(今後の予定及び方針)</p> <ul style="list-style-type: none"> 審議会の設置及び会議の開催 事業構想の検討、策定 							
<p>(9月7日現在の状況及び課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成18年6月19日から平成18年8月24日までに計4回の担当部署における打合せ会議を開催し、小栗の里整備推進委員候補者及び事業の方向性について検討を行う。 <p>(今後の予定及び方針)</p> <ul style="list-style-type: none"> 小栗の里整備推進委員会設置要綱の制定 小栗の里整備推進委員の委嘱 小栗の里整備推進委員会会議の開催(3回) 小栗の里整備事業の基本構想の策定 							

小栗上野介史跡位置図(小栗の里整備事業)



4. 倉渕・ふるさと住宅建設事業経過報告

実施期間			所管課名			
平成20年・21年			建設部住宅課			
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画	
			設計	土地取得造成 1戸建6件 (過疎債の場合)	20年度 6軒 21年度 6軒 (過疎債の場合)	
当初計画額	財源	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債			148,100	148,100
		その他				
		一般財源			1,900	1,900
合計(千円)				150,000	150,000	

《18年度執行状況》

(6月1日現在の状況及び課題)

- ・倉渕支所と土地分譲・集合住宅・ふるさと住宅の3つの懸案事項を考慮しながら建設場所の検討を行っている。

(今後の予定及び方針)

- ・18年度後半から19年度に調整打ち合わせの予定。

(9月7日現在の状況及び課題)

- ・8月25日の調整会議において、候補予定地と20年度・21年度の建設予定の調整と確認
- ・給水計画・排水計画に問題点が生じている為、現状の調査を倉渕支所に依頼

(今後の予定及び方針)

- ・給水計画のうち配水管の管径と系統及び排水計画の水路断面と排水経路の調査・計画経路作成・予算について検討・調整していく。

高崎市倉渕町三ノ倉上原地区
ふるさと住宅建設予定地案内図



5. 高崎都市内地域連携事業経過報告

実施期間		平成18年度～19年度		所管課名	都市計画課
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	<ul style="list-style-type: none"> 「はまゆう山荘」改修設計 体験交流事業及びまちめぐり交流事業等 		<ul style="list-style-type: none"> 「はまゆう山荘」改修工事及び天然温泉化 体験交流事業及びまちめぐり交流事業等 		
当初計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	財源	項目			
		国庫支出金	2,000	40,000	
		県支出金			
		地方債			
		その他			
一般財源	4,013	80,000			
合計(千円)		6,013	120,000		
《18年度執行状況》					
<p>(6月1日現在の状況及び課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> 体験交流事業等開催回数(下記のとおり6月25日予定) <p>(今後の予定及び方針)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6月23日 平成18年度第1回地域連携協議会(倉渕支所にて開催) 6月25日 交流事業として、物産PRイベント実施(足湯) 会場は高崎地域(市営中央駐車場敷地内) 方針 課題となっている高崎・倉渕両地域の距離的な隔たりによる地域の一体性の確保のため、お互いの地域の特性や個性に理解を深めてもらうよう、イベント等を通じ両地域の交流、提携を推進する。 また、倉渕地域における交流拠点として、「はまゆう山荘」を改修及び天然温泉化し、市民の交流、憩いの場としての整備を図る。 					
<p>(9月7日現在の状況及び課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6月23日 平成18年度第1回地域連携協議会開催(倉渕支所) 6月25日 交流事業として、倉渕の物産PRイベント実施(足湯他) 会場：高崎地域(市営中央駐車場敷地内・200人) 8月5日 交流事業として、倉渕の子供たちを神輿の担ぎ手として高崎まつりに招待 会場：高崎地域・30人 8月20日 交流事業として、“ものづくり交流 in くらぶち”開催 会場：倉渕地域・65人 					

(今後の予定及び方針)

- ・ 11月下旬 交流事業として、“郷のくらし体験交流”実施
会場：倉渕地域・40人
- ・ 11月下旬 施設改修設計の実施
- ・ 11月13日～17日 交流事業として、“やるベンチャーウィーク”実施
高崎駅周辺での都市企業体験・30人
- ・ 平成19年2月頃 交流事業として、“桜の郷づくり交流”実施
会場：倉渕地域
