

第5回 高崎市箕郷地域審議会

新市建設計画 実施計画事業  
執行状況経過報告書

〔箕郷地域・ハード事業〕

① 箕郷第一保育園改築事業	…	1 P
② 箕郷中学校施設整備事業	…	3 P
③ 箕輪城跡保存整備事業	…	5 P
④ 箕郷地域多目的広場整備事業	…	6 P
⑤ 芝桜公園整備事業	…	7 P
⑥ 榛名白川線道路事業	…	9 P
⑦ 上水道管網整備事業	…	11 P
⑧ 下水道管渠（污水）整備事業	…	15 P
⑨ 箕郷地域住民センター設置事業	…	17 P

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		箕郷第一保育園改築事業			実施地区	箕郷地域
実施期間		平成18年度～平成21年度			所管課名	児童保育課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
			保育園用地測量 地質調査 新園舎基本設計 箕輪小学校旧講堂解体工事 駐車場用地取得	新園舎実施設計	旧園舎解体工事 (1期) 仮設園舎建設 新園舎建設工事	H18年度 調査・測量、基本設計等 H19年度 実施設計 20～21年度 解体(1期・2期)、新園舎建設
当初計画額	合計（千円）		40,170	16,400	250,000	556,570
	財源	国庫支出金	0	7,500	125,000	257,500
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	80,000	160,000
		その他	0	0	0	0
一般財源	40,170	8,900	45,000	139,070		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
			《1月31日現在》			
合計	40,170	12,935	用地測量委託 1,837,500円 7月28日契約締結			
国	0	0	基本設計委託 3,727,500円 9月12日契約締結			
県	0	0	地質調査委託 766,500円 12月20日契約締結			
市債	0	00	箕輪小学校旧講堂解体工事 4,830,000円 12月26日契約締結			
その他	0	0				
一般	40,170	12,935				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	9,866		園舎改築実施設計 平成19年7月着手予定			
国	3,404					
県	0					
市債	5,300					
その他	0					
一般	1,162					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

①箕郷第一保育園改築事業  
(箕輪小学校旧講堂解体工事)



### 第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		箕郷中学校施設整備事業			実施地区	箕郷地域
実施期間		平成15年度～平成20年度			所管課名	教育部庶務課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
	校舎改築設計、工事 H15～H17	既存校舎解体工事 校庭拡張等付帯工事 屋内運動場改築設計 用地取得	屋内運動場改築工事 プール設計委託	プール建設工事	用地取得等 H18 屋内運動場改築 H19 プール建設工事 H20	
当初計画額	合計（千円）		405,638	466,600	83,000	955,238
	財源	国庫支出金	82,500	81,569	14,487	178,556
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	144,600	146,800	26,000	317,400
		その他	0	0	0	0
一般財源	178,538	238,231	42,513	459,282		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》			
合計	405,638	388,529	屋内運動場耐力度調査委託 契約額 1,260,000（H18.7.5～8.31）			
国	82,500	26,497	校舎解体工事 契約額 38,640,000円（H18.7.22～10.31）			
県	0	0	特別教室棟改修工事 契約額 33,715,500円（H18.8.26～11.17）			
市債	144,600	173,500	特別教室棟改修電気設備工事 契約額 9,922,500円（H18.8.29～11.17）			
その他	0	0	特別教室棟改修機械設備工事 契約額 20,884,500円（H18.8.26～12.15）			
一般	178,538	188,532	校庭拡張工事 契約額 40,320,000円（H18.10.24～H19.2.28） 用地交渉遅延のため屋内運動場改築設計は未着手			
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	19,968		屋内運動場改築設計			
国	0		プール建設設計			
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	19,968					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

②箕郷中学校施設整備事業  
(特別教室棟改修・校庭拡張工事)



第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		箕輪城跡保存整備事業			実施地区	箕郷地域
実施期間		全期			所管課名	文化財保護課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
	H5 公有化開始 H10 基本構想 H15 基本計画	用地買収 発掘調査 史跡地内管理	発掘調査 史跡地内管理	発掘調査 駐車場用地取得 園路植栽整備	H23 短期計画 ゾーン整備	
	合計（千円）	104,929	11,782	71,670	188,381	
	当初計画額	財源				
国庫支出金		75,328	4,000	4,000	83,328	
県支出金		4,954	608	608	6,170	
地方債		0	0	56,800	56,800	
その他		0	0	0	0	
一般財源	24,647	7,174	10,262	42,083		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
			《1月31日現在》			
合計	104,929	18,478	<ul style="list-style-type: none"> <li>・史跡整備に向けた発掘調査（5月～3月）</li> <li>・現地説明会、講演会の開催（2月）</li> <li>・保存整備委員会の開催（10月、1月）</li> <li>・史跡地の管理（通年）</li> </ul>			
国	75,328	6,500				
県	4,954	1,560				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	24,647	10,418				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	102,488		<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの発掘調査の成果をまとめた調査報告書の刊行</li> <li>・講演会の開催</li> <li>・保存整備委員会の開催</li> </ul>			
国	71,795					
県	6,044					
市債	0					
その他	0					
一般	24,649					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		箕郷地域多目的広場整備事業			実施地区	箕郷地域
実施期間		平成19年度～平成20年度			所管課名	教育部スポーツ課
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
			施設用地賃貸 実施設計	多目的広場建設 工事	平成19年度：実 施設計 平成20年度：建 設工事	
当初計画額	合計（千円）		0	1,525	50,820	52,345
	財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0
		その他	0	1,525	50,820	52,345
		一般財源	0	0	0	0
区分 (千円)	18年度当 初予算額	18年度決算 (見込額)	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》			
合計	0	0				
国	0	0				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	0	0				
区分 (千円)	19年度当 初予算案	19年度決算 (見込額)	事業計画			
合計	1,525		箕郷支所との調整を図る。			
国	0					
県	0					
市債	0					
その他	1,525					
一般	0					
区分 (千円)	20年度当 初予算案	20年度決算 (見込額)	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		芝桜公園整備事業			実施地区	箕郷地域	
実施期間		平成13年度～平成20年度		所管課名	箕郷支所産業課		
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
		・管理施設整備（管理事務所、トイレ、倉庫）	・林間ゾーン整備（遊歩道整備、景観木植栽）	展望台整備	毎年芝桜公園において、芝桜まつりを開催する。		
当初計画額	合計（千円）	37,617	5,000	24,000	66,617		
	財源	国庫支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	30,000	0	0	30,000	
		一般財源	7,617	5,000	24,000	36,617	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	37,617	22,421	《1月31日現在》				
国	0	0	・管理事務所等用地購入費 17,620,000円 12月1日契約締結 管理事務所等用地（2,908㎡）				
県	0	0	・管理事務所、倉庫、トイレ購入 4,567,500円				
市債	0	0	業者に発注済 2月28日までに現地に設置				
その他	30,000	21,000					
一般	7,617	1,421					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	8,292		・ライトアップ実施設計 3,353,000円				
国	0		・園内整備工事 4,300,000円				
県	0		・立木補償費 639,000円				
市債	0						
その他	0						
一般	8,292						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							



## ⑤芝桜公園整備事業

(管理施設整備)



第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		榛名白川線道路事業			実施地区	箕郷地域	
実施期間		平成11年度～平成20年度			所管課名	都市整備部都市施設課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
			用地買収	道路整備	道路整備	総事業費：390,000千円 延長：575m 幅員：13.5m	
当初計画額	合計（千円）		9,374	10,000	17,000	36,374	
	財源	国庫支出金		0	0	0	0
		県支出金		0	0	0	0
		地方債		7,300	9,000	15,300	31,600
		その他		0	0	0	0
一般財源		2,074	1,000	1,700	4,774		
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	9,374	500	《1月31日現在》				
国	0	0	県道箕郷板鼻バイパスの交差点部であり、県道及び市道の地権者が同一人のため、県と協調し用地交渉を進めていたが、関連して行っている県事業の調整等により平成19年度に見送る予定。				
県	0	0					
市債	7,300	0					
その他	0	0					
一般	2,074	500					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	32,563		引き続き用地交渉を行い用地買収する予定。				
国	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>用地買収費 10,000千円（350.05㎡）</li> </ul>				
県	0		その後、県事業の進捗に併せて、道路築造工事を施工する予定。				
市債	24,300		<ul style="list-style-type: none"> <li>道路築造工事費 16,600千円</li> </ul>				
その他	0						
一般	8,263						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							



# ⑥榛名白川線道路事業



第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		上水道管網整備事業			実施地区	箕郷地域	
実施期間		～全期			所管課名	水道局工務課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事	管網整備 配水管布設（替） 設計・工事		管網整備 配水管布設（替） 設計・工事		
当初計画額	合計（千円）	98,457	53,374	0	151,831		
	財源	国庫支出金	59,074	15,682	0	74,756	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	39,383	37,692	0	77,075	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）				
合計	98,457	118,929	《1月31日現在》				
国	59,074	51,971	管網整備 ・ 配水管布設（替）工事 119,083千円				
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	39,383	66,958	19年3月16日管網整備工事完了。				
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	53,374		管網整備並びに配水拡張を計画的に実施する。				
国	15,682						
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	37,692						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計							
国							
県							
市債							
その他							
一般							


# ⑦上水道管網整備事業

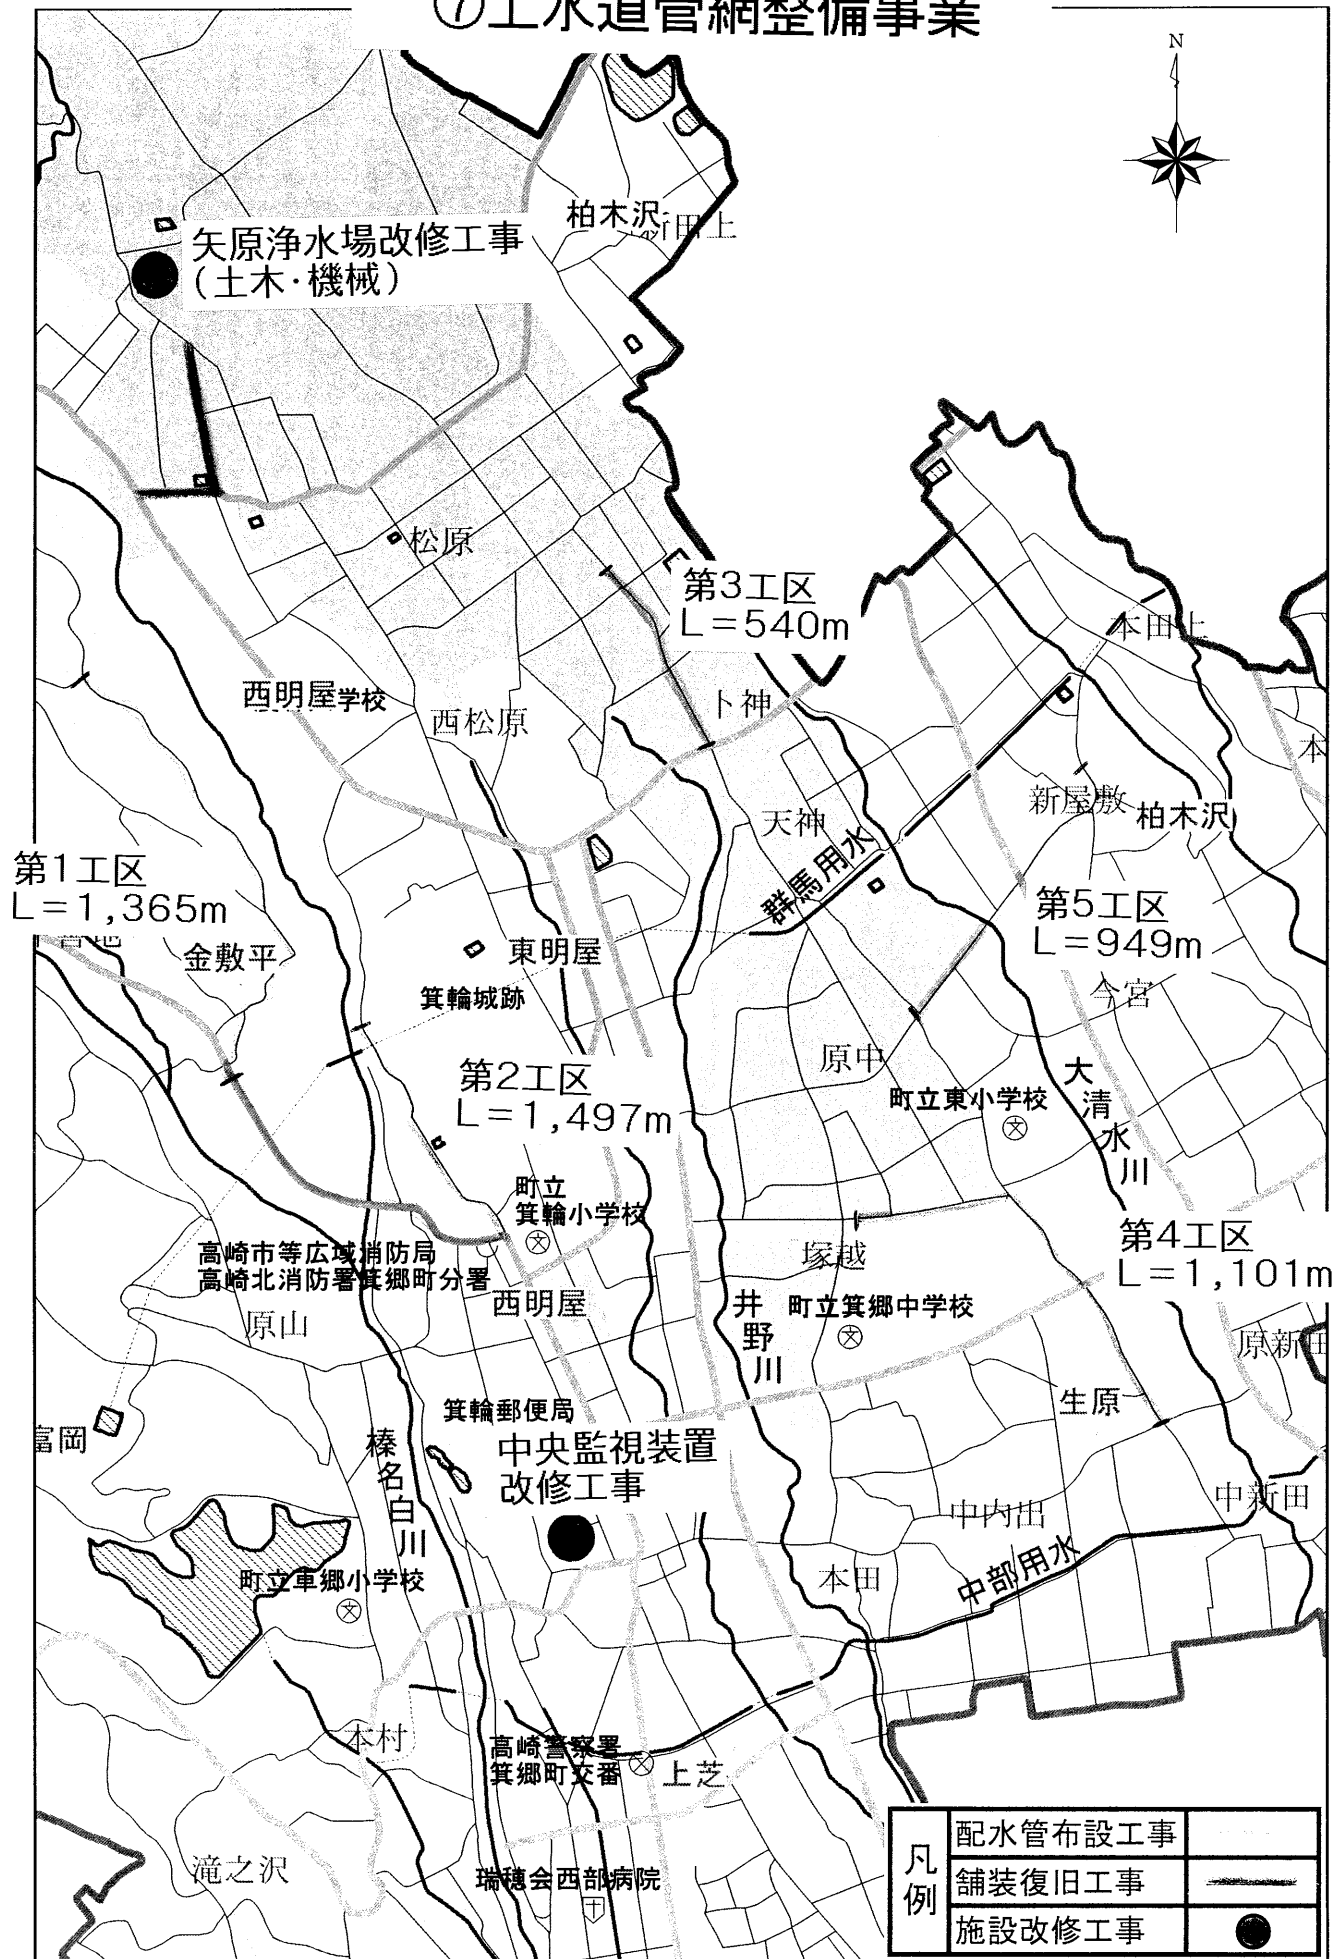

凡例	配水管布設工事	
	舗装復旧工事	
	施設改修工事	



⑦上水道管網整備事業  
(矢原浄水場改修工事)

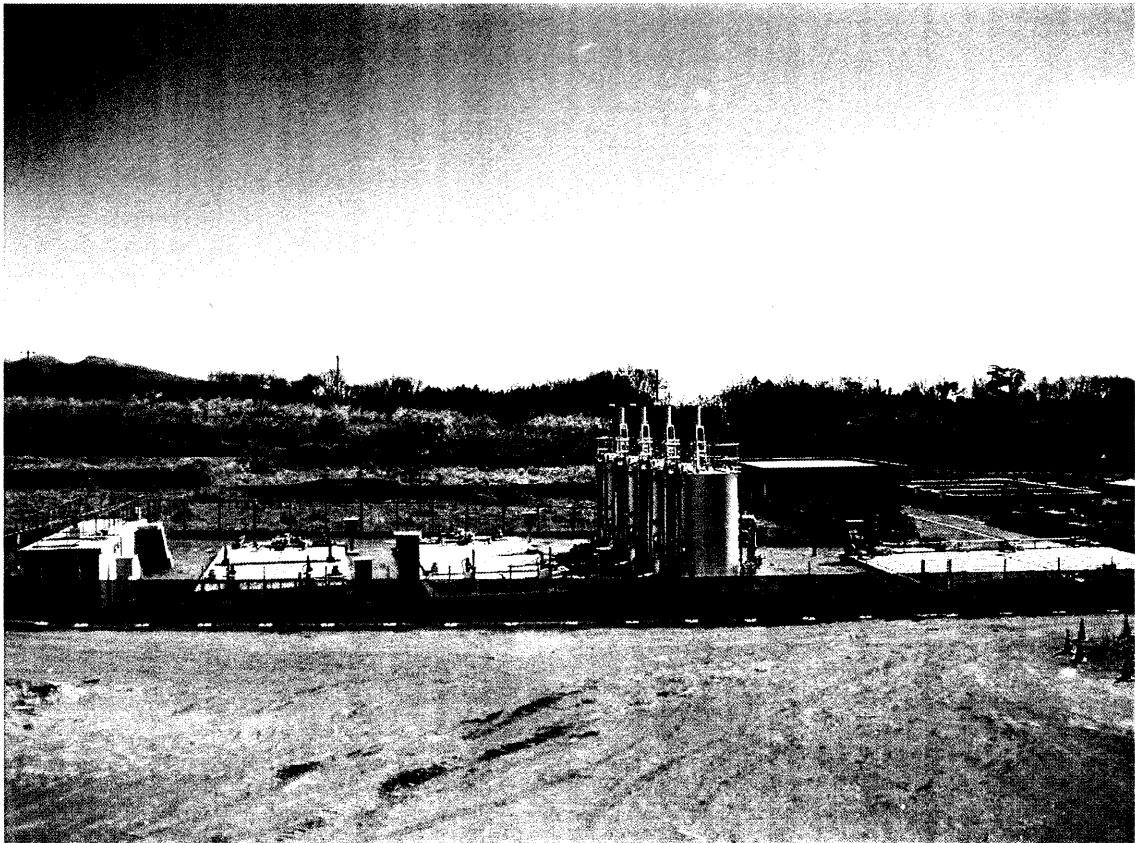


第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		下水道管渠（污水）整備事業			実施地区	箕郷地域
実施期間		平成17年度～平成20年度			所管課名	下水道局建設課
事業計画	平成17年度以前		平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）
			延長 3,400m 面積 10ha	延長 3,400m 面積 10ha	延長 3,400m 面積 10ha	
当初計画額	合計（千円）		164,100	164,100	164,100	492,300
	財源	国庫支出金	60,000	60,000	60,000	180,000
		県支出金	300	300	300	900
		地方債	95,500	95,500	95,500	286,500
		その他	0	0	0	0
	一般財源	8,300	8,300	8,300	24,900	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む）			
合計	164,100	160,234	《1月31日現在》			
国	60,000	60,000	下水道築造工事の発注済			
県	0	0	箕郷町生原 911m（径200mm）			
市債	93,300	86,900	箕郷町矢原 572m（径200mm）			
その他	0	0	箕郷町東明屋 421m（径200mm）			
一般	10,800	13,334	箕郷町白川 59m（径200mm）			
			実施計画に従い逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努める。			
			第1回経過報告			
			下水道築造工事の発注予定（6月1日現在）			
			箕郷地区 1,895m（径200mm）			
			第2回経過報告			
			下水道築造工事発注済（9月7日現在）			
			箕郷地区 1,548m（径200mm）			
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画			
合計	150,600					
国	60,000					
県	0					
市債	70,200					
その他	11,000					
一般	9,400					
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画			
合計						
国						
県						
市債						
その他						
一般						



# ⑧下水道管渠(汚水)整備事業

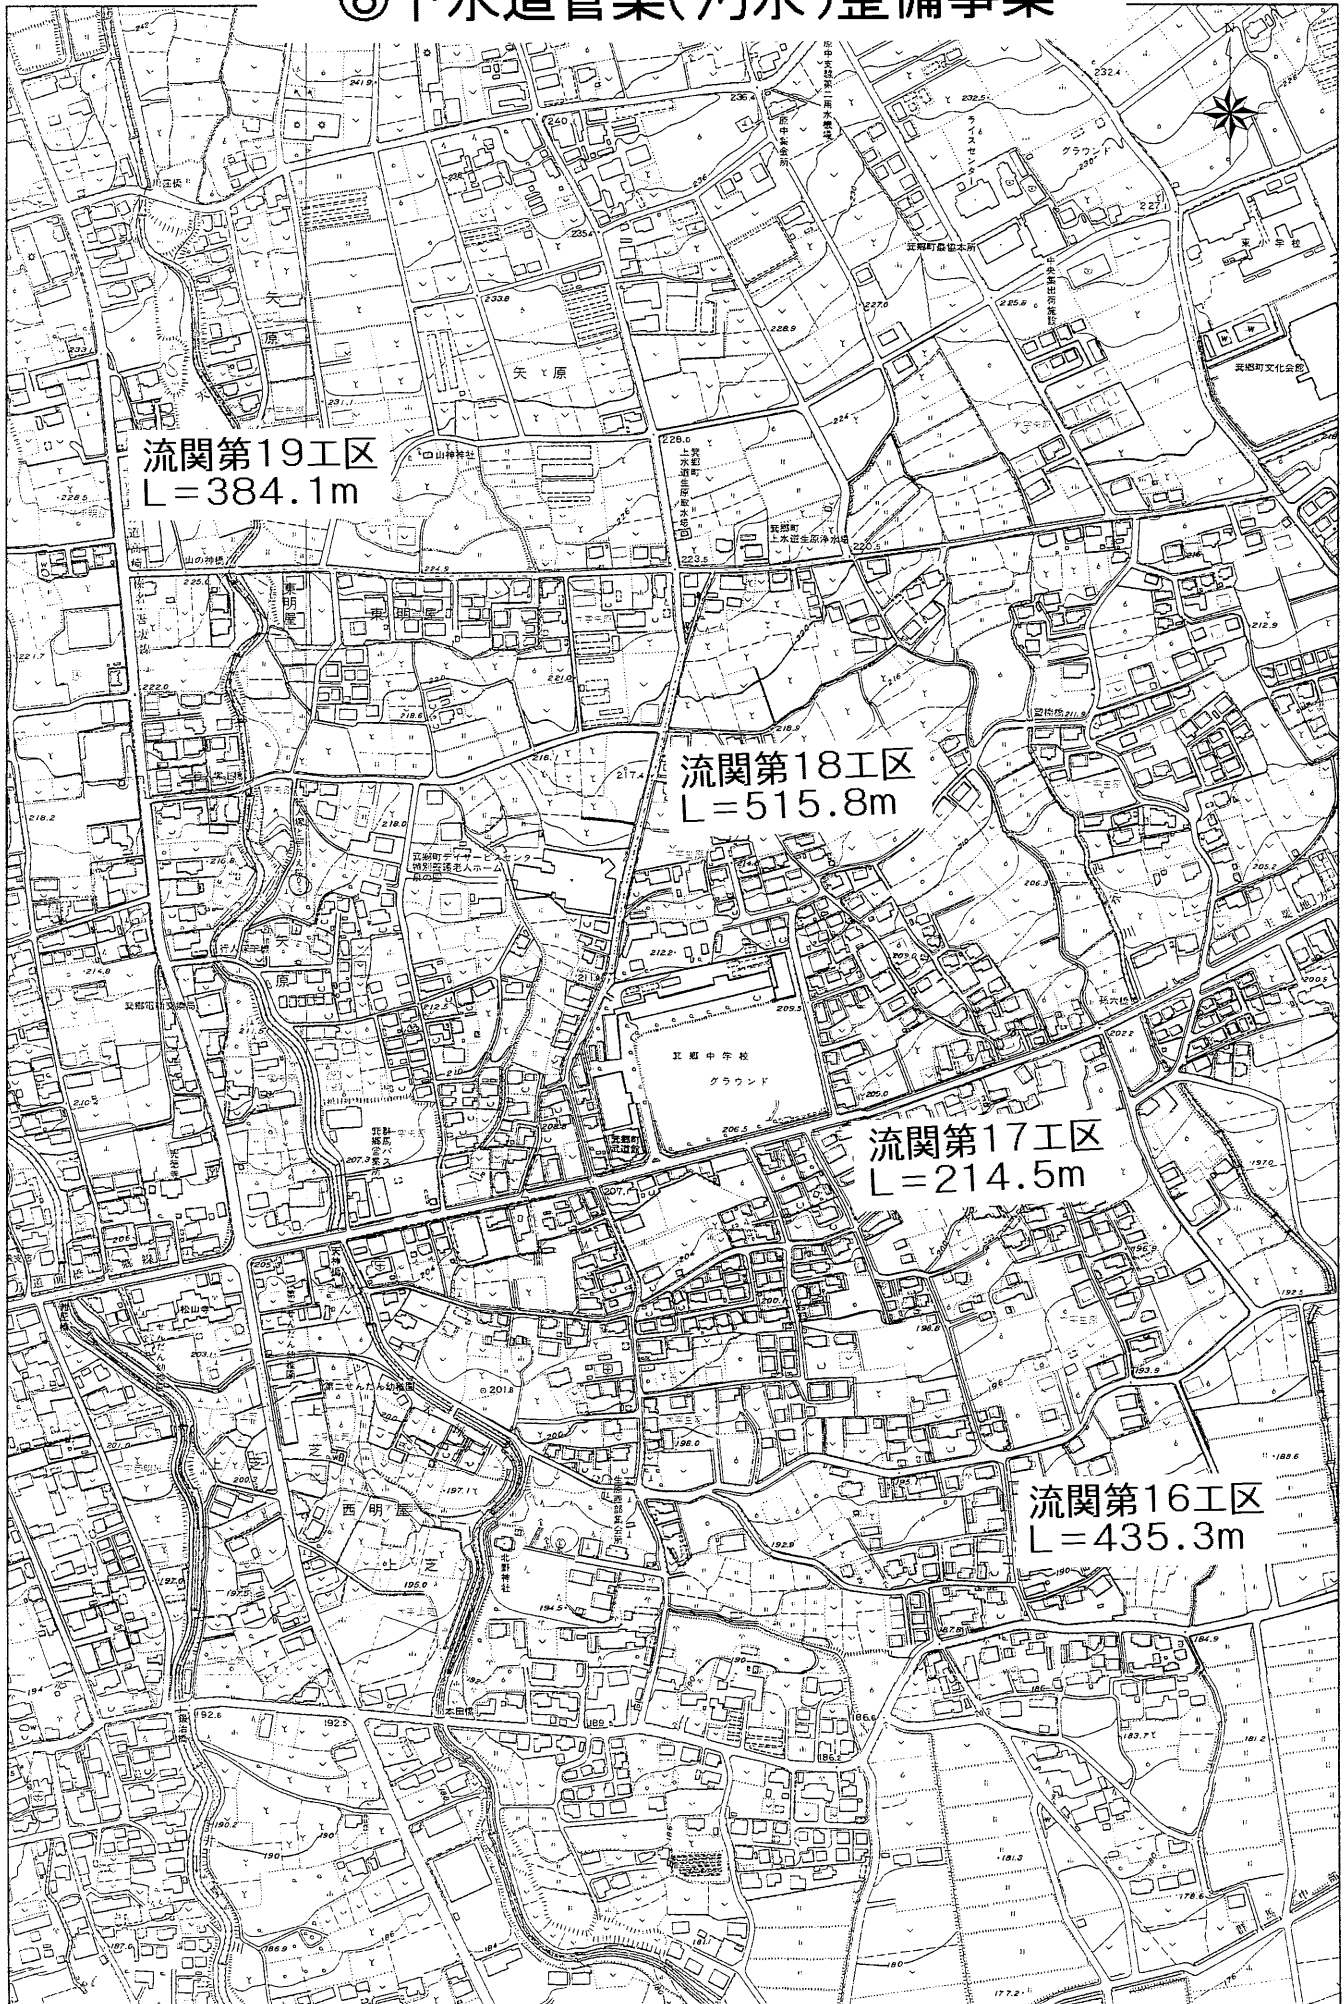

第3回新市建設計画・実施計画（18年度執行状況）経過報告書

ハード事業名		箕郷地域住民センター設置事業			実施地区	箕郷地域	
実施期間		全期			所管課名	総務部庶務課	
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）		
		・東明屋集会所建設事業（設計、管理、建設工事） ・原中集会所建設事業（用地取得、設計）	・原中集会所建設事業（建設工事） ・金敷平集会所建設事業（設計、建設工事）	・4区集会所建設事業（設計、建設工事） ・上善地集会所建設事業（設計、建設工事）			
当初計画額	合計（千円）	73,523	79,916	81,367	234,806		
	財源	国庫支出金	72,200	72,600	69,800	214,600	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
一般財源	1,323	7,316	11,567	20,206			
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算（見込額）	事業実績（今後事業実施予定を含む） 《1月31日現在》				
合計	73,523	80,273	・東明屋集会所 工事請負業者が入札で決定し、建設中である。 ・原中集会所 用地の農振除外が決定し、農地転用の許可がおりた。 設計業者が決定し、地元と協議中である。				
国	72,200	75,070	(今後の予定) ・東明屋集会所 3月23日完成予定 ・原中集会所 用地を購入し、3月23日までに設計図完成予定				
県	0	0					
市債	0	0					
その他	0	0					
一般	1,323	5,203					
区分（千円）	19年度当初予算案	19年度決算（見込額）	事業計画				
合計	76,073		・原中集会所 19年度中に建設工事完了予定 ・金敷平集会所 19年度中に設計及び建設工事完了予定				
国	60,200						
県	0						
市債	0						
その他	0						
一般	15,873						
区分（千円）	20年度当初予算案	20年度決算（見込額）	事業計画				
合計			・4区集会所 設計及び建設工事 ・上善地集会所 設計及び建設工事				
国							
県							
市債							
その他							
一般							

⑨箕郷地域住民センター設置事業

(東明屋集会所)

