

第 5 次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

ページ	部門	事 務 事 業 名	担当課名 ()内は群馬支所担当課
1	教育・文化	生涯学習センター（仮称）建設事業	教育施設企画室 （地域振興課）
2	地域・自治	男女共同参画センター（仮称）建設事業	人権男女共同参画課 （地域振興課）
3	教育・文化	北谷遺跡保存整備事業	文化財保護課 （地域振興課）
4	教育・文化	群馬地域運動広場（仮称）整備事業	教育施設企画室 （地域振興課）
5	都市・建設	群馬中央第二土地区画整理事業	区画整理 1 課
6	都市・建設	菅谷高畑土地区画整理事業	区画整理 1 課
7	都市・建設	上水道管網整備事業（石綿セメント管の付設替）	水道局工務課 （群馬上下水道事務所）
8	都市・建設	汚水管渠整備事業	下水道局整備課 （群馬上下水道事務所）

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	生涯学習センター(仮称)建設事業	所属 (支所)	教育部教育施設企画室 (群馬支所地域振興課)
実施期間	平成18年～平成23年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市民の学習活動や文化活動を促進するため、計画的に新規施設を整備する。(群馬地域) この事業は、新市基本(建設)計画にも位置づけられている。	旧群馬中央中学校跡地に生涯学習センター(仮称)を整備する。 なお、男女共同参画や市民公益活動、教職員の研修の拠点となる施設を複合的に整備する。 事業費については、本事業を58%、男女共同参画センター(仮称)建設事業を42%として面積按分している。	平成21年度 基本構想、基本設計、実施設計 平成22年度 実施設計、本体工事 平成23年度 本体工事 平成21年度までの 事業進捗率6.1%	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
実施設計、本体工事	本体工事		

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
2 2 年 度 事 業 実 績			
合計	290,675	234,064	■実施設計
国			■既存施設解体工事
県			■本体工事
地方債	86,200	59,100	■外構実施設計
その他	162,400	149,800	
一般	42,075	25,164	
2 3 年 度 事 業 内 容			
合計	1,019,420	—	■本体工事
国	—	—	■外構工事
県	—	—	
地方債	431,700	—	平成 24 年度 開館
その他	377,886	—	
一般	209,834	—	
2 4 年 度 事 業 計 画			
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
	—	—	

別紙 1

工事関係スケジュール及び進捗状況

	2010年 (平成22年)		2011年(平成23年)												2012年(平成24年)				
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
高崎市生涯学習センター・男女共同参画センター(仮称)建設工事																			
南側緑地・調整池整備工事																			
植栽工事																			
開館準備																			開館



別紙 2

高崎市生涯学習センター・男女共同参画センター(仮称)建設工事進捗状況写真 1 / 2 (H23.06.23現在)



別紙 3

高崎市生涯学習センター・男女共同参画センター(仮称)建設工事進捗状況写真 2/2 (H23.06.23現在)

教育センター棟外観
(北西側)



南側よりメインアプローチ方向



教育センター棟外観
(南東側)



教育センター棟内観
(エントランスホール)



教育センター棟内観
(2階北側研修室および廊下)



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年3月31日現在

事務事業名	男女共同参画センター(仮称)建設事業	所属 (支所)	市民部人権男女共同参画課 (群馬支所地域振興課)
実施期間	平成21年～平成23年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
男女共同参画社会を形成していくためには、市民、団体、事業者、行政が目標を共有しながら協働して活動していくことが不可欠であることから、相互の情報や資源の共有、連絡調整、協力等の連携と協働等の拠点となる常設の施設を建設する。	旧群馬中央中学校跡地に男女共同参画センター(仮称)を整備する。 なお、生涯学習や市民公益活動、教職員の研修の拠点となる施設を複合的に整備する。 事業費については、本事業を42%、生涯学習センター(仮称)建設事業を58%として面積按分している。	平成21年度 実施設計 平成22年度 実施設計、本体工事 平成23年度 本体工事 平成21年度までの事業進捗率 0.7%	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
実施設計委託 建設工事	建設工事		

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業実績
合計	187,115	184,289	■実施設計 ■本体工事
国		—	
県		—	
地方債	62,300	48,600	
その他	117,600	130,200	
一般	7,215	5,489	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23年度事業内容
合計	680,036	—	■本体工事 平成24年度 開館
国	—	—	
県	—	—	
地方債	323,200	—	
その他	328,443	—	
一般	28,393	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	24年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	北谷遺跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (群馬支所地域振興課)
実施期間	平成12年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	北谷遺跡		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡北谷遺跡(平成17年7月14日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史的遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である北谷遺跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	全体面積 4.2ha 平成12年度～15年度 範囲確認発掘調査 平成16年度 調査報告書刊行 平成18年度 説明板設置	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
・史跡保存管理計画の策定準備	・史跡保存管理計画策定 ・保存管理計画検討委員会	・史跡境界杭の設置 ・用地買収準備(国と協議)	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
22年度事業実績			
合計	409	322	■説明板設置場所の管理(除草等) ■保存管理計画策定に向けた準備
国	0	0	
県	0	0	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	409	322	
23年度事業内容			
合計	2,566	—	■保存管理計画策定着手 ■保存管理計画検討委員会 ■説明板設置場所の管理(除草管理)
国	1,000	—	
県	300	—	
地方債	0	—	
その他	0	—	
一般	1,266	—	
24年度事業計画			
合計	—	—	■史跡境界杭の設置 ■用地買収準備(国と協議) ■説明板設置場所の管理(除草管理)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

北谷遺跡平面図

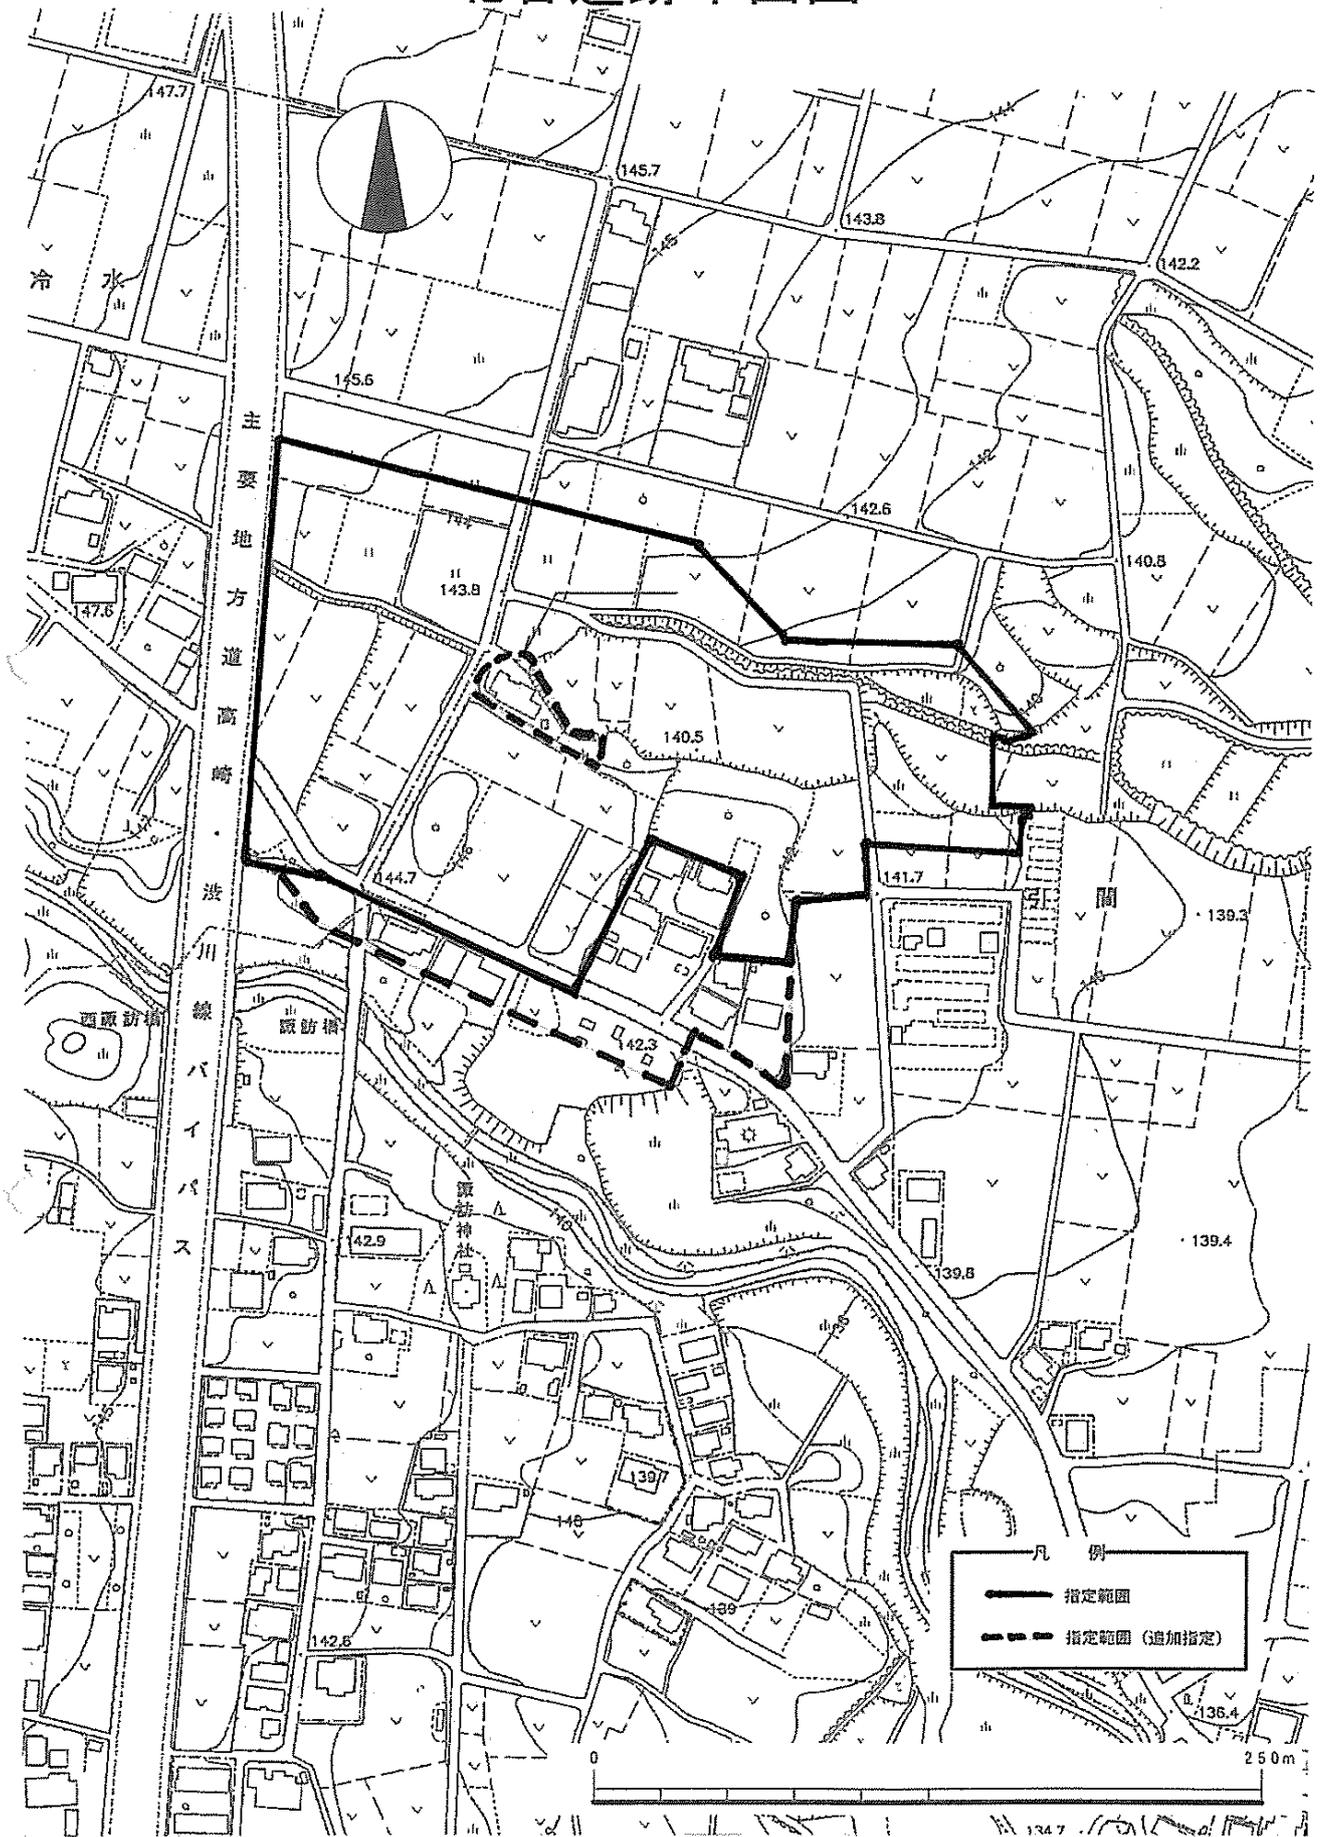

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	群馬地域運動広場(仮称)整備事業	所属 (支所)	教育部教育施設企画室 (群馬支所地域振興課)
実施期間	平成18年度～平成23年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	市民		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市民ニーズに対応した計画的な新規施設を整備することで、市民の生涯スポーツの推進やスポーツ振興を図ることを目的とする。(群馬地域)	軟式野球場、少年野球場、レクリエーション広場を主たる施設として運動広場を整備する。なお、新市基本(建設)計画で示した野球場建設事業、北部公園整備事業をこの事業に取り込み、一体的な事業として実施していく。また、一部返還となった金古中規模運動広場の位置づけもこの事業に取り込んでいく。	平成21年度 現地測量、土地収用法による事業認定、不動産鑑定、基本計画の策定、実施設計 平成22年度 実施設計、整備工事 平成23年度 整備工事 平成21年度までの事業進捗率47.9%	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
実施設計、整備工事	整備工事		


【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 実 績
合計	92,303	87,053	■広場本体実施設計 ■建築物実施設計 ■広場整備工事
国			
県			
地方債	49,800	37,300	
その他			
一般	42,503	49,753	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 内 容
合計	1,054,586	—	■広場整備工事 ■建築物工事 平成 24 年度 供用開始
国	—	—	
県	—	—	
地方債	872,400	—	
その他	—	—	
一般	182,186	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 4 年 度 事 業 計 画
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

別紙 1

工事関係スケジュール及び進捗状況

	2010年(平成22年)			2011年(平成23年)									2012年(平成24年)							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
群馬地域運動広場(仮称)整備工事																				
スタンド建設工事																				
管理棟建設工事																				
便所棟建設工事																				
植栽工事																				
周辺関連工事																				

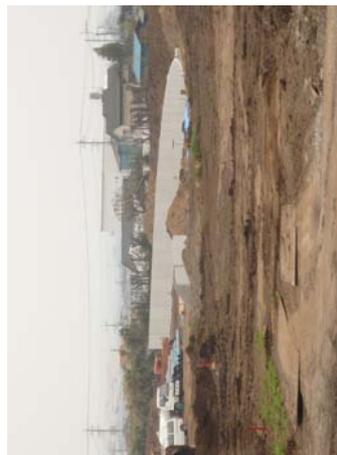

群馬地域運動広場(仮称)整備事業進捗状況写真 1/2

(H23. 06. 23現在)

社会人軟式野球場
スタンド方向



少年野球場
北側法面



付替道路(使用開始)



社会人軟式野球場



社会人軟式野球場
防球ネット



(H23. 06. 23現在)

群馬地域運動広場(仮称)整備事業進捗状況写真 2/2



社会人軟式野球場
バックスクリーン方向




便所棟施工箇所



管理棟施工箇所

社会人軟式野球場
スタンド施工状況

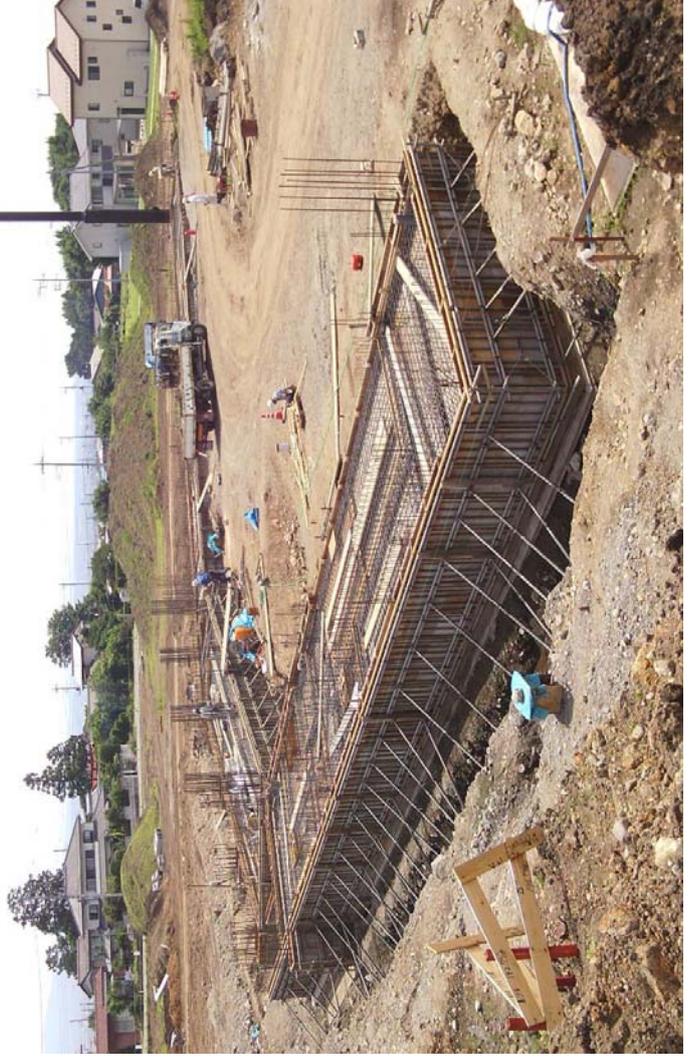

社会人軟式野球場
バックスクリーン施工状況

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年3月31日現在

事務事業名	群馬中央第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理1課
実施期間	平成9年度～平成35年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	群馬中央第二土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	具体的手段(どういった手段で)	土地区画整理事業により整備する。
		その他(全体計画等)	【施行面積】 72.02ha 【総事業費】 13,300百万円 【事業概要】 都市計画道路 4,993m、区画道路13,098m 特殊道路1,557m、水路271m、公園21,700㎡、上水道15,890m、調整池1箇所、物件移転606戸 H21末進捗率 19.0%


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
22年度事業実績			
合計	376,217	412,572	■道路築造工事外 4件 ■建物調査委託外 8件 ■建物移転補償物件外 17件
国	138,250	132,107	
県	—	—	
地方債	24,300	56,700	
その他	—	—	
一般	213,667	223,765	
23年度事業内容			
合計	529,179	—	■道路築造工事外 4件予定 ■建物調査委託外 7件予定 ■建物移転補償物件外 9件予定
国	200,400	—	
県	—	—	
地方債	79,200	—	
その他	—	—	
一般	249,579	—	
24年度事業計画			
合計	—	—	■道路築造工事外 ■建物調査委託外 ■建物移転補償物件外
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

中央第二土地区画整理事業 位置図

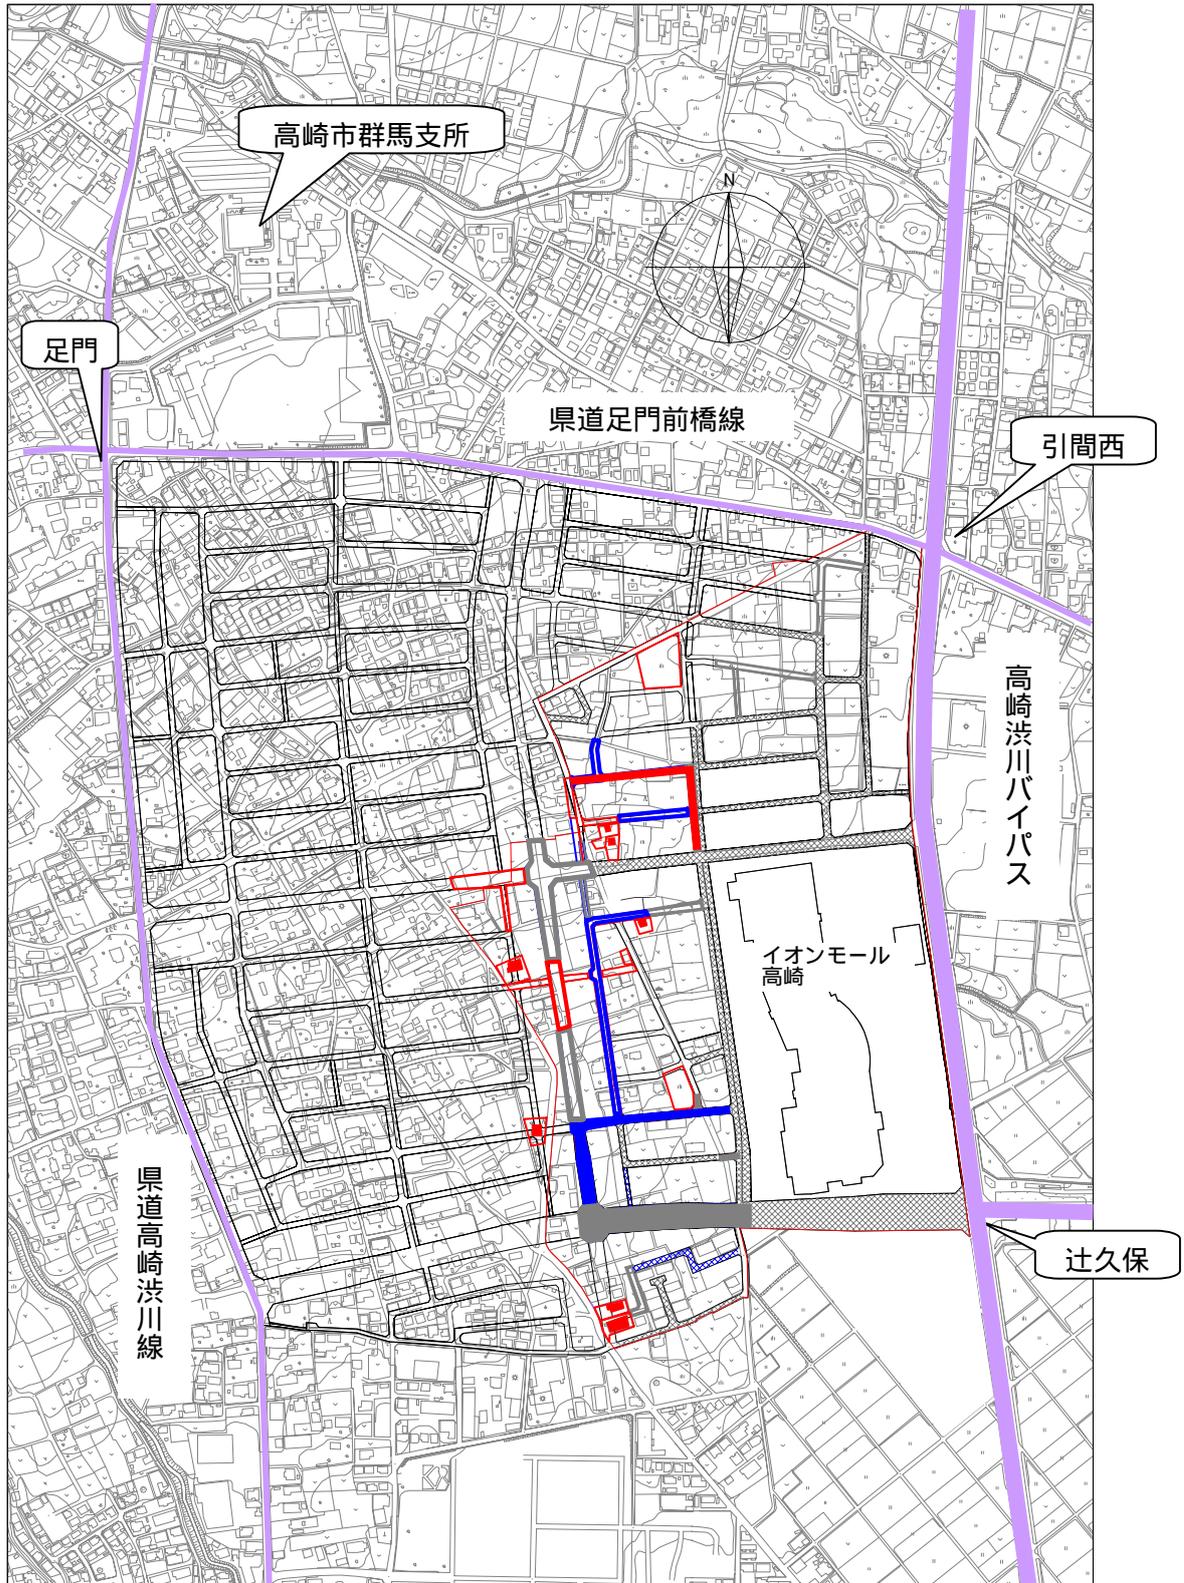

凡 例	
	・・・過年度施工済箇所
	・・・平成22年度施工箇所
	・・・平成23年度施工予定箇所

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年3月31日現在

事務事業名	菅谷高畑土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理1課
実施期間	平成9年度～平成30年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	菅谷高畑土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】 21.89ha 【総事業費】 4,027百万円 【事業概要】 都市計画道路1,486m、区画道路4,845m、特殊道路161m、水路79m、公園6,825㎡、上水道7,827m、物件移転118戸 H21末進捗率 61.10%	


【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
22年度事業実績			
合計	129,369	129,204	■道路築造工事外 4件 ■建物調査委託外 6件 ■建物移転補償物件外 6件
国	—	—	
県	—	—	
地方債	58,500	58,500	
その他	—	—	
一般	70,869	70,704	
23年度事業内容			
合計	162,393	—	■道路築造工事外 3件予定 ■建物調査委託外 3件予定 ■建物移転補償物件 7件予定
国	—	—	
県	—	—	
地方債	36,000	—	
その他	—	—	
一般	126,393	—	
24年度事業計画			
合計	—	—	■道路築造工事外 ■建物調査委託外 ■建物移転補償物件
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

菅谷高畑土地区画整理事業 位置図

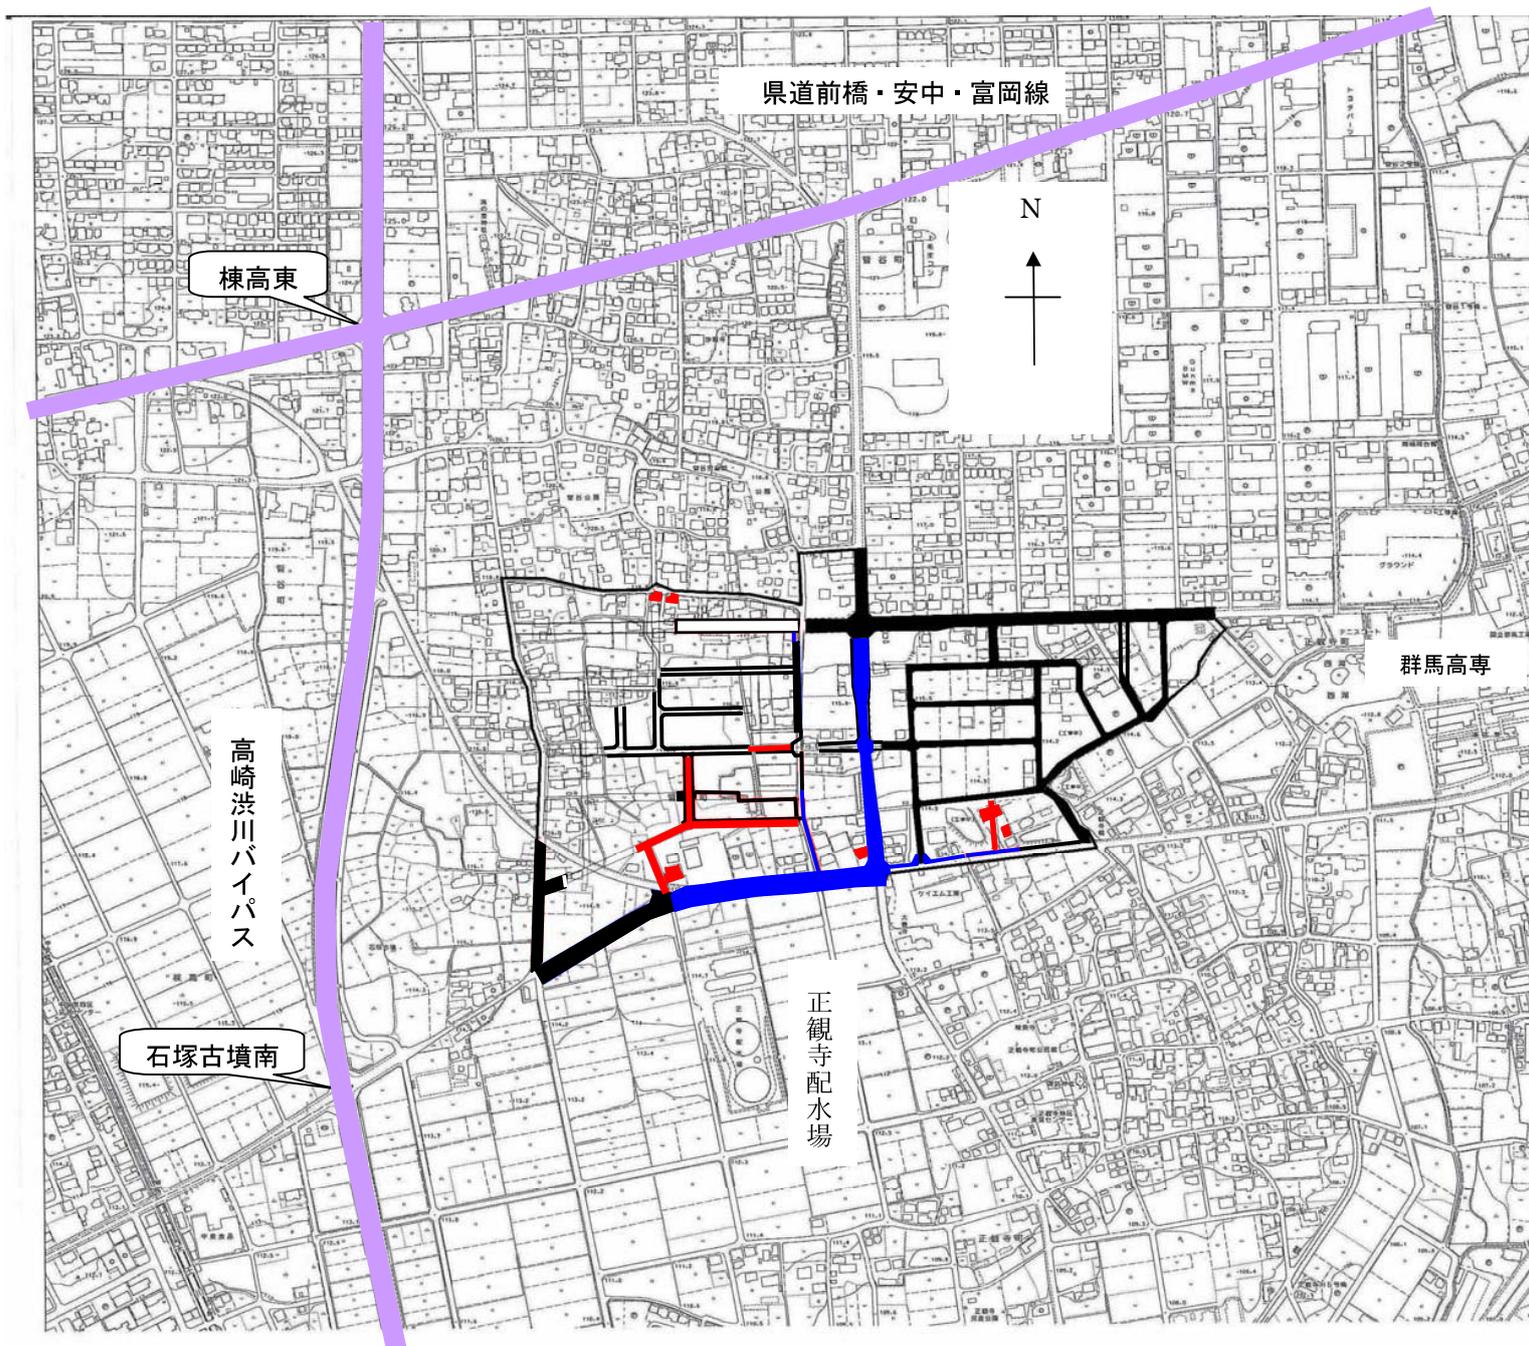

凡 例	
	・・・過年度施工済箇所
	・・・平成22年度施工箇所
	・・・平成23年度施工予定箇所

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	群馬地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	群馬地域の石綿セメント管残存延長 (平成 21 年度末 64,966m)	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
石綿セメント管等の布設替 3,100m	石綿セメント管等の布設替 2,800m	石綿セメント管等の布設替 2,500m	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 実 績
合計	184,902	164,525	管網整備事業 ・配水管布設替工事 L = 3,292.4 m
国	—	17,300	
県	—	—	
地方債	38,100	22,900	
その他	—	—	
一般	146,802	124,325	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 内 容
合計	145,500	—	管網整備事業 ・舗装復旧工事 A = 1,700.0 m ² ・配水管布設工事 L = 290.0 m ・配水管布設替工事 L = 2,951.7 m
国	7,000	—	
県	—	—	
地方債	47,100	—	
その他	—	—	
一般	91,400	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	2 4 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成23年3月31日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成22年度末 整備面積 282.91ha 整備延長 73.62km	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	
22年度事業実績			
合計	323,300	294,150	■実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 ・下水道築造工事施工済 群馬地域 2549.07m
国	106,000	106,000	
県	—	1,900	
地方債	192,800	50,304	
その他	14,040	27,225	
一般	10,460	108,721	
23年度事業内容			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	■下水道築造工事発注予定 ・群馬地域 管渠布設 L=1975.0m 舗装復旧 A=5,130㎡
合計	206,316	—	
国	57,462	—	
県	—	—	
地方債	72,400	—	
その他	27,000	—	
一般	49,454	—	
24年度事業計画			
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	■下水道築造工事発注予定 ・群馬地域 1,408m
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	
