

平成 22 年度 第 3 回 高崎市箕郷地域審議会

第 5 次総合計画前期実施計画
事業推進状況報告書

箕郷地域観光施設整備事業	...	1 P ~ 2 P
榛名南麓広域営農団地農道整備事業	...	3 P ~ 6 P
耐震補強事業	...	7 P ~ 8 P
自校方式給食拡充事業	...	9 P
箕輪城跡保存整備事業	...	10 P
上水道管網整備事業	...	11 P ~ 13 P
污水管渠整備事業	...	14 P ~ 15 P

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	箕郷地域観光施設整備事業	所属 (支所)	商工観光部観光課 (箕郷支所 産業課)
実施期間	平成 19 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	みさと芝桜公園		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
芝桜公園を整備し、市民に憩いの場を提供するとともに観光客の誘客を図る。	芝桜公園にライトアップ照明整備を行うことにより、営業時間の延長を図り入園者の増加を推進する。 また、公園用地を取得して、安定した公園運営を図ると共に幅広い客層の誘客を図るよう公園環境を整備する。	芝桜公園全体	6.5ha
		・芝桜	2.9ha
		・花園ゾーン	1.2ha
		・林間ゾーン	0.6ha
		・駐車場ほか	1.8ha

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
芝桜公園整備運営 計画策定 芝桜公園運営管理	芝桜公園用地取得 芝桜公園運営管理	芝桜公園用地取得 芝桜公園運営管理	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21 年度 事業実績
合計	88,801	64,653	芝桜公園整備事業 987,000 円
国	—	14,355	・ライトアップ照明器具設置
県	—	—	芝桜公園運営事業 63,666,240 円
地方債	—	—	・芝桜の植栽、保全
その他	—	—	・園内通路等維持管理
一般	88,801	50,298	・芝桜まつり実施
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22 年度 事業内容
合計	49,454	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園整備運営計画策定
県	—	—	芝桜公園運営事業
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	—	—	芝桜管理委託業務 9,450,000 円
一般	49,454	—	芝桜保全委託業務 5,702,400 円
			園内整備工事 2,614,500 円
			・芝桜まつり実施関係業務 14,819,011 円
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	23 年度 事業計画
合計	—	—	芝桜公園整備事業
国	—	—	・芝桜公園用地取得
県	—	—	芝桜公園運営事業
地方債	—	—	・芝桜管理及び保全関係業務
その他	—	—	・芝桜まつり実施関係業務
一般	—	—	

平成22年4月26日(芝桜まつり期間中)



平成22年8月30日(除草作業)



平成22年9月29日(散水)



平成22年9月29日(補植)



第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	榛名南麓広域営農団地農道整備事業（箕郷工区）	所属 （支所）	農政部 田園整備課 （箕郷支所 建設課）
実施期間	平成19年度～平成24年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	榛名南麓広域農道		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
榛名南麓(箕郷～榛名)における営農団地を集積する広域農道を整備して、農作物の流通改善と生産基盤の促進をはかる。	県が行う広域営農団地農道整備事業について、市が10%負担する。 国50% 県40% 市10%(起債90%)	Ⅱ期工事 進捗率 31% (平成21年度末)	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
橋梁下部工 橋梁上部工 用地買収 物件移転補償	橋梁上部工 道路工	橋梁上部工 道路工	



【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	28,125	28,125	<事業費 250,000千円 負担金 28,125千円>
国	—	—	・橋梁下部工 橋脚2基
県	—	—	・法面対策工
地方債	25,200	25,200	・用地買収
その他	—	—	
一般	2,925	2,925	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	47,250	—	<事業費 420,000千円 負担金 47,250千円>
国	—	—	・橋梁下部工 橋台2基、橋脚2基
県	—	—	・橋梁上部工 製作
地方債	42,525	—	・用地買収
その他	—	—	・物件移転補償
一般	4,725	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	・橋梁上部工
国	—	—	・道路工
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	




案内図

榛名南麓広域営農団地農道整備事業
〔フルーツライン〕

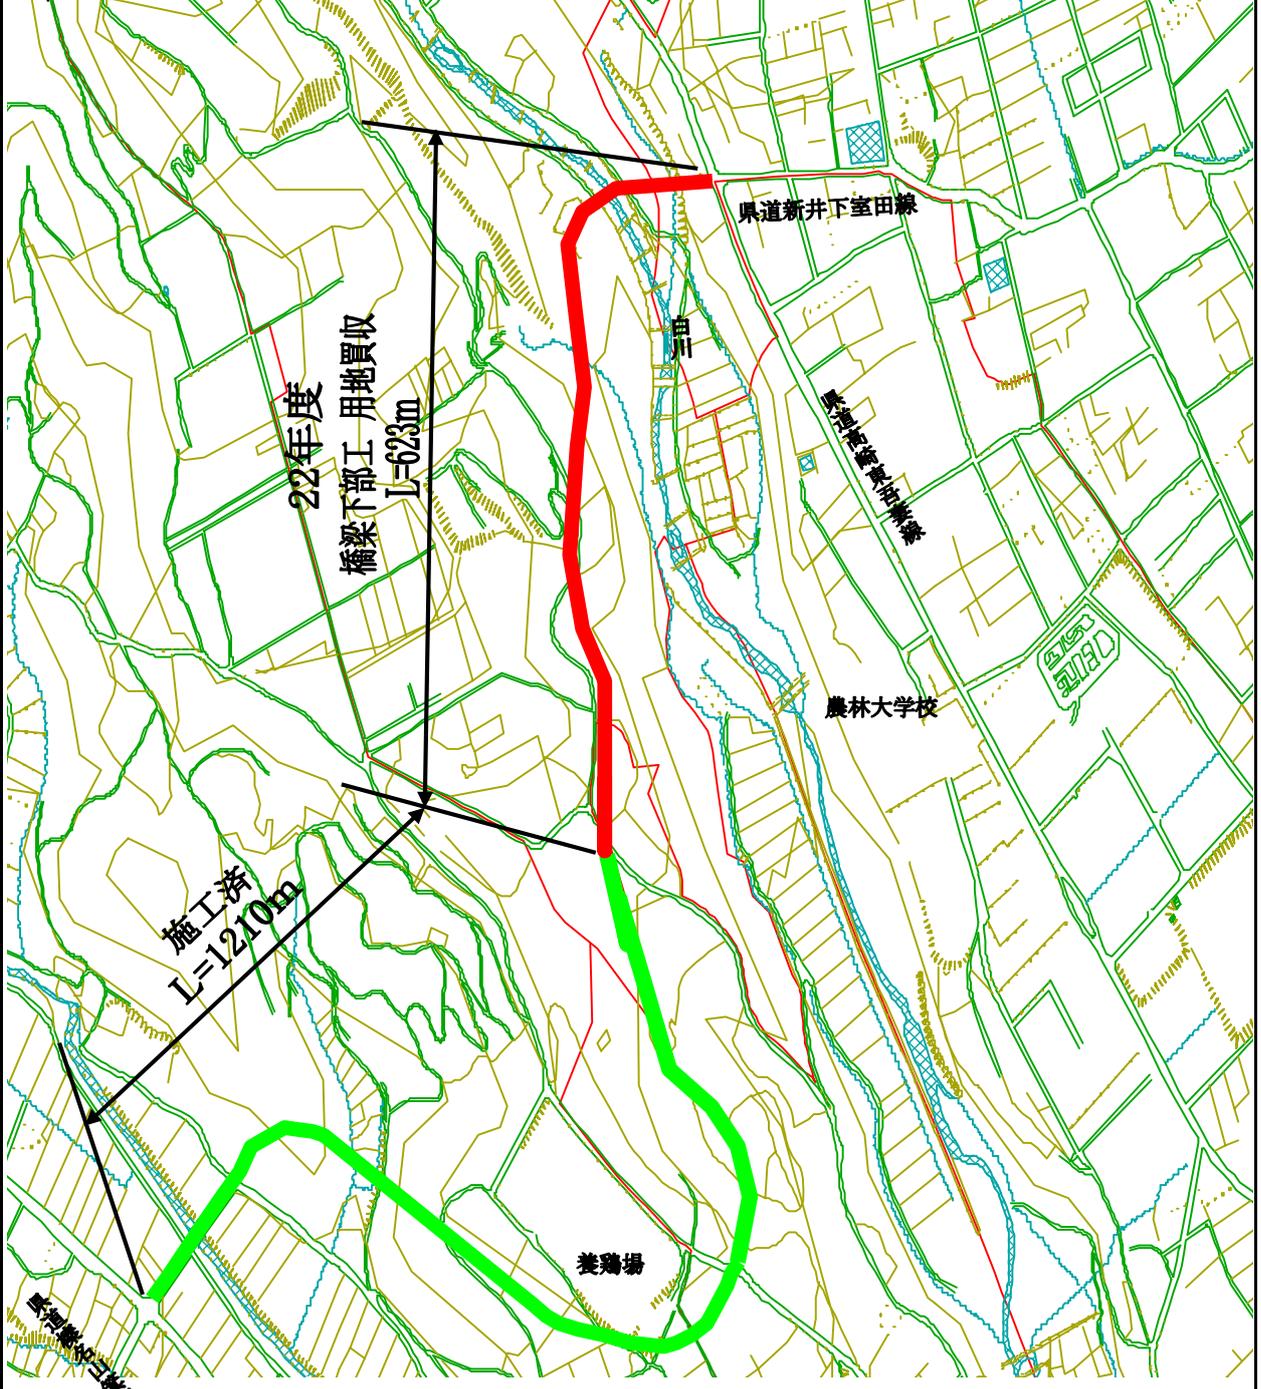

標準部

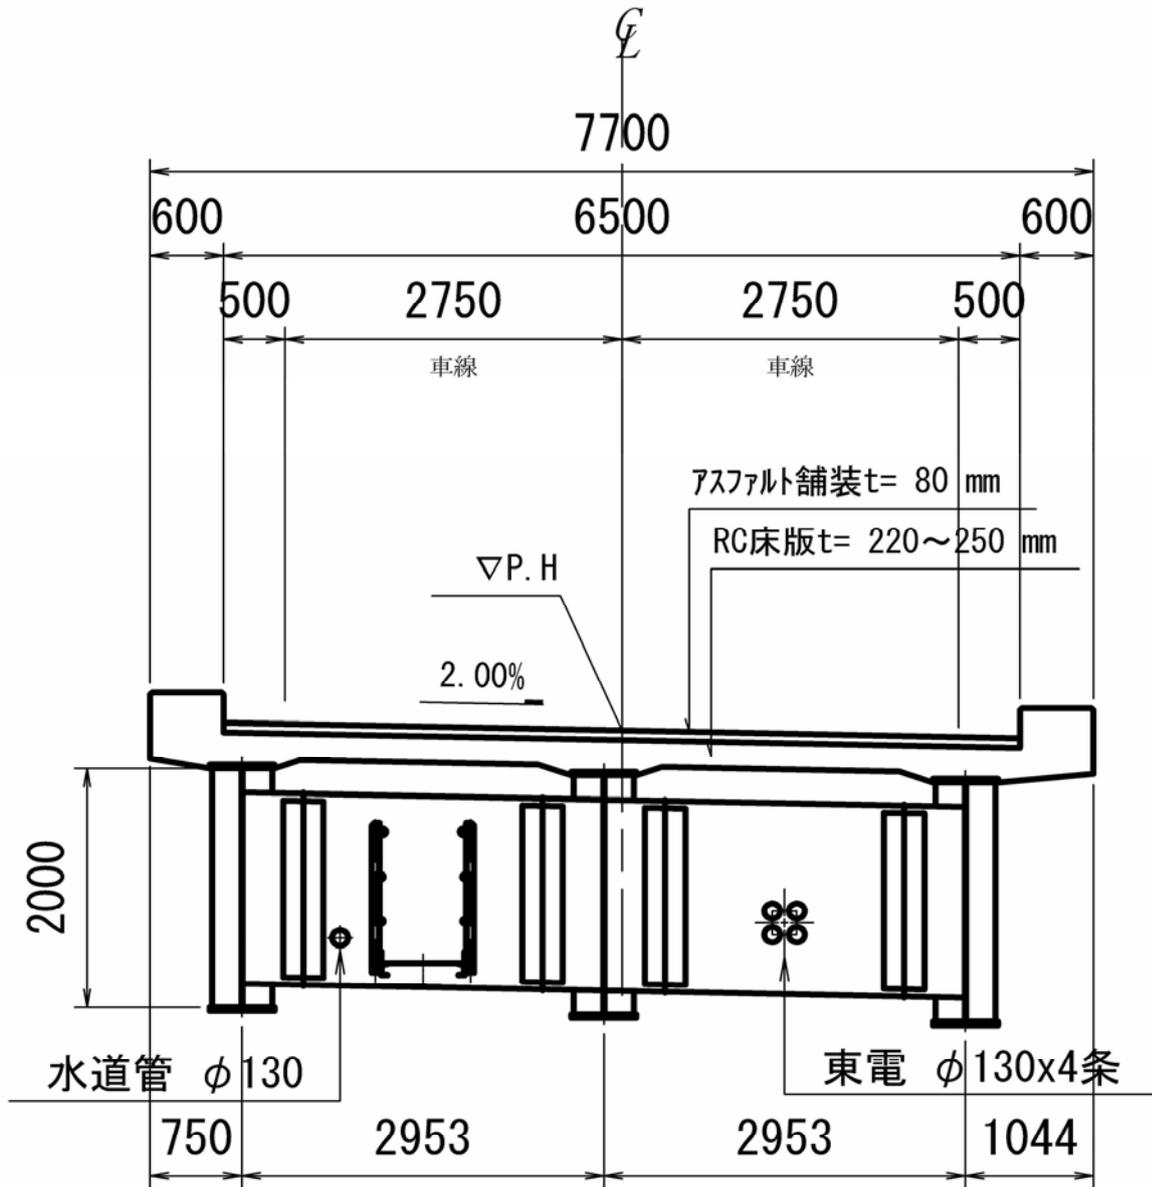

榛名南麓広域営農団地農道整備事業(フルーツライン)



22年度施工予定箇所
(高崎・東吾妻線と新井・下室田線交差点から)



22年度施工予定箇所
(榛名白川西側)



22年度施工予定箇所
(榛名白川東側)



道路工施工予定箇所
(榛名白川西側、松之沢)



21年度施工 橋脚2基



施工済み箇所
(みさと農場 善地養鶏場の北東)

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	耐震補強事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成19年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
児童・生徒が学校生活を送るために安全・安心な環境を実現することを目的とする。 学校施設は地震等の災害時に避難場所となることから耐震性の確保は重要であり、耐震性の低い施設の計画的な改善を図る。	新耐震設計基準で施工された施設以外について耐震診断を実施する。診断の結果「補強必要」と判定された施設について耐震補強設計、耐震補強工事を実施する。	市立学校(小・中・養護学校、高校、幼稚園)の耐震化率 21年3月31日:56.8% 22年3月31日:60.0%	

【年度別事業計画】


平成22年度	平成23年度	平成24年度	
耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	耐震診断 耐震補強設計 耐震補強工事	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	487,113	396,898	・耐震診断(9校17棟) 北部小2棟、大類小1棟、中居小2棟、乗附小3棟、六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、 長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ・耐震補強設計(8校16棟) 西部小1棟、倉賀野小2棟、倉渚中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、 大類中5棟、倉賀野中2棟 ・耐震補強工事(7校14棟) 八幡小3棟、岩鼻小3棟、西部小2棟、北部小1棟、第一中3棟、 箕輪小1棟(21・22年度工事)、車郷小1棟(21・22年度工事)
国	140,158	167,161	
県	—	—	
地方債	207,500	119,900	
その他	—	—	
一般	139,455	109,837	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	584,144	—	・耐震診断(13校園28棟) 金古南小1棟、宮沢小3棟、片岡小3棟、佐野小3棟、中居小2棟、南八幡小2棟、 北部小1棟、新高尾小2棟、南小2棟、長野郷中5棟、倉賀野中2棟、片岡中1棟、 かぶら幼稚園1棟 ・耐震補強設計(6校11棟) 六郷小2棟、堤ヶ岡小1棟、中居小2棟、長野郷中2棟、佐野中3棟、片岡中1棟 ・耐震補強工事(9校16棟) 西部小1棟、倉渚中央小2棟、第一中1棟、片岡中2棟、佐野中1棟、大類中5棟、 倉賀野中2棟、箕輪小1棟、車郷小1棟
国	167,309	—	
県	—	—	
地方債	278,600	—	
その他	—	—	
一般	138,235	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	・耐震診断 ・耐震補強設計 耐震診断の結果、補強必要と判定された棟について耐震補強設計を実施する。 ・耐震補強工事 耐震補強設計を実施した棟について補強工事を実施する。
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

耐震補強事業写真

【車郷小学校】

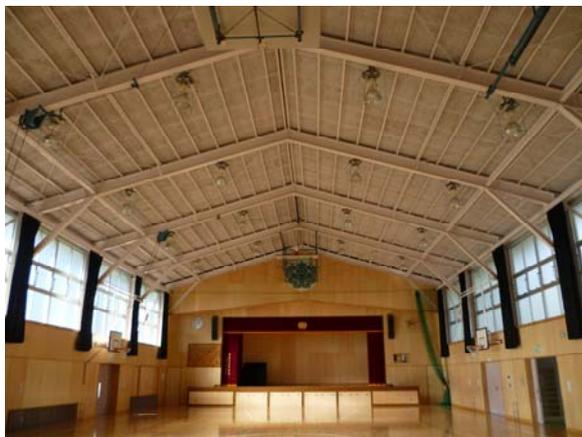


【内部写真】

【箕輪小学校】



【内部写真】

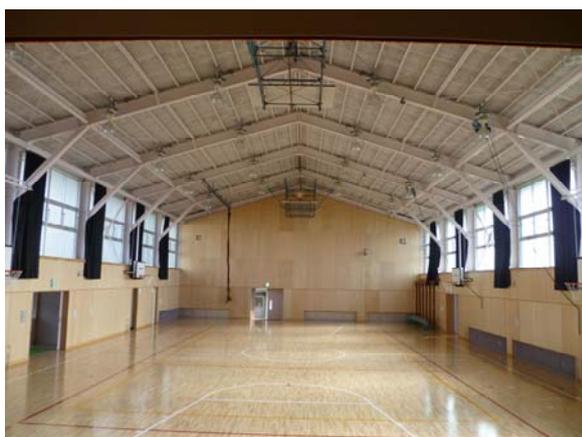

【内部写真】



【内部写真】



【外観写真】



【外観写真】

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成22年 9月30日現在

事務事業名	自校方式給食拡充事業	所属 (支所)	教育部教育総務課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成20年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	給食室、学校給食センター		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
食育の観点から自校方式給食制度を取り入れていく。 自校方式給食への移行に伴い、老朽化した学校給食センターについては施設を廃止する。	各校に給食室を新設する。 不要となった学校給食センターについては、施設を廃止し、随時解体工事を実施していく。	学校給食センターの老朽化を考慮し、センターが古い地域の順に整備することを基本とし、校舎改築等に織り交ぜて実施する。	

【年度別事業計画】

平成22年度	平成23年度	平成24年度	
新設 ・下里見小学校 (増築) ・下室田小学校 (増築)	新設 ・箕郷中学校他1校 (増築) 解体 ・榛名学校給食センター	新設 ・2校 (増築)	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	21年度事業実績
合計	313,926	370,959	<ul style="list-style-type: none"> ・給食室建設 榛名中学校(工事完成、22年4月より稼動) 久留馬小学校(工事完了、22年4月より稼動) ・給食室設計 下里見小学校(設計終了) 下室田小学校(設計終了) ・群馬地域給食室整備基礎調査(調査終了)
国	21,775	301,853	
県	—	—	
地方債	221,800	6,700	
その他	—	—	
一般	70,351	62,406	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業内容
合計	35,087	—	<ul style="list-style-type: none"> ・給食室建設(21年度繰越事業:地域活性化・きめ細かな臨時交付金を利用 繰越予算額 420,000 千円) 下里見小学校(本体工事着工済～年度内完成予定) 下室田小学校(本体工事着工済～年度内完成予定) ・給食室設計 箕郷中学校(設計中～年度内終了予定)
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	35,087	—	
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	23年度事業計画
合計	—	—	
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	箕輪城跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成 3 年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡箕輪城跡(昭和 62 年 12 月 17 日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史的遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である箕輪城跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う。	史跡指定面積約 19ha 平成 15 年度 基本計画策定 平成 19 年度 発掘調査報告書刊行 平成 20 年度 基本設計策定着手 平成 21 年度 基本設計	

【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・整備に伴う発掘調査 ・実施設計(史跡地樹木伐採) ・追加指定検討 ・文化庁等協議 ・保存整備委員会開催 ・防空壕構造探査 	<ul style="list-style-type: none"> ・整備に伴う発掘調査 ・実施設計(史跡整備関連部分、防空壕埋戻工事) ・整備工事(樹木伐採) ・追加指定準備 ・保存整備委員会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・整備に伴う発掘調査 ・整備工事(樹木伐採・防空壕埋戻工事) ・追加指定関連機関等協議 ・保存整備委員会開催 	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	16,844	5,122	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備基本設計の策定(2年計画の2年次) ・史跡地内における草刈等の保存管理 ・保存整備委員会の開催(4月・7月・22年2月)
国	3,500	—	
県	1,050	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	12,294	5,122	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	11,512	—	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備基本設計の策定(22年度に繰越) ・保存整備基本設計策定に伴う説明会 ・史跡地内における草刈等の保存管理 ・整備に伴う発掘調査 ・樹木伐採の実実施設計策定 ・防空壕埋め戻しの確認調査 ・保存整備委員会の開催 ・追加指定検討
国	2,500	—	
県	750	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	8,262	—	
区分 (千円)	当初予算 額(案)	決算 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備実施設計の策定(防空壕埋戻・休憩所・園路) ・史跡地内における草刈等の保存管理 ・整備に伴う発掘調査 ・史跡整備工事(樹木伐採) ・保存整備委員会の開催 ・追加指定準備
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	箕郷地域内の石綿セメント管等の布設替えを行う。	箕郷地域の石綿セメント管残存延長 (平成 21 年度末 6,151m)	



【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
石綿セメント管等の布設替 1,700m	石綿セメント管等の布設替 1,500m	石綿セメント管等の布設替 1,400m	

【年度別推進状況】



区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	103,628	124,516	管網整備事業
国	—	—	・舗装復旧工事 A=6,144.3㎡
県	—	—	・配水管布設工事 L= 80.0m
地方債	42,800	38,000	・配水管布設替工事 L=2,665.7m
その他	—	—	
一般	60,828	86,516	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	86,291	—	管網整備事業
国	—	—	<執行実績>
県	—	—	・配水管布設替工事 L= 849.5m
地方債	41,800	—	・送水管布設工事 L= 147.4m
その他	—	—	<発注予定>
一般	44,491	—	・舗装復旧工事 A=1,670.0㎡
			・配水管布設替工事 L= 340.0m
			・配水管布設工事 L= 300.0m
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	管網整備事業
国	—	—	引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

上水道管網整備事業

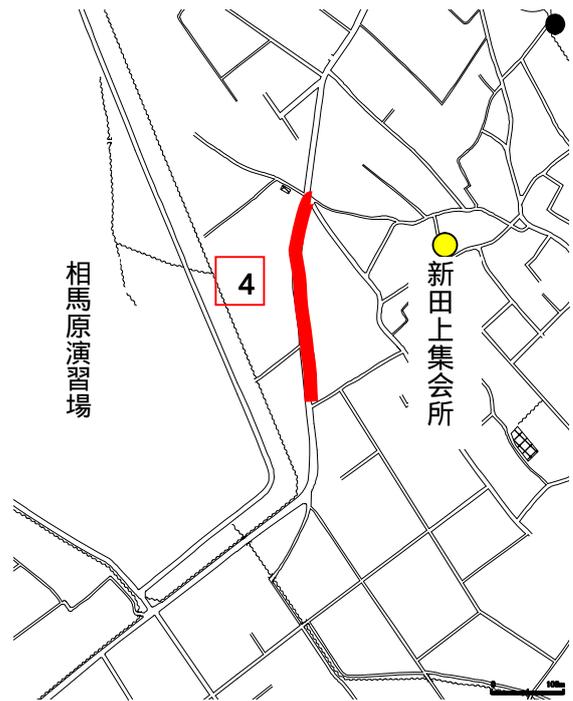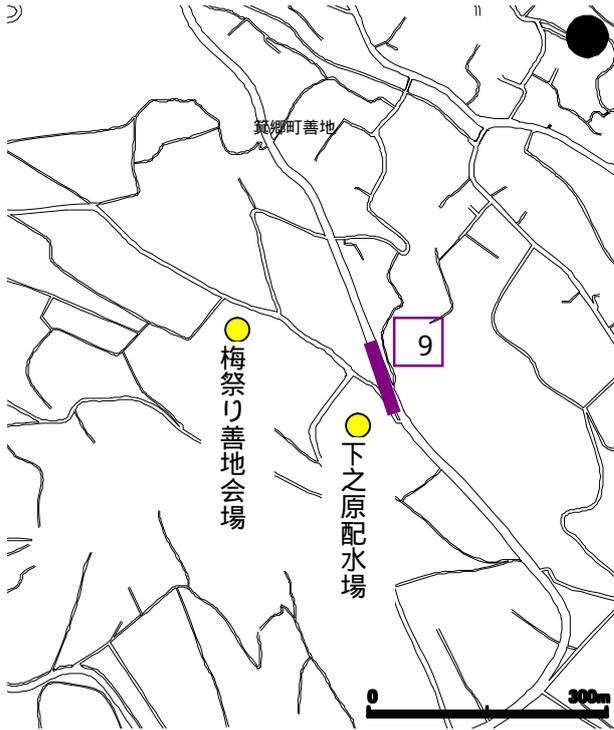

凡	例		
舗装復旧工事		1 西明屋・舗装復旧	A=1320 m ²
配水管布設替工事		2 西明屋・舗装復旧	A=1110 m ²
配水管布設工事		3 柏木沢・舗装復旧	A=350 m ²
送水管布設工事		4 柏木沢・配水管布設替	L=280.9m
		5 柏木沢・配水管布設替	L=359.2m
		6 生原・配水管布設替	L=209.4m
		7 生原・配水管布設替	L=340m
		8 富岡・配水管布設	L=300m
		9 善地・送水管布設	L=147.4m

上水道管網整備事業

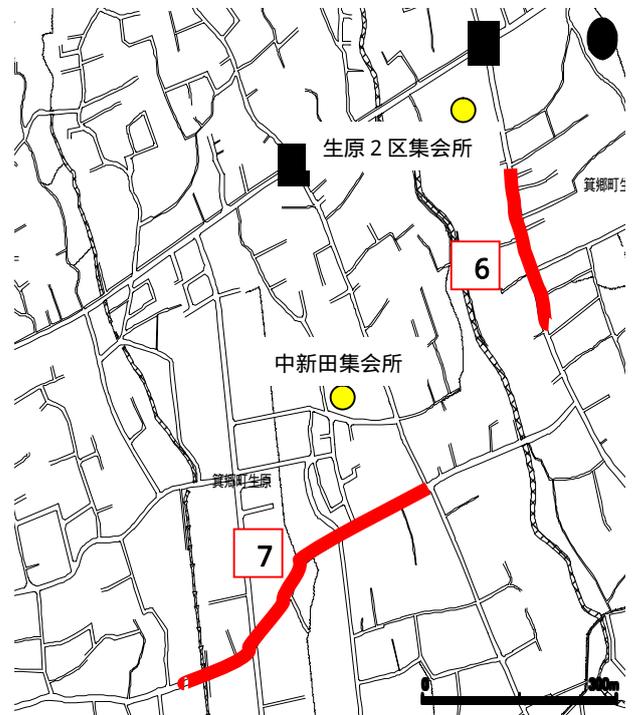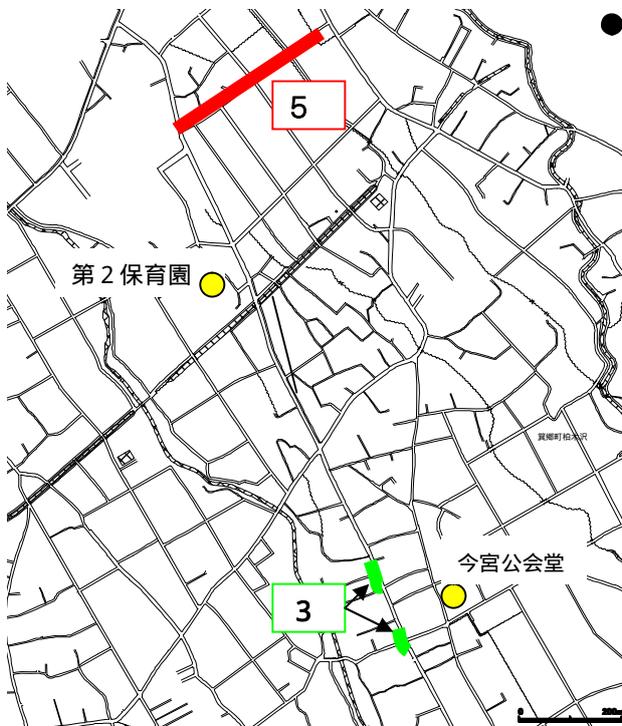

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

平成 2 2 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (箕郷上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成21年度末 整備面積 197.02ha 整備延長 39.92km	



【年度別事業計画】

平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	
下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,841m	

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	2 1 年 度 事 業 実 績
合計	119,417	113,580	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 管渠布設 L=1,166m
国	47,910	52,413	
県	0	300	
地方債	41,700	41,700	
その他	20,000	18,650	
一般	9,807	517	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	2 2 年 度 事 業 内 容
合計	103,931	—	下水道築造工事発注済 管渠布設 L=778.8m (H21繰越分) 管渠布設 L=526.3m 舗装復旧 A=7,602㎡
国	31,815	—	
県	—	—	
地方債	49,800	—	
その他	18,200	—	
一般	4,116	—	
区分 (千円)	当初予 算額(案)	決算額 見込額	2 3 年 度 事 業 計 画
合計	—	—	下水道築造工事発注予定 管渠布設 L=1,841m
国	—	—	
県	—	—	
地方債	—	—	
その他	—	—	
一般	—	—	

污水管渠整備事業

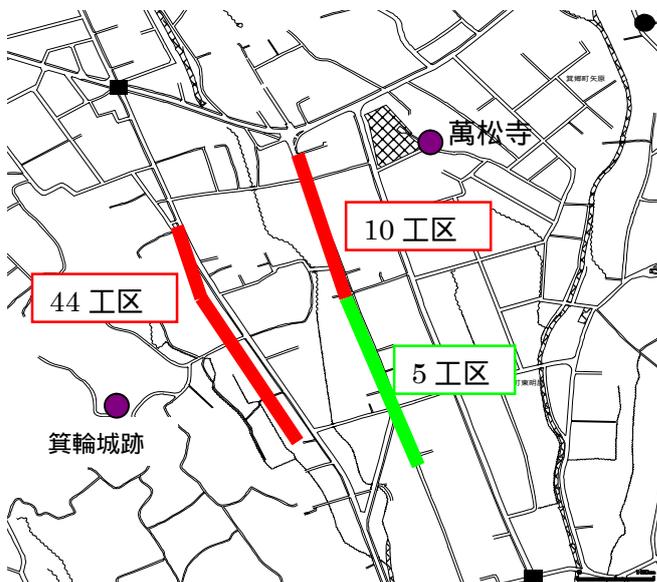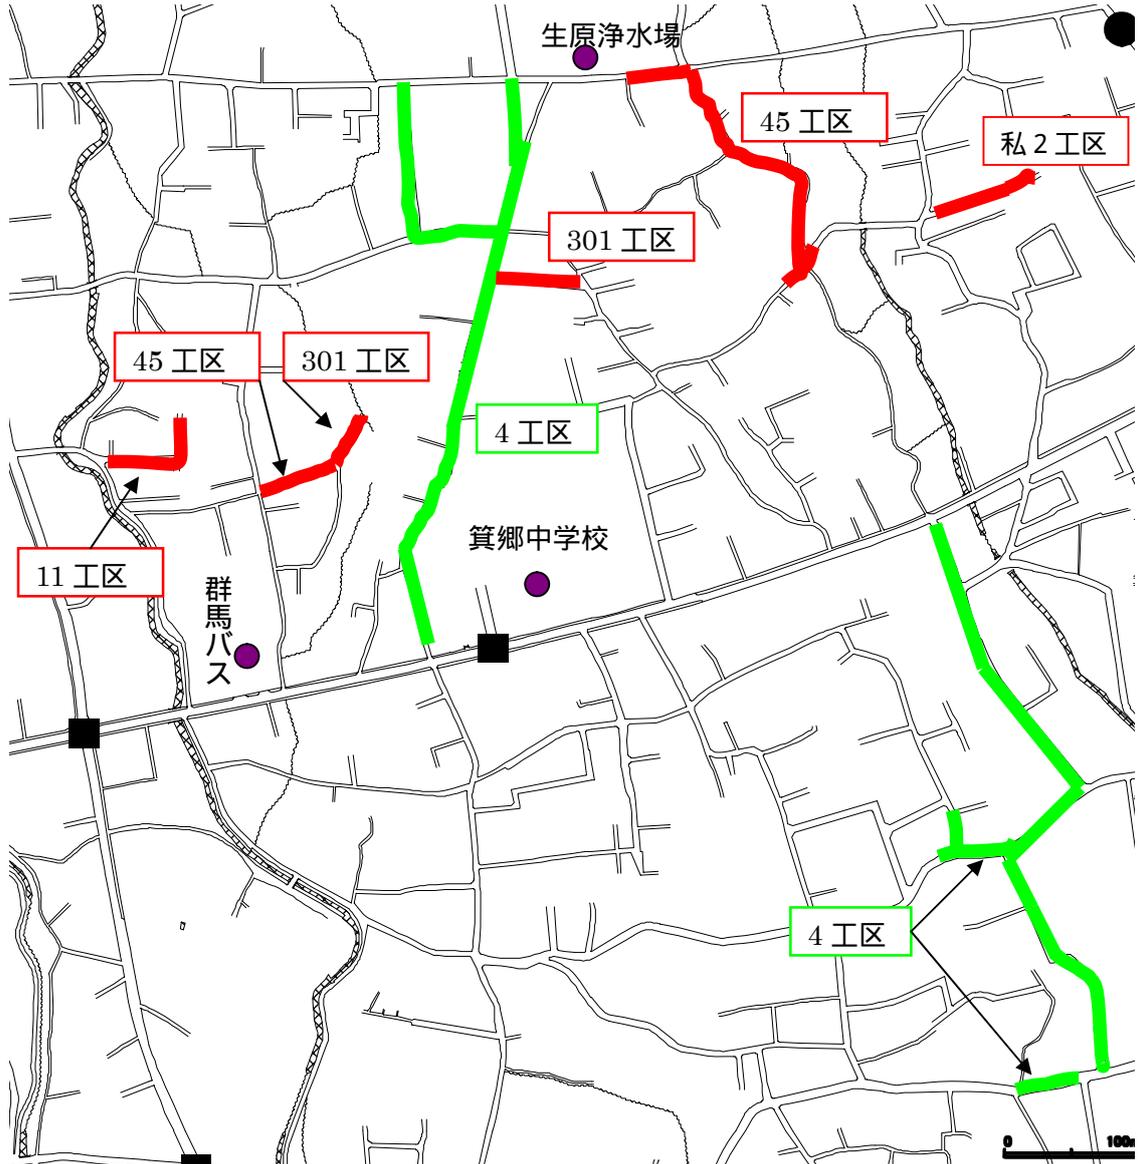

凡	例
管渠布設工事	
舗装復旧工事	

第 44 工区	東明屋・管渠	L=386.7m
第 45 工区	生原・管渠	L=392.1m
第 10 工区	東明屋・管渠	L=237.4m
第 11 工区	生原・管渠	L=109.4m
第 301 工区	生原・管渠	L=88.5m
私道第 2 工区	生原・管渠	L=91.0m
第 4 工区	生原・舗装	A=6741 m ²
第 5 工区	東明屋・舗装	A=861 m ²
