

平成26年度 第2回 高崎市箕郷地域審議会

箕郷地域に関わる事業報告書

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 富岡生原線街路事業 | … P. 1～P. 4 |
| ② 箕郷地域住民センター設置事業 | … P. 5 |

平成26年11月13日

箕郷地域に関わる事業報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	富岡生原線街路事業	所属 (支所)	都市整備部都市施設課 (箕郷支所 建設課)
実施期間	平成20年度～平成28年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	富岡生原線		
実施目的	具体的手段	そ の 他	
前橋方面に向かう車が増大するとともに、沿線にはさわやか交流館や総合運動場があり児童、生徒の利用頻度が高い。道路両側に歩道を確保することにより、自転車歩行者の安全を図る。	用地買収及び道路改良工事により整備する。	延長 L=680m 幅員 w=12m 整備済み L=485m 進捗率 73%	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	16,783	3,525	・工事内容 用水路横断暗渠工
国	9,038	2,600	
県			
地方債			
その他			
一般	7,745	925	


【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	95,251	・用地買収及び物件補償
国	51,150	
県		
地方債		
その他		
一般	44,101	




案内図

富岡生原線 街路事業

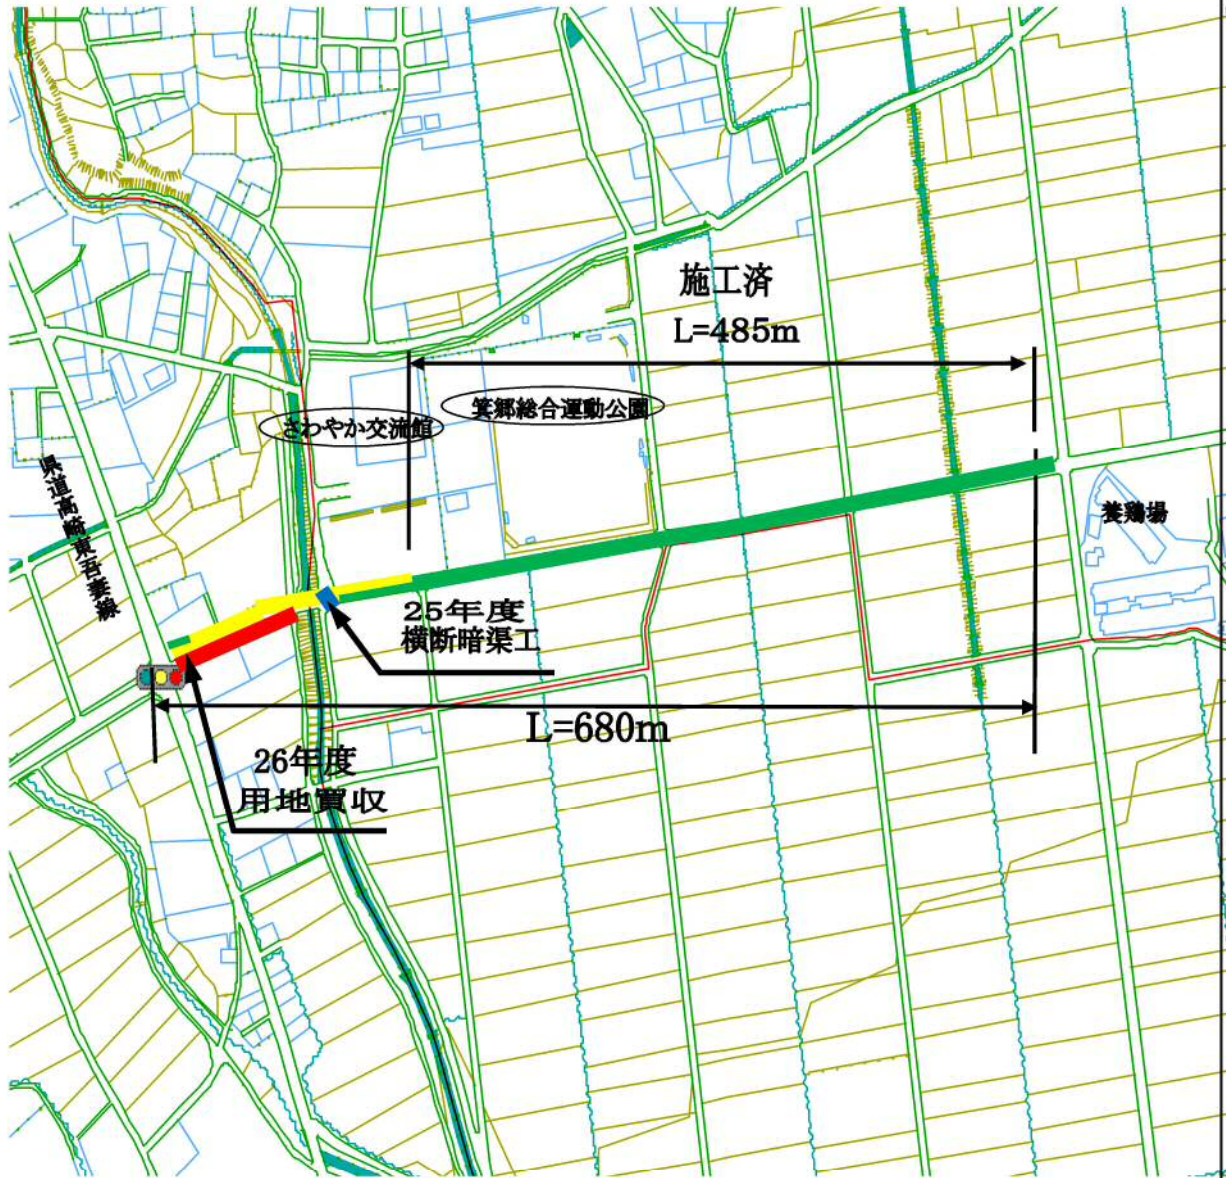

標準横断面図

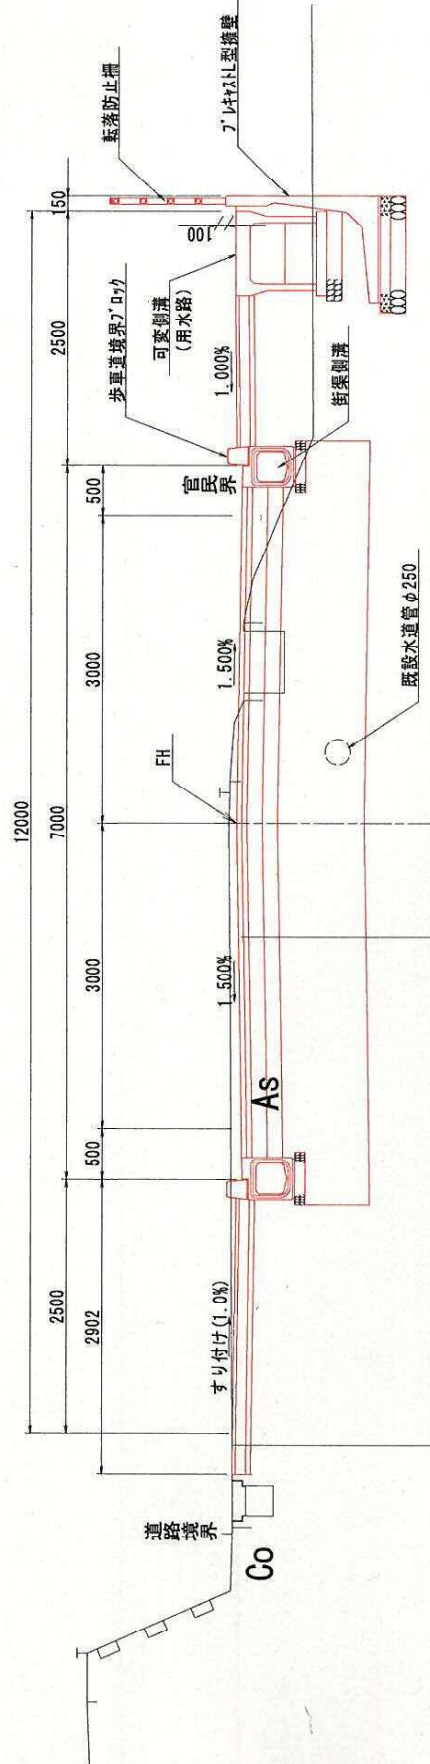

表層工：透水性アスコン t=3cm
 路盤工：再生砕石(30-0) t=10cm
 2/4分層：山砂 t=5cm

表層工：再生密粒度73コ t=5cm
 基層工：粗粒度73コ t=5cm
 上層路盤工：粗調砕石(M-30) t=15cm
 下層路盤工：再生砕石(RC-40) t=15cm
 路床置換工：山砕石(CBR20以上) t=85cm

図種		標準横断面図	
区分		No.	図号
実施年度	平成22年度	4	27
図名	都市計画道路3・5・9号環生原線	尺	S=1/50
工事箇所	高岡市東郷町上芝・生原地区内	工事名	道路築造工事
実施場所		高岡市 都市整備部 都市施設課	
実施会社名	協和建設コンサルタント株式会社		
実施担当者名	木暮 雄	実施年月日	平成21年 2月
設計会社名	協和建設コンサルタント株式会社		
設計担当者名	木暮 雄	設計年月日	平成21年 2月
照査	設計	製図	


富岡生原線 街路事業

●平成26年度用地買収予定箇所 全景



●平成25年度 横断暗渠施工済箇所
(さわやか交流館南側付近)



 用地買収予定箇所

箕郷地域に関わる事業報告書

平成26年9月30日現在

事務事業名	箕郷地域住民センター設置事業	所属 (支所)	総務部企画調整課 (箕郷支所地域振興課)
実施期間	平成20年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対 象	実施目的	具体的手段	そ の 他
	地域住民のコミュニティ活動の拠点となる住民センターを整備することにより、市民参加と地域づくりの推進を図る。	防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、地区集会所を整備する。	

【事業実施状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	25年度事業実績
合計	46,317	46,275	<ul style="list-style-type: none"> ・今宮地区集会所解体工事(木造平屋建て) ・今宮地区集会所建設工事(木造平屋建て)
国	44,062	40,642	
県			
地方債			
その他			
一般	2,255	5,633	

【事業予定】

区分 (千円)	当初 予算額	26年度事業予定
合計	3,037	<ul style="list-style-type: none"> ・第3区地区集会所設計委託
国	2,539	
県		
地方債		
その他		
一般	498	
