

## 群馬地域に関わる事業について

ページ	部門	事務事業名	担当課名 ( )内は群馬支所担当課
1	教育・文化	堤ヶ岡第二小学校(仮称)建設事業	教育総務課 (群馬教育課)
2	教育・文化	保渡田古墳群保存整備事業	文化財保護課 (群馬教育課)
3	都市・建設	菅谷南線道路事業	都市施設課 (建設課)
4	健康・福祉	放課後児童健全育成事業	こども家庭課 (福祉課)

# 新市建設（基本）計画実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

ハード事業名	堤ヶ岡第二小学校（仮称）建設事業			実施地区	群馬地域	
実施期間	平成18年度～平成20年度		所管課名	教育部教育総務課		
新市建設（基本）計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容（P.40）						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
		用地取得 用地造成 設計 地質調査	校舎建設	校舎建設 プール建設 体育館建設 備品購入等	用地取得 H18 設計 H18 校舎建設 H19～20 プール等建設 H20	
実施計画額	合計（千円）	689,456	520,000	1,410,000	2,619,456	
	財源	国庫支出金	0	203,705	407,975	611,680
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	541,500	267,700	560,800	1,370,000
		その他	140,000	0	298,000	438,000
		一般財源	7,956	48,595	143,225	199,776
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	689,456	582,826	用地取得 26,809.48 m <sup>2</sup> 契約額 560,318,132 円(登記完了 H18.7.5)			
国	0	0	測量 契約額 5,775,000 円(H18.6.9～H19.2.28)			
県	0	0	埋蔵文化財発掘調査実施（文化財保護課）			
市債	541,500	532,300	地質調査 契約額 2,278,500 円(H18.11.28～H19.1.31)			
その他	140,000	41,000	校舎等新築設計 契約額 43,575,000 円(H18.9.16～H19.3.26 繰越予定)			
一般	7,956	9,526				
区分（千円）	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績			
合計	403,106	479,724	校舎・屋内運動場新築工事 契約額 1,413,300,000 円（H19.9.29～H21.1.30）			
国	99,960	124,854	校舎・屋内運動場新築電気設備工事 契約額 173,250,000 円（H19.9.29～H21.1.30）			
県	0	0	校舎・屋内運動場新築給排水衛生設備工事 契約額 87,150,000 円（H19.10.30～H21.1.30）			
市債	251,100	217,700	校舎・屋内運動場新築空調設備工事 契約額 107,100,000 円（H19.10.30～H21.1.30）			
その他	37,000	37,000	下水道工事実施（下水道局整備課） 負担金 22,521,225 円			
一般	15,046	100,170	《H18年度からの繰越分》 校舎等新築設計（繰越～H19.6.30） 造成工事（1期） 契約額 39,543,000 円（H19.4.28～H19.10.31） 造成工事（その2） 契約額 7,140,000 円（H19.11.27～H20.3.10） 造成工事（その3） 契約額 10,216,500 円（H19.11.27～H20.3.10）			
区分（千円）	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業内容			
合計	1,770,943	-	校舎・屋内運動場新築（電気設備、給排水衛生設備、空調設備）工事（継続～H21.1.30）			
国	334,205	-	プール建設工事 契約額 85,575,000 円（H20.8.22～H21.2.27）			
県	-	-	外構工事 契約額 100,590,000 円（H20.9.11～H21.3.13）			
市債	1,031,500	-	校庭整地工事 契約額 19,740,000 円（H20.12.2～H20.3.25）			
その他	348,310	-	外周道路工事（その1） 契約額 13,839,000 円（H20.10.11～H20.3.13）			
一般	56,928	-	外周道路工事（その2） 契約額 6,667,500 円（H20.11.22～H21.3.16）			
			植栽工事 契約額 24,465,000 円（H20.10.28～H21.3.13） 備品購入			

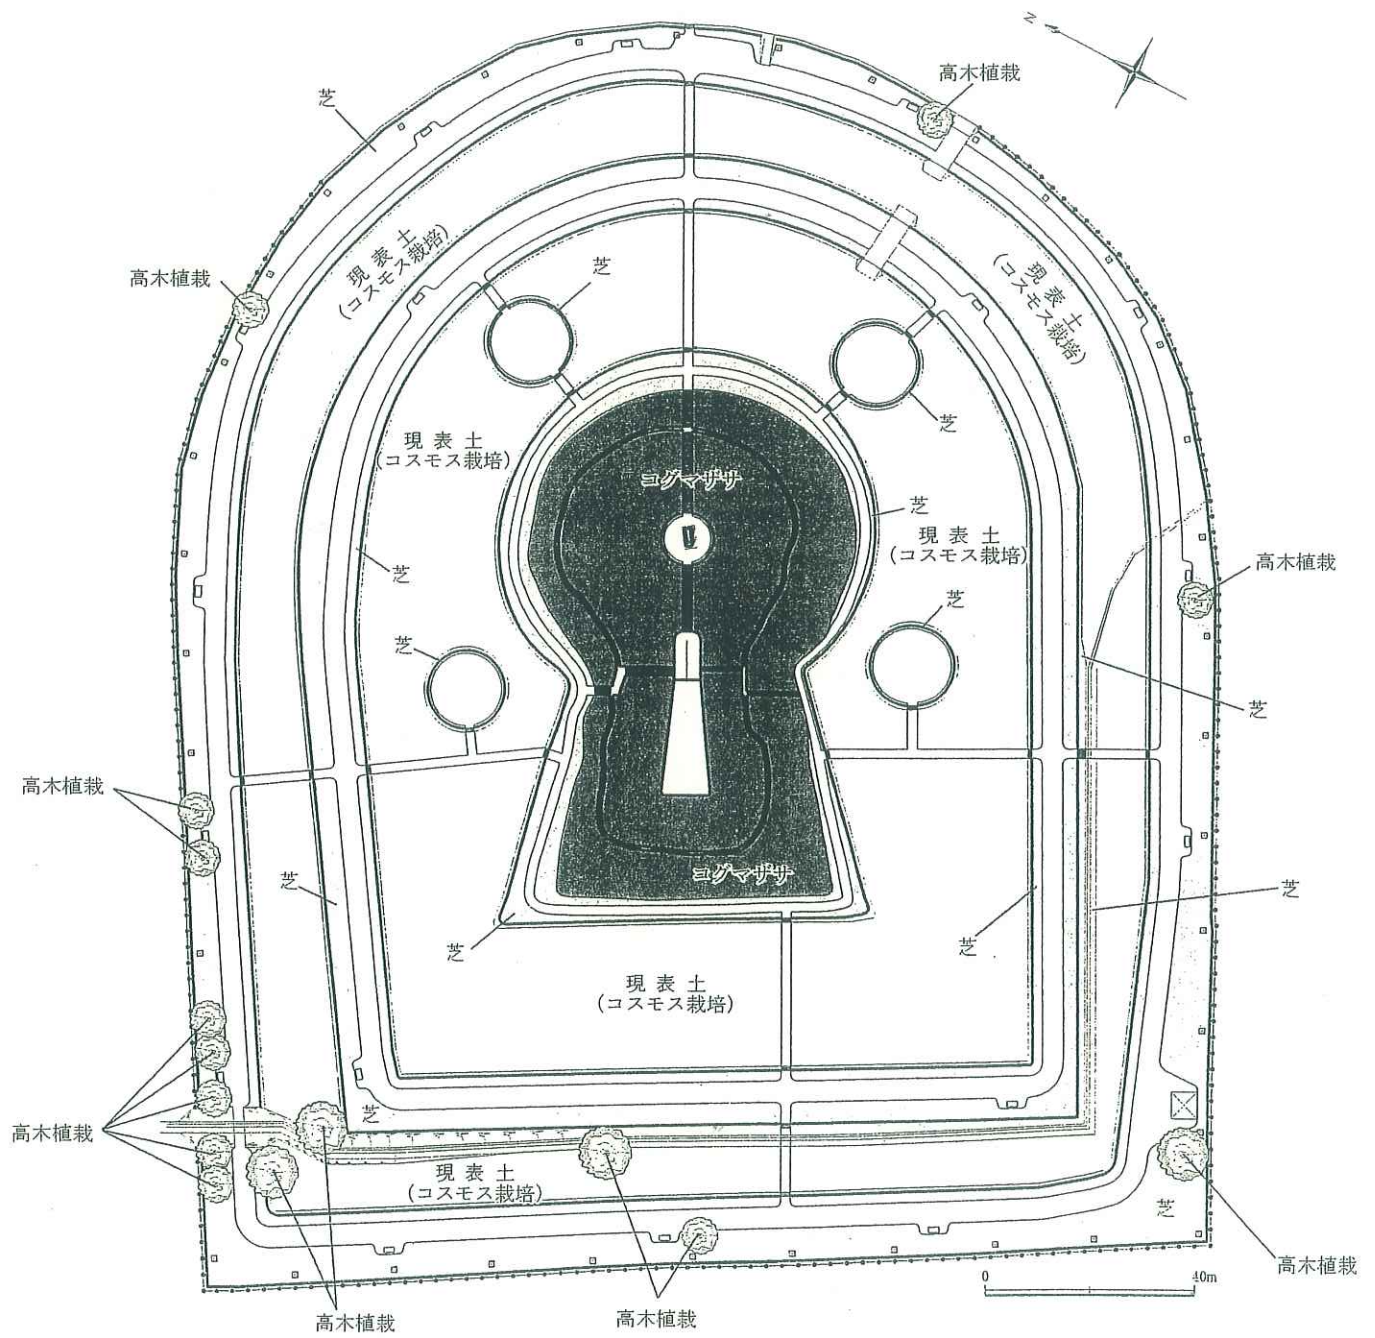




写真1 二子山古墳整備完成状況




写真2 墳頂部石棺原寸大写真（陶板製）



## 新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

ハード事業名		菅谷南線道路事業			実施地区	群馬地域
実施期間		平成18年度～平成21年度			所管課名	都市整備部都市施設課
新市建設（基本）計画実施計画書（平成18年度～平成20年度）計画内容(P.89)						
事業計画	平成17年度以前	平成18年度	平成19年度	平成20年度	全体計画（累計）	
		用地買収 物件移転補償 測量委託	用地買収 物件移転補償	用地買収 物件移転補償	総事業費： 269,000千円 延長：170m 幅員：17m	
実施計画額	合計（千円）		58,000	90,000	88,000	236,000
	財源	国庫支出金	31,900	49,500	48,400	129,800
		県支出金	0	0	0	0
		地方債	24,700	38,400	37,600	100,700
		その他	0	0	0	0
	一般財源	1,400	2,100	2,000	5,500	
区分（千円）	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績			
合計	58,000	32,706	関係者の立会いが済み、道路詳細設計完成。 事業用地買収実績 ・ 用地買収費 17,813,460円（10件） ・ 補償費 1,967,309円（4件）残地補償及び工作物移転補償			
国	31,900	17,875				
県	0	0				
市債	24,700	0				
その他	0	0				
一般	1,400	14,831				
区分（千円）	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績			
合計	96,709	180,113	平成19年7月31日契約済み （昨年12月末に建物・工作物解体済み） 文化財発掘調査			
国	52,250	99,000				
県	0	0				
市債	0	0				
その他	0	0				
一般	44,459	81,113				
区分（千円）	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業内容			
合計	63,195	53,013	文化財発掘調査終了 道路築造工事（栗原組施工・9/23～3/6）L=197.7m W=17m			
国	33,000	28,089				
県	0					
市債	0					
その他	0					
一般	30,195	24,924				

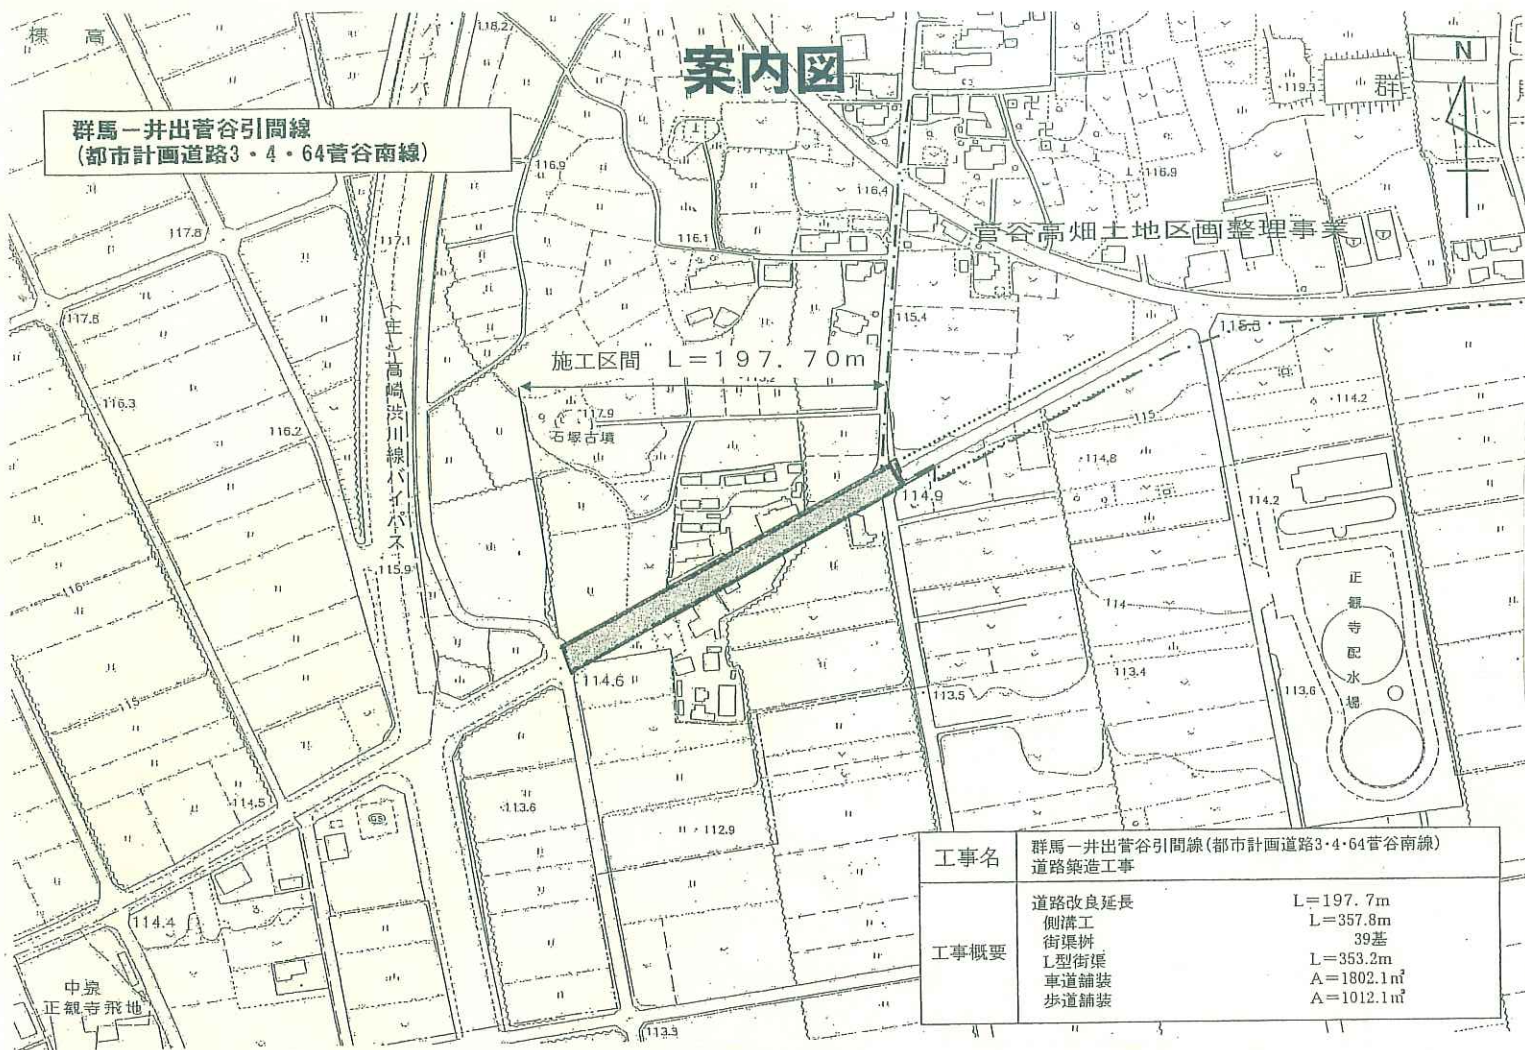

平成 21 年 3 月 17 日

## 新市基本計画実施計画事業推進状況報告書

平成21年3月19日現在

ソフト事業名		放課後児童健全育成事業		実施地区	高崎市
実施期間		全期	所管課名	こども家庭課	
新市基本計画実施計画書(平成18年度～平成20年度)計画内容(P.22)					
事業計画	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備		・放課後児童クラブの実施 ・放課後児童クラブの施設整備
実施計画額	年度		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	項目				
	合計(千円)		216,916	255,494	265,072
	財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	100,599	115,559	124,025
		地方債	0	0	0
その他		15,945	15,945	15,945	
一般財源		100,412	123,990	125,102	
区分(千円)	18年度当初予算額	18年度決算額	18年度事業実績		
合計	216,916	282,004	・実施状況は、51クラブ、児童数2,439人で実施		
国	0	0	・施設状況は、専用施設31か所、余裕教室9か所、公有地専用施設6か所、その他5か所		
県	100,759	123,838	・専用施設整備(建設2か所、購入1か所)		
市債	0	0	事業費 282,004千円		
その他	15,945	16,396			
一般	100,212	141,770			
区分(千円)	19年度当初予算額	19年度決算額	19年度事業実績		
合計	304,384	324,058	・実施状況は、55クラブ、児童数2,561人で実施		
国	0	0	・施設状況は、専用施設31か所、余裕教室9か所、公有地専用施設8か所、その他7か所		
県	124,756	136,060	・専用施設設備(建設3か所)		
市債	0	0	事業費 324,058千円		
その他	18,622	14,391			
一般	161,006	173,607			
区分(千円)	20年度当初予算額	20年度決算見込額	20年度事業内容		
合計	383,156		3月19日現在		
国	0		・実施は61クラブで実施		
県	147,177		・施設は、専用施設36か所、余裕教室8か所、公有地専用施設7か所、その他10か所		
市債	0		・専用施設整備予定(桜山小学校、矢中小学校)		
その他	19,988				
一般	215,991		堤ヶ岡第二小学校(仮称)区放課後児童クラブ室建設工事に係る費用《工事請負費》 38,325,000円		



登録児童数に応じた放課後児童指導員の配置基準（群馬県）

登録児童数	19人まで	20人～40人まで
放課後児童指導員数	2人以上	3人以上

※安全面への確保を図るため、常時、基準人数を満たす指導員の配置を行うこと。  
 ※児童数が40人を超えた場合、10人増すごとに指導員1名を追加配置することが適当である。

群馬地域の学童保育クラブの状況（平成20年4月1日現在）

学童保育 クラブ名称	金古学童 保育クラブ	金古南学童 保育クラブ	国府学童 保育クラブ	堤ヶ岡学童 保育クラブ	上郊学童 保育クラブ
登録児童数	39人	45人	41人	80人	58人
放課後児童 指導員数	常勤 2人 非常勤 3人	常勤 2人 非常勤 2人	常勤 2人 非常勤 2人	常勤 2人 非常勤 3人	常勤 1人 非常勤 6人

予想される桜山小学校（平成21年4月開校）学童保育クラブ

学童保育 クラブ名称 (仮称)	桜山第一学童 保育クラブ	桜山第二学童 保育クラブ
登録児童数 (予定)	30人	30人
放課後児童 指導員数 (予定)	常勤 1人 非常勤 3人	常勤 1人 非常勤 3人



南側より撮影



北側より撮影



保育室




キッチン



静養スペース兼事務スペース



多目的トイレ

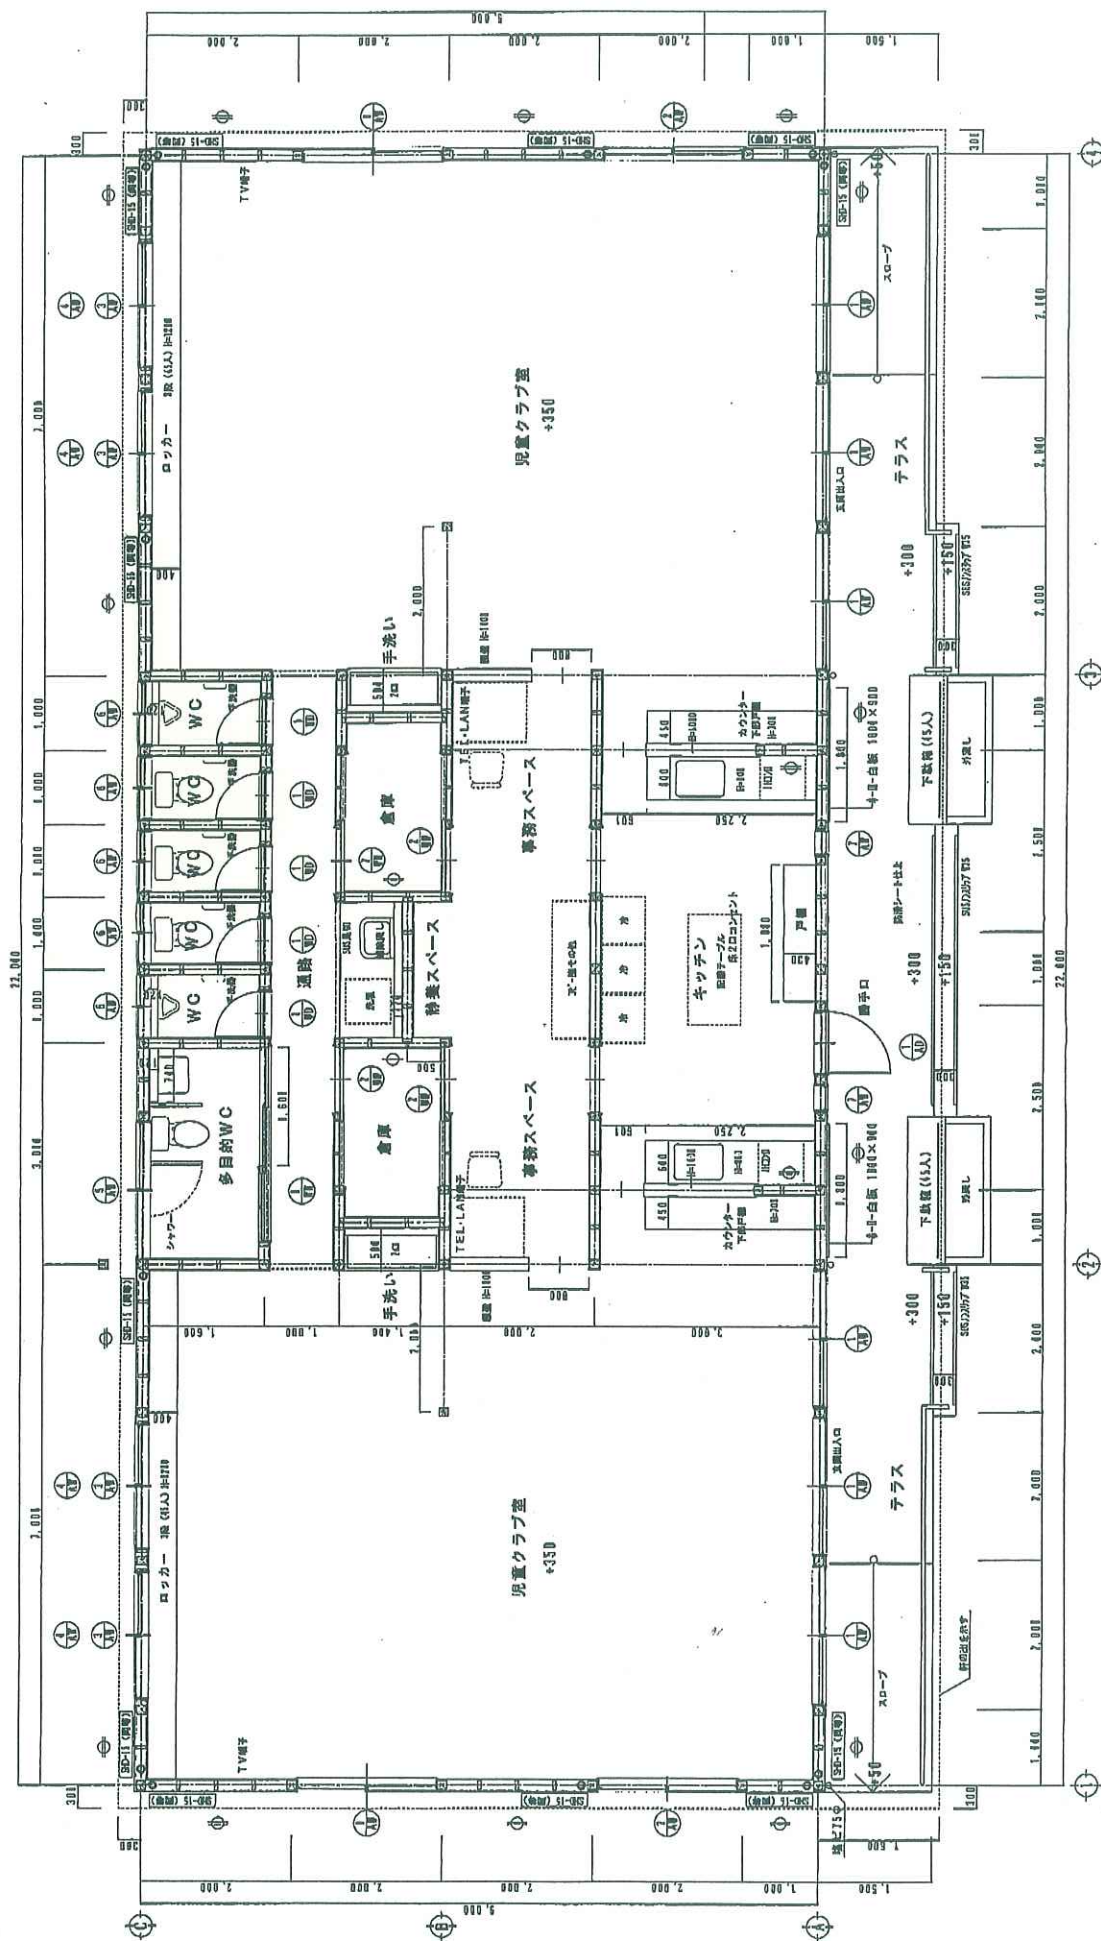

凡例

□ 柱 120x120

○ 筋材 90x45

◎ 筋材 90x90

○ 引手等準拠：S10-15 (4等)

※ 内容社上一文字、点、線画、欄内、器具等  
 すべて標準仕様準拠（下書き等）を引用

平面図 S=1/50
