

第5次総合計画前期実施計画事業の推進状況について

ページ	部門	事務事業名	担当課名 ()内は群馬支所担当課
1	教育・文化	生涯学習センター・男女共同参画センター（仮称）建設事業	教育施設企画室 （群馬教育課）
2	教育・文化	北谷遺跡保存整備事業	文化財保護課 （群馬教育課）
3	教育・文化	群馬地域運動広場（仮称）整備事業	教育施設企画室 （群馬教育課）
4	環境・安全	三ツ寺公園整備事業	公園緑地課 （建設課）
5	都市・建設	群馬中央第二土地区画整理事業	区画整理1課
6	都市・建設	菅谷高畑土地区画整理事業	区画整理1課
7	都市・建設	上水道管網整備事業（石綿セメント管の付設替）	水道局工務課 （上下水道事務所）
8	都市・建設	汚水管渠整備事業	下水道局整備課 （上下水道事務所）

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（36項）

平成 21 年 9 月 30 日現在

事務事業名	生涯学習センター・男女共同参画センター(仮称)建設事業	所属 (支所)	教育部教育施設企画室 (群馬教育課)
実施期間	平成18年～平成23年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	社会教育施設(生涯学習センター)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
現在の群馬公民館は、昭和48年に建設され、築33年が経過し老朽化している。公民館に変わる施設を建設し、より一層の地域住民の生涯学習の向上の場としたい。	旧中央中学校の跡地に、群馬地区の生涯学習センター(仮称)を建設する。	平成19年建設委員会設立 基本構想 平成20年基本構想 平成21年基本設計 実施設計 平成22年本体工事 平成23年本体工事・完成	

【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
基本構想	基本構想 基本設計	本体工事	本体工事 完 成	開 館

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	5,000	4,620	・基本構想策定委託
国			
県			
地方債			
その他			
一般	5,000	4,620	
合計	67,966	見込額	21年度事業内容
国			・基本構想策定 ・基本設計、実施設計 ・柔剣道場解体 ・用地買収
県			
地方債	38,200		
その他			
一般	29,766		
合計		見込額	
国			・実施設計 ・本体工事 <参考> 23年度 ・本体工事 ・外構工事 24年度 開館
県			
地方債			
その他			
一般			
合計			

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（62項）

平成 2 1 年 9 月 3 0 日現在

事務事業名	北谷遺跡保存整備事業	所属 (支所)	教育部文化財保護課 (群馬教育課)
実施期間	平成12年度～全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	学校施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
国指定史跡北谷遺跡(平成17年7月14日指定)を適切に保存・管理するとともに、市民共通の文化的・歴史遺産として活用を図る。	市民共有の文化的・歴史的遺産である北谷遺跡を後世に伝えて行くとともに、憩いの場、歴史学習の場として広く活用を図るため、史跡公園として整備を行う、	全体面積 4.2ha 平成12年度～15年度 範囲確認発掘調査 平成16年度 調査報告書刊行 平成18年度 説明板設置 平成19年度までの事業進捗率 2%	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
史跡整備計画(保存管理計画)策定準備 2次指定(住宅地)に向け、文化庁等との協議	史跡整備計画(保存管理計画)策定 史跡整備用地買収準備 保存整備委員会発足	史跡地の2次指定 史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催	史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催	史跡指定地の用地買収 保存整備委員会開催

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	409	278	・説明板設置場所の管理(除草等)(6月・8月・9月) ・文化庁等との協議
国	0	0	
県	0	0	
地方債	0	0	
その他	0	0	
一般	409	278	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	409		・説明板設置場所の管理(除草等) ・保存管理計画に向けた下準備 ・二次指定に向けて文化庁等との協議
国	0		
県	0		
地方債	0		
その他	0		
一般	409		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計			
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

北谷遺跡指定範囲

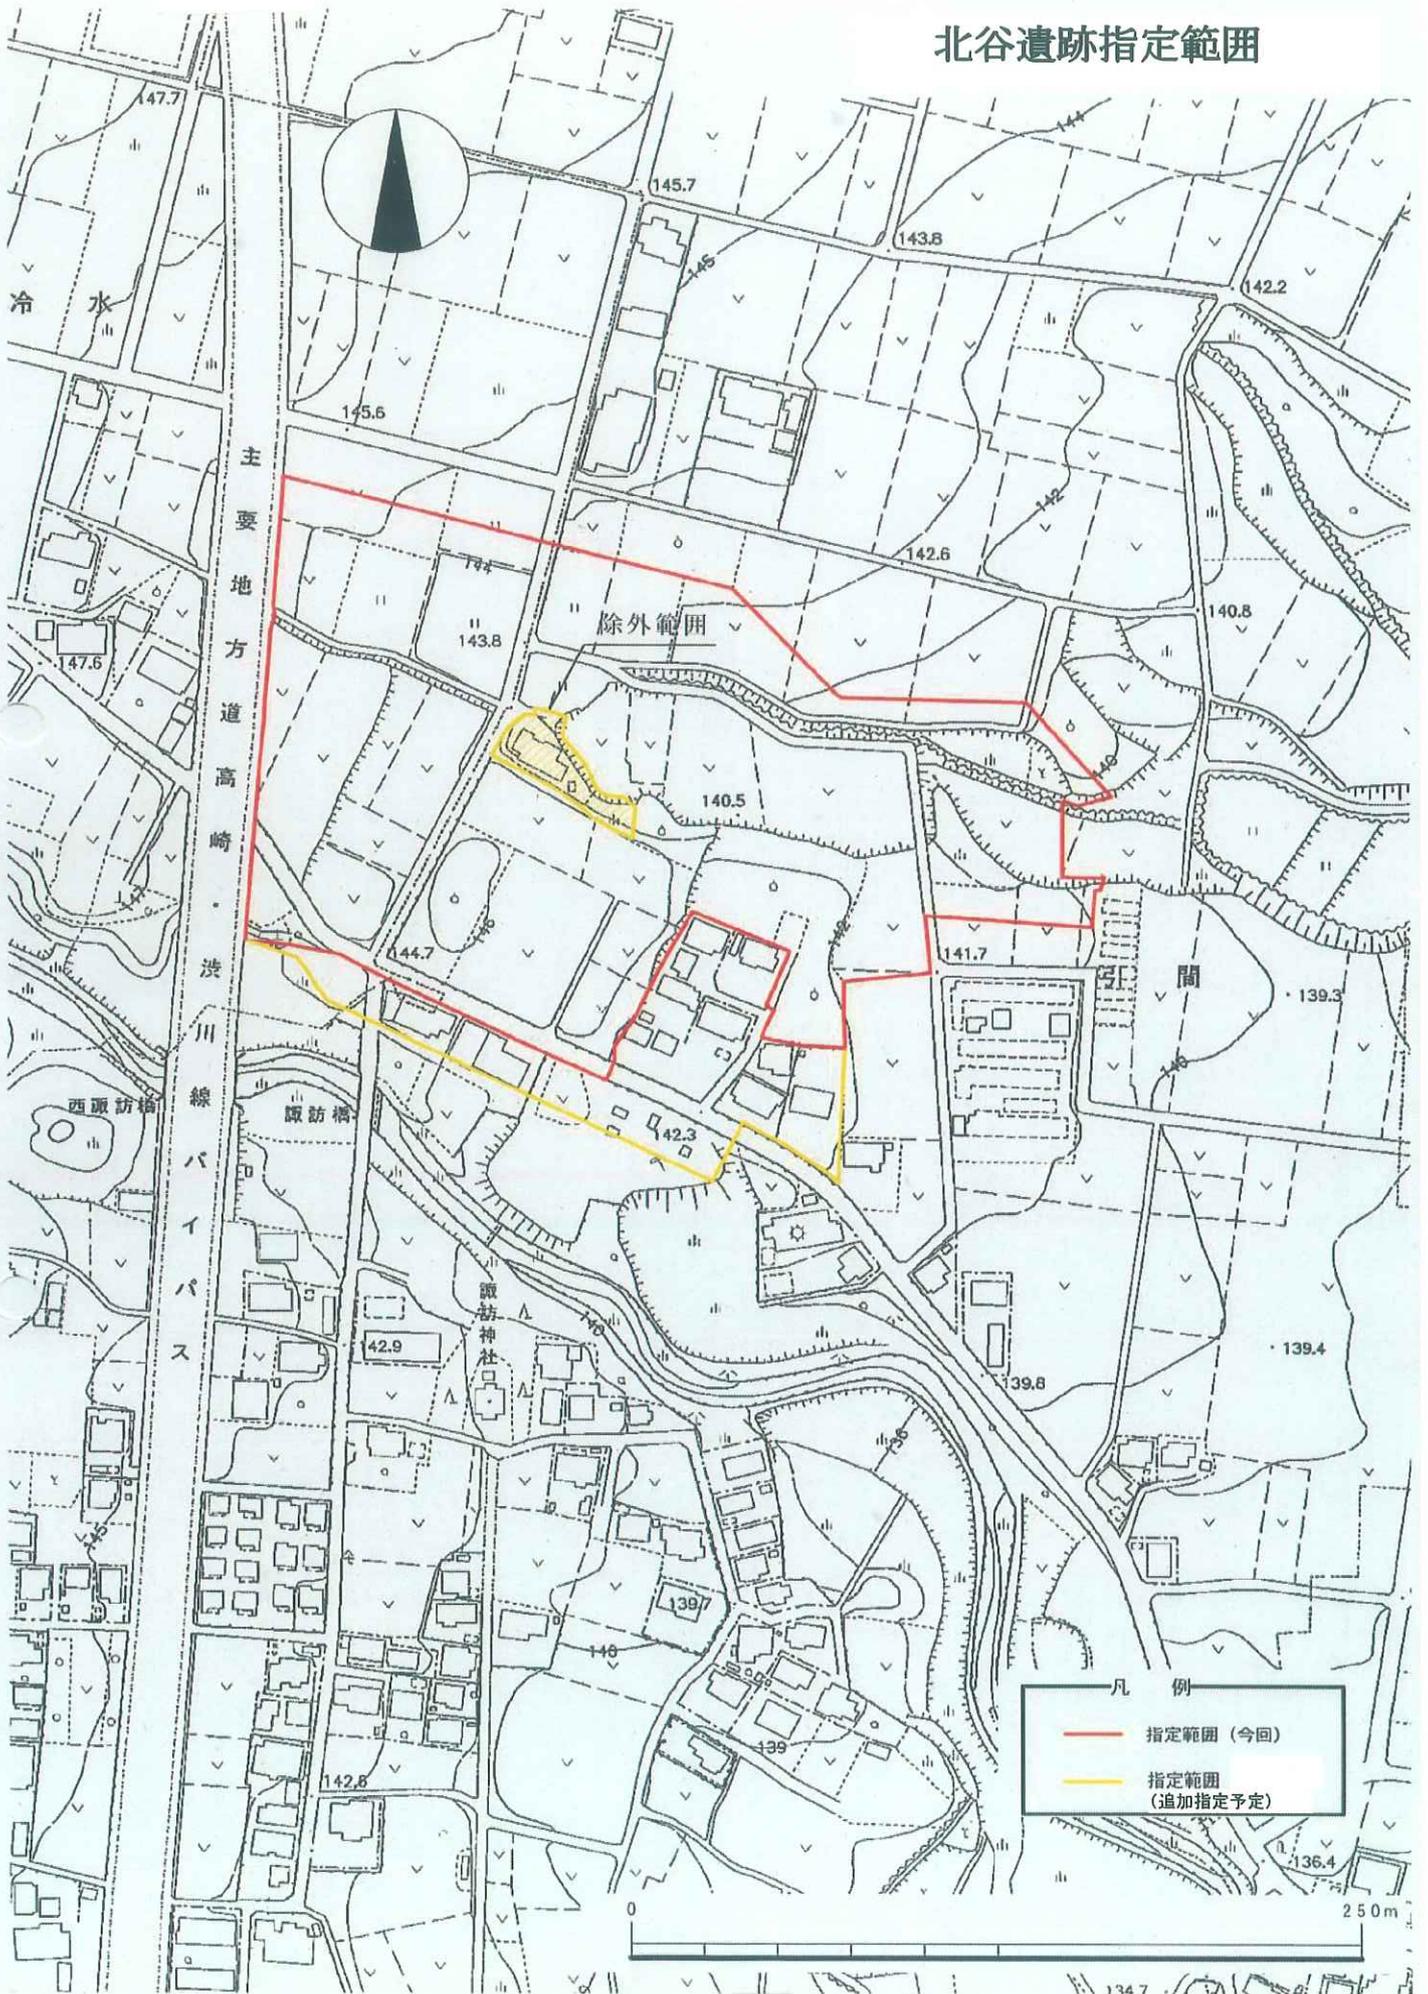

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（64項）

平成21年9月30日現在

事務事業名	群馬地域運動広場(仮称)整備事業	所属 (支所)	教育部教育施設企画室 (群馬教育課)
実施期間	平成18年度～平成22年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	社会体育施設(野球場・多目的運動場)		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
生涯スポーツによる健康増進及び体育施設の充実を計るため新設野球場を建設する。併設施設として多目的運動場を整備する。	建設検討委員会を設置後、野球場の規模や構造等を確定させる。地権者の了承により、用地を買収し、建設工事を進める。	平成19年候補地決定 平成20年測量調査・事業認定取得・用地買収・用地買収・基本設計 平成21年用地買収・実施設計・建設工事 平成22年建設工事・完成	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
測量調査・事業認定取得・用地買収・基本設計・埋蔵文化財調査	用地買収 埋蔵文化財調査 実施設計 建設工事	建設工事 完 成		

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	475,020	2,181	・事業認定及び基本設計 ・用地測量 ・不動産鑑定
国			
県			
地方債	434,500	0	
その他			
一般	40,520	2,181	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	911,321		・事業認定及び基本設計 ・実施設計 ・用地買収
国			
県			
地方債	862,900		
その他			
一般	48,421		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画
合計			・実施設計 ・整備工事 <参考> 23年度 ・整備工事
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

施設概要

施設区分	用途・規格等
野球場 (1面)	両翼:95m 中堅:120m 社会人軟式野球に対応した野球場で、主に社会人や学生が利用できるとともに、各種野球大会、スポーツイベント及び審判講習会を開催します。
少年野球場 (1面)	両翼:71m 中堅:86m 少年軟式野球に対応した野球場で、子どもが利用できるとともに、各種少年野球大会、少年野球教室及びスポーツ指導者の講習会を開催します。
レクリエーション 広場	主に高齢者や子どもたちが、グラウンドゴルフや遊び等のレクリエーション活動に利用できる広場で、施設利用者の休憩場所としても利用できます。また、グラウンドゴルフ大会、レクリエーション大会及びニュースポーツ教室などを開催します。
管理棟 エリア	施設利用案内・予約受付、レクリエーション用具の貸出し及びスポーツ・レクリエーション情報の提供を行います。 駐車場5台
便所	高齢者や身体の不自由な方にも配慮した施設利用者のための便所です。
駐車場	駐車可能台数150台 (うち障害者用3台)
緑地	周辺環境や景観にも配慮した植栽を行います。
進入路・通路	進入路は、自動車の出入りを考慮し、幅員を6mとしました。また、各施設を結ぶ通路は、幅員を3mとし、散歩、ウォーキング及びジョギングコースとしても利用できます。
付替市道	市道群馬 - 1 - 222号線 幅員5.5m 本事業に施行に伴い遮断される市道を付け替えるもので当該市道の従前の機能を維持するものです。

群馬地域運動広場(仮称)整備事業スケジュール

年月日 作業種別	平成20年度			平成21年度												平成22年度												平成23年度																																
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																					
基本計画・事業認定	←————→			←————→																																																								
用地買収													←————→																																															
文化財発掘調査																									←————→ 試掘期間			←-----→ 試掘結果により半年から1年程度																																
運動広場実施設計策定													←————→																																															
建築物実施設計書策定													←————→																																															
運動広場整備工事																																					←————→ 野球場(H23年3月完成)												←————→ 野球場以外の施設整備											
スタンド建設工事																																					←————→																							

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（78項）

平成21年9月30日現在

事務事業名	三ツ寺公園整備事業	所属 (支所)	都市整備部公園緑地課 (群馬支所建設課)
実施期間	平成5年度～平成21年度	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	公園施設		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
市民が1日ゆったり憩える総合公園を整備する。市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供すること。	親水エリアをメインとした1期整備に引き続き、運動・遊戯広場をメインにした2期分を隣接する北部地区に整備する。	全体整備面積：10.8ha 平成5年度～平成21年度 1期整備(完成)：6.0ha 2期整備(継続)：4.8ha	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
造成・遊具施設工事	運動施設工事			

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	207,000	205,452	設計委託、測量・ 用地造成工事・遊具設置工事・多目的広場設置工事 完 成 平成21年3月17日
国	100,000	99,118	
県			
地方債			
その他			
一般	107,000	106,334	
合計			21年度事業内容 ソフトボール場設置、大型複合遊具設置、その他 完 成 平成22年3月予定
国	100,000		
県			
地方債			
その他			
一般	100,000		
合計			22年度事業計画
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

三ツ寺公園整備工事完成図

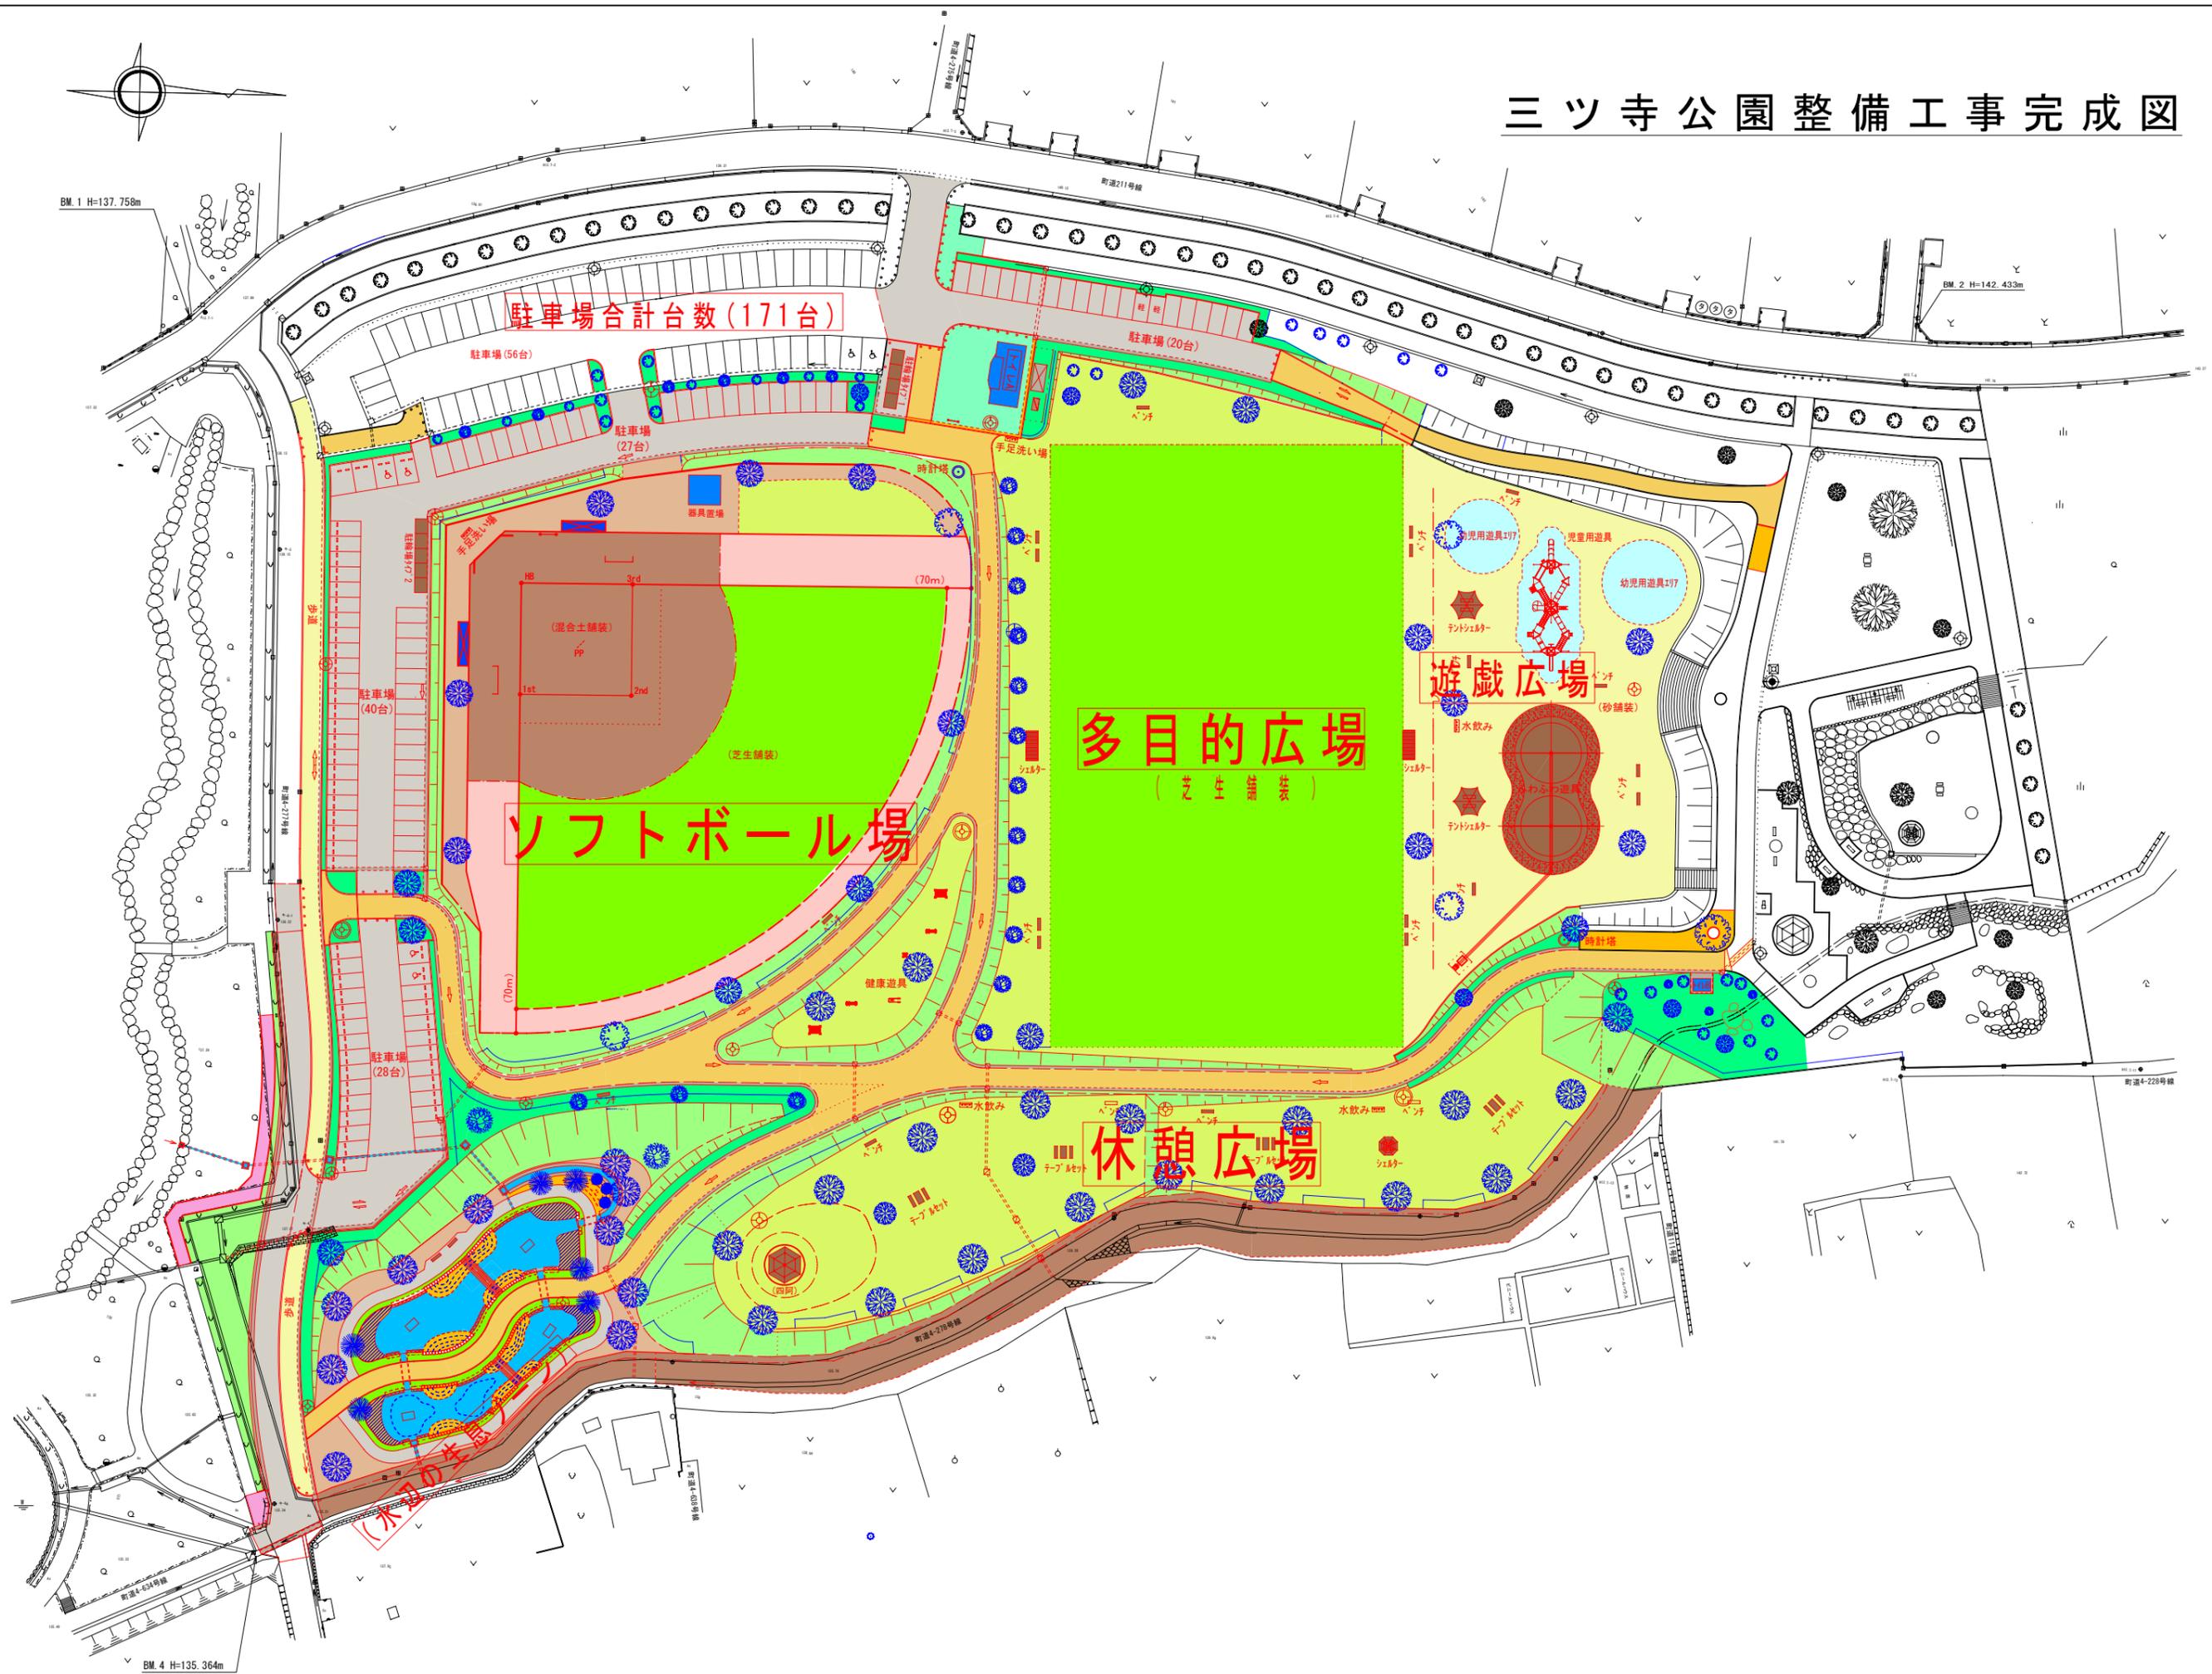

遊戯広場



ふわふわ遊具

トイレ




三ツ寺公園 遊具設置状況



ふわふわドーム

サイズ 24m×12m 高さ 1.5m

大型複合遊具設置イメージ図

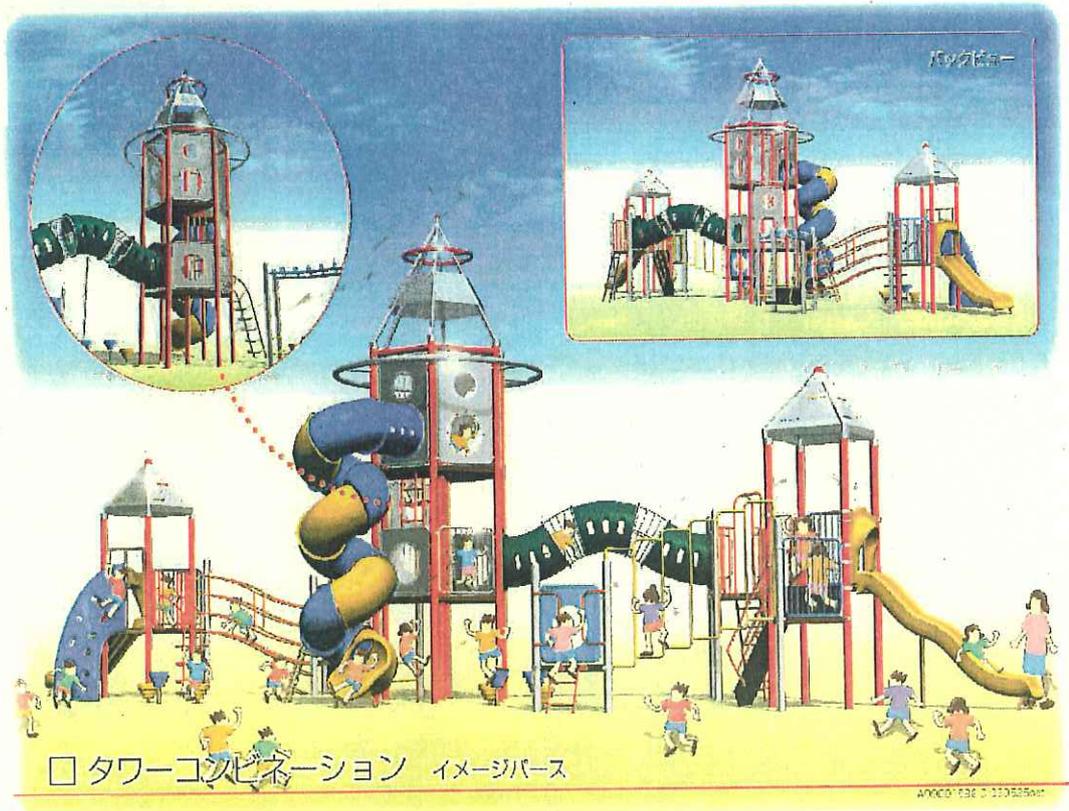

サイズ 約 21.7m×7.4m タワーの高さ 約7.7m

第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（145項）

平成 21 年 9 月 30 日現在

事務事業名	群馬中央第二土地区画整理事業	所属 (支所)	都市整備部区画整理1課
実施期間	平成9年度～平成35年	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	群馬中央第二土地区画整理地区		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
合理的な土地利用と公共公益施設の整備を進め、快適な住環境を備えた健全な市街地を形成する。	土地区画整理事業により整備する。	【施行面積】72.02ha 【総事業費】12,900百万円 【事業概要】都市計画道路 4,993m、区画道路13,098m 物件移転606戸 H19未進捗率 12.1%	


【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他	道路築造工事 物件移転補償 その他

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	20年度事業実績	
合計	388,185	307,783		
国	140,350	109,639	・道路築造工事外	5件
県			・建物調査委託外	8件
地方債	5,500	9,400	・建物移転補償物件外	10件
その他				
一般	242,335	188,744		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容	
合計	347,698		《9月30日現在》	《実施予定》
国	121,650		・道路築造工事外	1件施工中
県			・建物調査委託外	7件業務中
地方債	15,300		・建物移転補償物件外	3件施工中
その他				・道路築造工事外
一般	210,748			1件
				・委託業務
				3件
				・建物移転補償物件外
				6件
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22年度事業計画	
合計				
国			・道路築造工事外	
県			・建物調査委託外	
地方債			・建物移転補償物件外	
その他				
一般				

中央第二土地区画整理事業 位置図

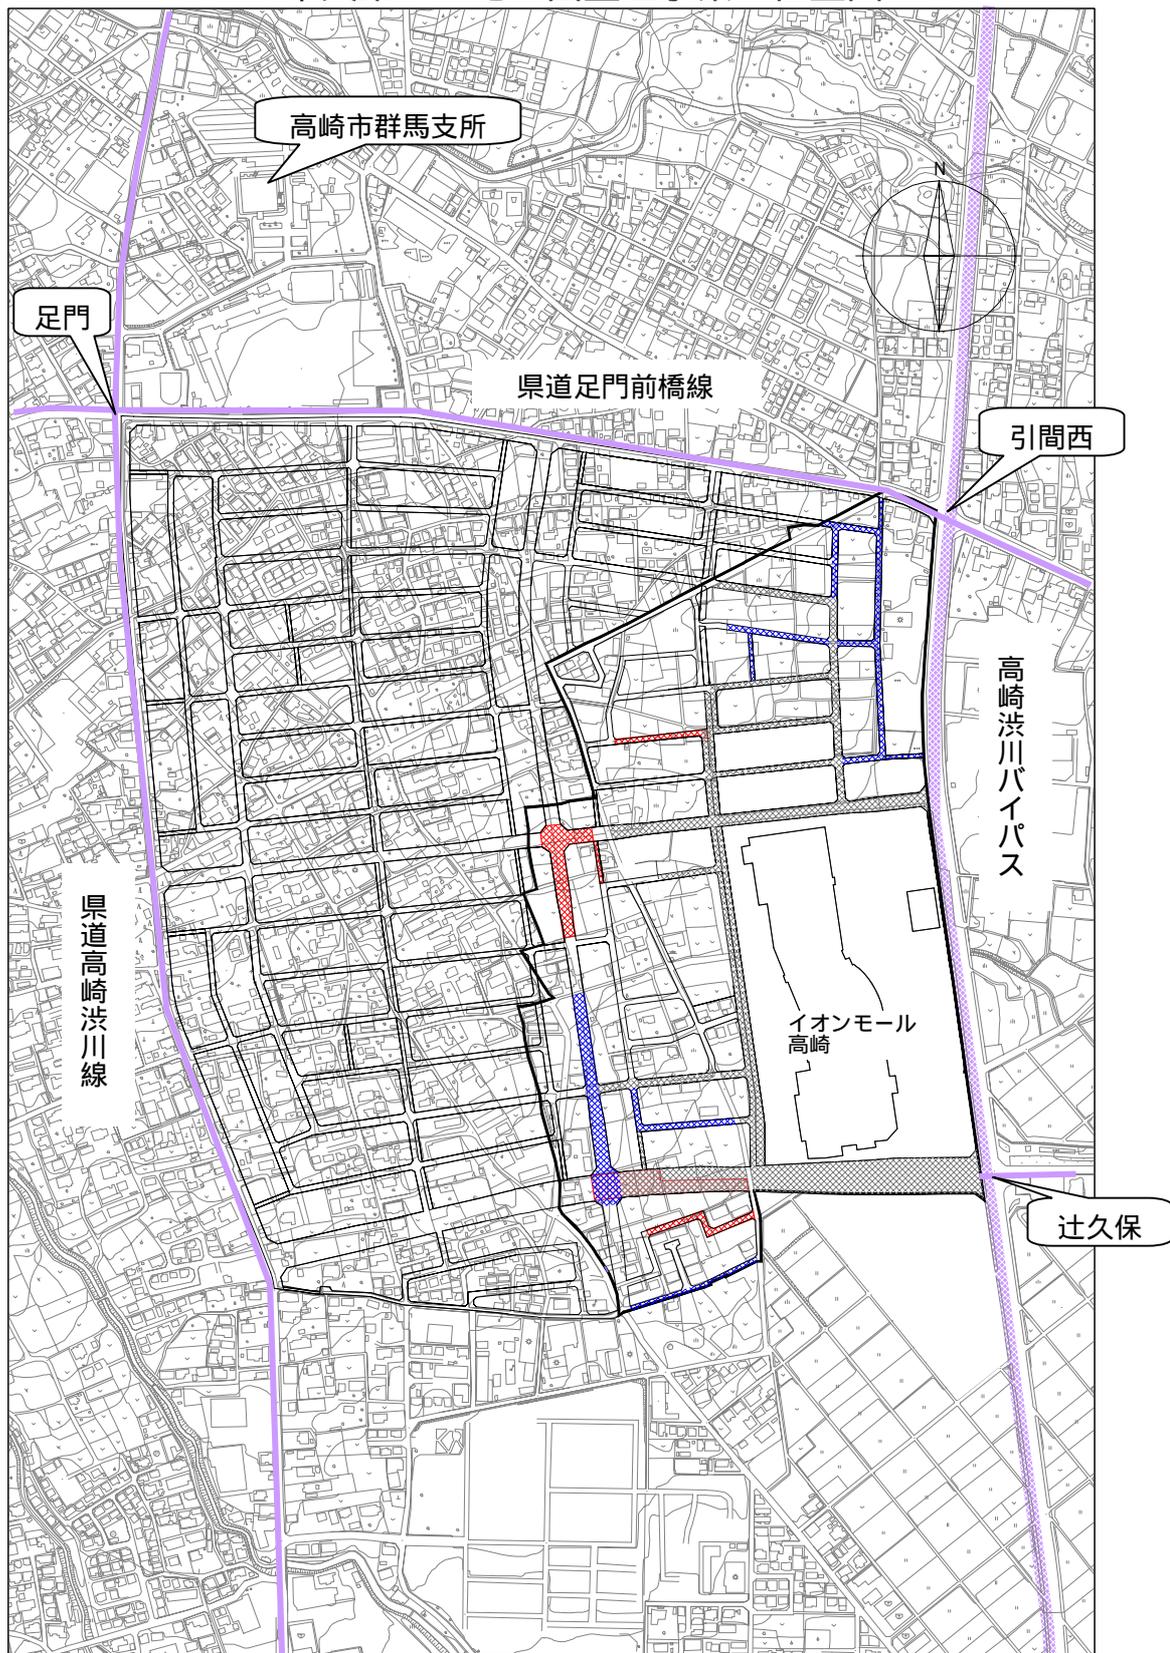


凡 例

- . . . 過年度施工済箇所
- . . . 平成20年度施工箇所
- . . . 平成21年度施工箇所

都市計画道路 棟高観音寺線



菅谷高畑土地区画整理事業 位置図

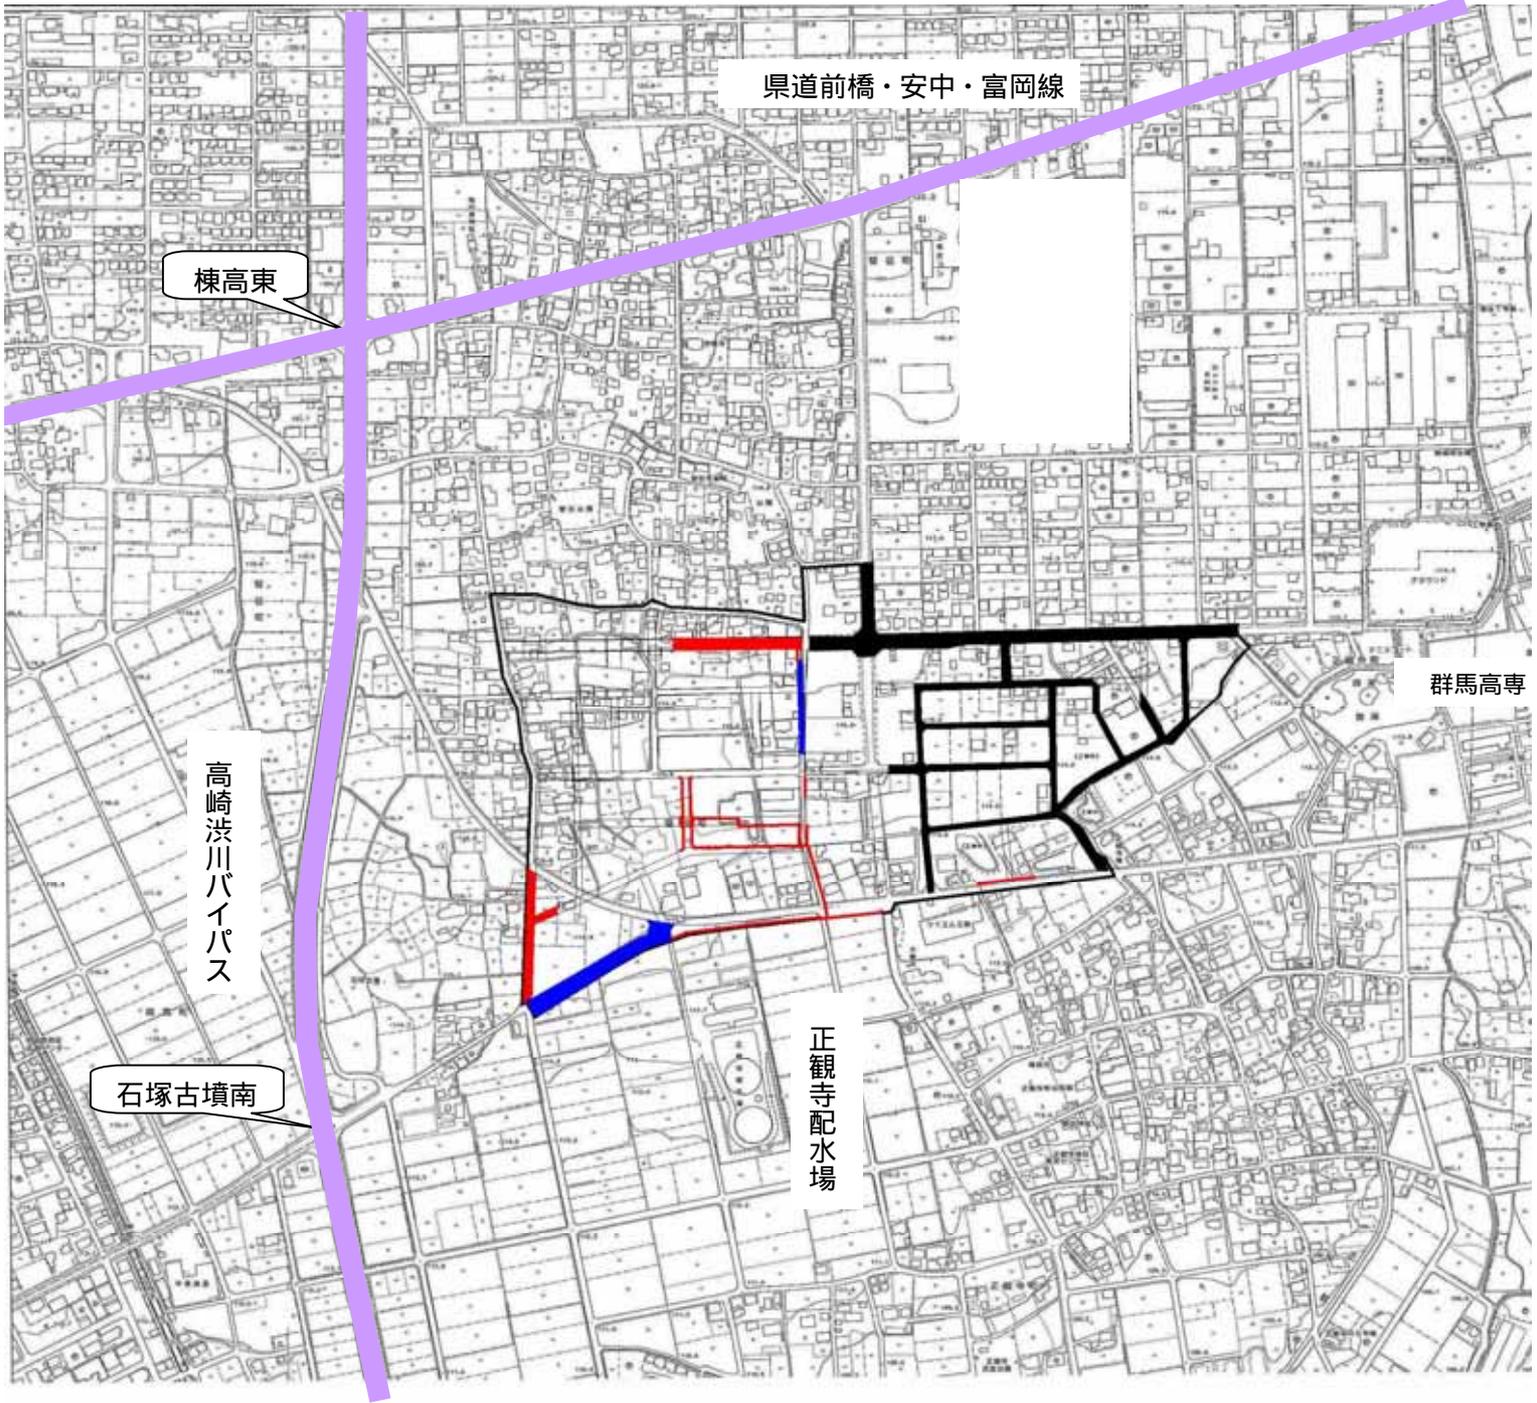

凡 例	
	・・・過年度施工済箇所
	・・・平成20年度施工箇所
	・・・平成21年度施工箇所



区画道路1号線



第 5 次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（156項）

平成 21 年 9 月 30 日現在

事務事業名	上水道管網整備事業	所属 (支所)	水道局工務課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	配水管		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
効率的で災害に強い給水体制を確立する。	群馬地域内の石綿セメント管等をダクタイル鉄管に布設替えを行う。	群馬地域の石綿セメント管残存延長 (平成 20 年度末 70,219m)	

【年度別事業計画】

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
石綿セメント管等の 布設替 2,500m	石綿セメント管等の 布設替 2,600m	石綿セメント管等の 布設替 2,850m	石綿セメント管等の布 設替 2,850m	石綿セメント管等の 布設替 2,850m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20 年度 事業実績
合計	186,603	222,830	< 執行実績 > 管網整備事業 ・ 舗装復旧工事 A = 2,597.5 m ² ・ 配水管布設替工事 L = 4,150.5 m
国			
県			
地方債			
その他			
一般	186,603	222,830	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21 年度 事業内容
合計	179,458		管網整備事業を計画的に実施する。 ・ 配水管布設替工事 L = 4,680 m < 9 月 30 日現在 執行実績 > (当初予算額ベース進捗率 65%) 引き続き、配水管布設(替)工事を実施します。
国			
県			
地方債			
その他			
一般	179,458		
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	22 年度 事業計画
合計			管網整備事業を計画的に実施する。
国			
県			
地方債			
その他			
一般			

第5次総合計画・前期実施計画事業推進状況報告書

前期実施計画書（159頁）

平成21年9月30日現在

事務事業名	污水管渠整備事業	所属 (支所)	下水道局 整備課 (群馬上下水道事務所)
実施期間	全期	事業の種類	ハード事業

【事業概要】

対象(誰を、何を)	污水管渠		
実施目的(どういった状態に)	具体的手段(どういった手段で)	その他(全体計画等)	
快適な生活環境の確保と河川の水質改善を図る。	計画的に下水道管渠を整備する。	平成20年度末 整備面積 263.40ha 整備延長 68.21km	

【年度別事業計画】

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
下水道管渠の整備 面積 2.94ha 延長 1,350m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m	下水道管渠の整備 面積 4ha 延長 1,408m

【年度別推進状況】

区分 (千円)	当初 予算額	決算額	20年度事業実績
合計	118,600	113,967	実施計画に従い、逐次管渠布設工事を実施し、公共下水道の普及率向上に努めた。 下水道築造工事施工済 群馬地域 3,074m
国	30,000	32,000	
県			
地方債	44,000	28,800	
その他	20,070	36,923	
一般	24,530	16,244	
区分 (千円)	当初 予算額	決算 見込額	21年度事業内容
合計	222,640		9月30日現在 下水道築造工事発注済 群馬地域 1,475m 下水道築造工事発注予定 群馬地域 243m 計 1,718m
国	87,000		
県			
地方債	101,300		
その他	24,300		
一般	10,040		
区分 (千円)	当初 予算額	決算額 見込額	22年度事業計画
合計			下水道築造工事発注予定 群馬地域 1,408m
国			
県			
地方債			
その他			
一般			
